



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati\*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Acheropita MONDERA	Consigliere
Annalaura LEONI	Prima Referendaria - relatrice
Antonino GERACI	Referendario

\*riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 10-11 luglio 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, nello specifico, l'art. 7, comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti un controllo consistente, in particolare, in valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 21/2021/INPR e n. 43/2022/INPR e le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/2022/INPR, n. 18/2022/INPR e n. 1/2023/INPR;

VISTA la deliberazione n. 3/2023/INPR di programma dell'attività di controllo di questa Sezione;

VISTA la nota prot. n. 520 del 27 marzo 2023, successivamente integrata con n. 640 del 24.4.2023, con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto alla Regione Umbria di fornire elementi in merito al ruolo della stessa nell'attuazione del PNRR, alle attività programmate e alle tempistiche di realizzazione previste e, attraverso la compilazione di un file in formato *excel* editabile, informazioni relative all'attuazione degli interventi afferenti al PNRR alle date del 31.12.2022 e del 31marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 0108170 del 15.5.2023 (registrata al protocollo interno n. 1066 di pari data) successivamente integrata con nota n. 0108174 del 16.5.2023 (registrata al protocollo n. 1067 di pari data) con le quali l'Amministrazione ha inviato la documentazione richiesta;

VISTE le note del 26 e 27 aprile 2023, trasmesse mediante l'applicativo Con.Te. a tutti gli Enti locali del territorio umbro (n. 2 province e n. 92 comuni), con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto la compilazione di un file in *excel* editabile al fine di acquisire informazioni relative all'attuazione degli interventi afferenti al PNRR alle date del 31.12.2022 e del 31.3.2023;

VISTE le note di riscontro pervenute da parte di n. 86 enti locali;

VISTA le ordinanze nn. 23, 24 e 25 del 2023 con le quali il Presidente ha convocato la camera di consiglio per il giorno 10 luglio 2023, aggiornata all'11 luglio 2023;

UDITA, nella camera di consiglio riunita mediante collegamento telematico, la relatrice, dott.ssa Annalaura Leoni;

### **DELIBERA**

di approvare l'allegata relazione "*Monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate alla Regione e agli Enti locali Umbri*", che forma parte integrante della presente delibera;

### **ORDINA**

che la presente delibera e l'allegata relazione siano trasmesse al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Regione Umbria, ai Presidenti delle Province di Perugia e Terni, ai Sindaci e ai Presidenti del Consiglio comunale dei Comuni dell'Umbria.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, nelle modalità di legge.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10-11 luglio 2023.

Il Magistrato estensore  
*f.to digitalmente*  
Annalaura LEONI

Il Presidente  
*f.to digitalmente*  
Antonello COLOSIMO

Depositata il 24 luglio 2023  
Il Preposto della Sezione  
*f.to digitalmente*  
Dott.ssa Antonella Castellani



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI  
ATTUAZIONE DEI PROGETTI  
FINANZIATI CON LE RISORSE DEL  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E  
RESILIENZA (PNRR) ASSEGNATE ALLA  
REGIONE E AGLI ENTI LOCALI UMBRI**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI  
ATTUAZIONE DEI PROGETTI  
FINANZIATI CON LE RISORSE DEL  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E  
RESILIENZA (PNRR) ASSEGNATE ALLA  
REGIONE E AGLI ENTI LOCALI UMBRI**

Magistrato Relatore: *Primo Referendario Annalaura Leoni*

*Collaboratori incaricati:*

Dott.ssa Antonella Castellani

Rag. Rossella Salustri

Dott.ssa Serena Ricci

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

Rag. Marta Bibi

# 1 PREMESSA

## 1.1 Considerazioni introduttive e quadro normativo di riferimento

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) – istituito dal Regolamento 2021/241/UE, che ne definisce obiettivi, finanziamento e relative regole di erogazione – si colloca, nel più generale quadro del *Next Generation EU*, tra gli strumenti approntati dall’Unione europea funzionali, nel contesto della crisi pandemica, al rilancio dell’economia degli Stati membri, con l’obiettivo generale di promozione della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione e quello specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. Il Dispositivo ha una dotazione di 723,8 mld di euro; di cui 338 mld di euro sotto forma di sovvenzioni e 385 mld di euro sotto forma di prestiti.

L’Italia, destinataria di 191,5 miliardi – di cui 68,9 di sovvenzioni e 122,6 di prestiti – ha predisposto e sottoposto alla valutazione della Commissione europea e del Consiglio un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR – *Recovery and Resilience Plan*), con cui, come ogni Stato membro, ha definito un insieme coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026.

Il Piano, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2021, si articola in riforme e investimenti da realizzare e individua progetti e misure previsti in aree di intervento riconducibili a sei Missioni (1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, 4 “Istruzione e ricerca”, 5 “Inclusione e coesione”, 6 “Salute”).

Con legge 30 dicembre 2020, 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’e.f. 2021, ai commi 1037 e seguenti, è stata prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del *Next Generation EU*-Italia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1040, il comma 1038 ha previsto che le risorse del Fondo siano versate su due appositi conti correnti infruttiferi – aventi amministrazione

autonoma e costituenti gestioni fuori bilancio – aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, dedicati uno alle risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto ed uno a quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Le risorse giacenti su tali conti sono attribuite in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base di procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato anche a definire le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo.

I successivi commi 1043-1044 hanno, quindi, riconosciuto, in tal contesto operativo, al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato (RGS), specifiche funzioni di supporto alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, attraverso lo sviluppo di un apposito sistema informatico, prevedendo inoltre l'adozione di un d.P.C.M. per la definizione delle modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto. Con d.P.C.M. 15 settembre 2021 è stato, quindi, individuato il sistema ReGiS, sviluppato dalla RGS, per il detto supporto alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano. ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Con d.l. 31 maggio 2021, 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, 108, è stata disciplinata la *governance* del PNRR e dettate le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure. Ivi si chiarisce (art. 1, comma 4) che rappresentano “*amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR*” i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR e si definiscono quali “*soggetti attuatori*” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi.

Come chiarito dall'art. 9 dello stesso d.l. 77/2021, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal Piano provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR; ciò attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di



soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Il d.l. 77/2021 ha anche delineato, all'art. 7, la disciplina dei controlli specificamente dedicati alla realizzazione del PNRR, intestando alla Corte dei conti, al comma 7, un controllo - inquadrabile quale controllo sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, 20 - consistente, in particolare, in valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

In tale contesto si inserisce, pertanto, il monitoraggio svolto dalla Sezione nella presente indagine, realizzato in considerazione delle indicazioni fornite a livello centrale dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni 21/2021/INPR e 43/2022/INPR) e dalla Sezione delle autonomie (deliberazioni 13/2022/INPR, 18/2022/INPR e 1/2023/INPR).

## 1.2 Obiettivi e metodologia d'indagine

L'indagine è finalizzata ad una preliminare ricognizione dei progetti che, finanziati principalmente con fondi previsti dal PNRR, vedono coinvolti gli Enti territoriali umbri - Regione ed Enti locali - ed al contestuale monitoraggio del grado di avanzamento degli interventi, con specifica analisi di quelli destinatari di risorse significative, rappresentazione delle criticità emerse in sede di attuazione e rilevazione della capacità degli Enti di implementazione della banca dati ReGiS.

L'attività istruttoria della Sezione, svoltasi nei mesi di aprile e maggio 2023, è stata indirizzata alla Regione ed a tutti gli Enti locali del territorio umbro (2 Province e 92 Comuni)<sup>1</sup>, al fine di acquisire dati e informazioni relativi al complesso dei progetti PNRR ed al loro stato di attuazione alle date del 31 dicembre 2022 e del 31 marzo 2023.

A tal fine, sono stati pertanto predisposti dalla Sezione appositi file in formato *excel* editabile, trasmessi alla Regione e agli Enti locali per la conseguente compilazione, finalizzata all'acquisizione delle seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto compilatore ed indicazioni circa la qualificazione dello stesso quale "soggetto attuatore", ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o), del d.l. 31 maggio 2021, 77;

---

<sup>1</sup> In particolare, nota prot. n. 640, del 24 aprile 2023, trasmessa alla Regione Umbria, e note prot. del 26 e 27 aprile 2023, trasmesse a Enti locali.

- Codice Unico di Progetto (CUP), sua sintetica descrizione, indicazione di missione, componente e misura del PNRR di riferimento, nonché dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento ex art. 8, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, 77;
- dati finanziari: ammontare dei finanziamenti afferenti al PNRR, al PNC o ad altre fonti; importo precedentemente finanziato in caso di preesistenza del progetto; capitolo di entrata, denominazione e analitica descrizione dello stesso; importo ricevuto a titolo di anticipazione, con indicazione degli estremi del provvedimento di assegnazione (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); altre risorse ricevute, con indicazione degli estremi del provvedimento di assegnazione (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); capitolo di spesa, denominazione e analitica descrizione dello stesso; importo degli impegni assunti (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); importo dei pagamenti disposti a valere su risorse PNRR, al netto d'IVA (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); importo dei pagamenti disposti a valere su altre risorse (al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023); imputazioni al Fondo pluriennale vincolato;
- stato di avanzamento degli interventi: eventuale avvio; ordinata descrizione di tutte le fasi procedurali previste nel cronoprogramma, con indicazione del termine ultimo previsto per la realizzazione della singola fase e del rispetto del predetto termine; data ultima per la conclusione dell'intero intervento; altri soggetti coinvolti nell'intervento con specificazione del titolo, della ragione del coinvolgimento e della denominazione, del codice fiscale, della sede e dell'attività demandata;
- notizie in merito alle attività di comunicazione e inserimento dei dati nel sistema ReGiS ed alle criticità eventualmente riscontrate; ogni altra informazioni ritenuta di potenziale interesse per l'indagine.

A tali richieste, hanno fornito riscontro la Regione Umbria (con nota del 15 maggio 2023, prot. 1067) e 86 enti locali<sup>2</sup>.

Per lo svolgimento dell'indagine la Sezione si è anche avvalsa dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati ReGiS, gestite dal MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS). In merito occorre specificare che, data l'impossibilità per la Sezione di estrapolazioni dirette di contenuti alle specifiche date d'interesse per l'indagine (31 dicembre 2022 e 31 marzo 2023) - finalizzata ad un raffronto con quanto emergente dalle risposte fornite dagli enti territoriali

---


<sup>2</sup> Non hanno aderito all'indagine n. 8 Comuni (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Nocera Umbra, Torgiano, Campello sul Clitunno, Citerna, Poggiodomo, Polino).

alla descritta richiesta istruttoria –, gli esiti dell'esame esposti nei capitoli 3, 4 e 5 sono, pertanto, frutto dell'elaborazione di tali ultimi dati. Nel dettaglio, dopo un'analisi complessiva dei dati forniti (cap. 2), verrà illustrata, nello specifico, l'esito della complessiva ricognizione dei progetti PNRR della Regione Umbria (cap. 3), delle Province di Perugia e di Terni (par. 4.1 e 4.2), dei Comuni di Perugia e di Terni (par. 4.3 e 4.4) ed, in modalità aggregata, verranno esposti i dati forniti dai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (par. 4.5), tra 15 mila e 5 mila abitanti (par. 4.6) ed inferiore ai 5 mila abitanti (par. 4.7). Saranno oggetto di specifica analisi i progetti con finanziamento PNRR pari o superiore a 1 milione di euro. Verrà conclusivamente riportato il quadro emergente dalla banca dati ReGIS in data prossima alla conclusione delle analisi, così da fornire un ulteriore aggiornamento del dato oggetto di monitoraggio (cap. 5).

## 2 I PROGETTI PNRR IN UMBRIA - ANALISI COMPLESSIVA DEI PROGETTI FINANZIATI DALLE RISORSE DEL PNRR DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI UMBRI

Dai dati ed informazioni forniti - riferiti, come anticipato, alla situazione esistente al 31/12/2022 e al 31/03/2023 - i progetti finanziati anche con risorse PNRR che trovano attuazione nel territorio regionale sono in totale 1323, per un valore complessivo di euro 840.433.812,15; come rappresentato graficamente di seguito, i predetti progetti risultano finanziati in larga parte da fondi del PNRR - per un ammontare di euro 647.492.060,11, rappresentanti il 77,04% dei finanziamenti totali - a cui si aggiungono i fondi provenienti dal PNC (euro 124.457.595,72, pari al 14,81% del totale dei finanziamenti) e ulteriori risorse di diversa fonte (euro 68.484.156,32, pari all'8,15% del totale dei finanziamenti).

Grafico 1 - Distribuzione dei 1323 progetti per tipologia di finanziamento Regione ed EE.LL.

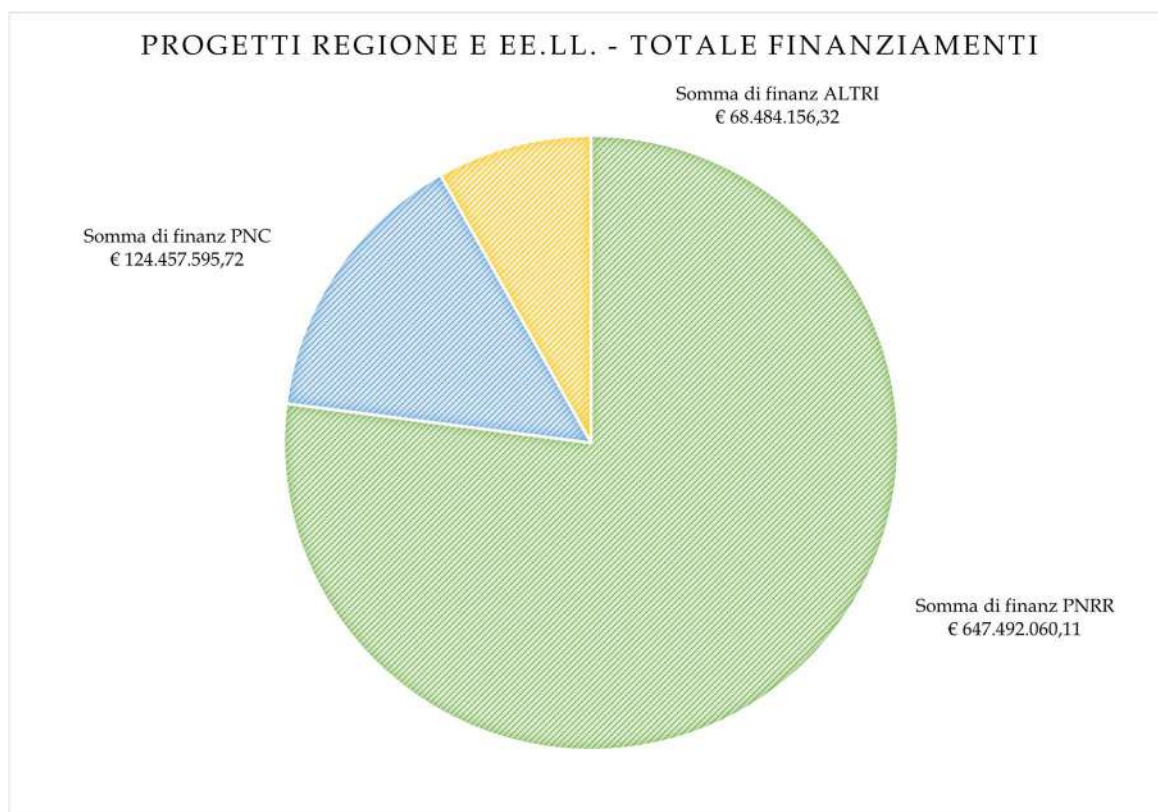


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL.

I progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR risultano essere 1194, per un valore complessivo di euro 647.492.060,11, ripartiti tra le seguenti differenti Missioni:

**Grafico 2 - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni**

**Regione ed EE.LL.**

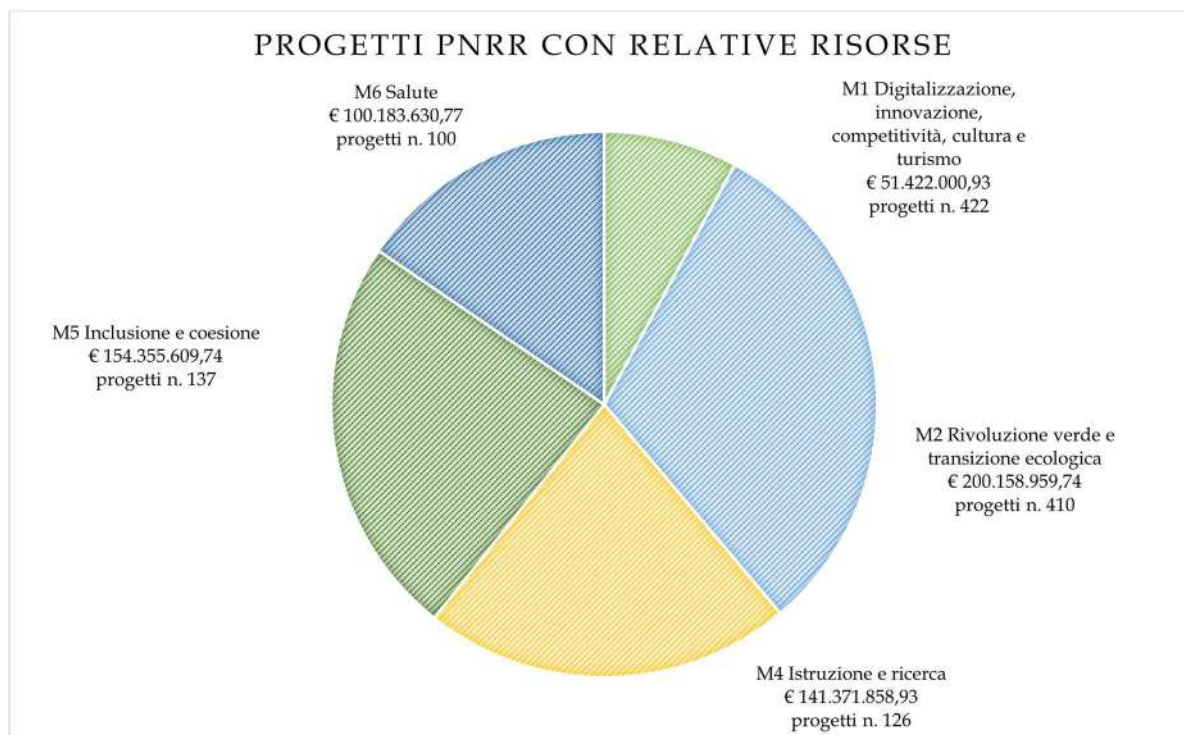


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL.

La Missione con maggiore dotazione finanziaria risulta la M2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (euro 200.158.959,74 per 410 progetti), seguita dalla M5 - “Inclusione e coesione” (euro 154.355.609,7 per 137 progetti) e dalla M4 - “Istruzione e ricerca” (euro 141.371.858,93 per 126 progetti). Minori risultano le risorse destinate alla Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” (euro 51.422.000,93 per 422 progetti).

Nell’ambito della Missione 6 - “Salute” - integralmente in capo alla Regione - risultano finanziati 100 progetti, per euro 100.183.630,77.

Le complessive risorse PNRR, pari ad euro 647.492.060,11, risultano attribuite principalmente agli Enti locali (euro 486.042.640,63 per 961 progetti); la quota di risorse del PNRR di competenza della Regione ammonta ad euro 161.449.419,48, per 233 progetti.

**Grafico 3 - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra Regione ed EE.LL.**

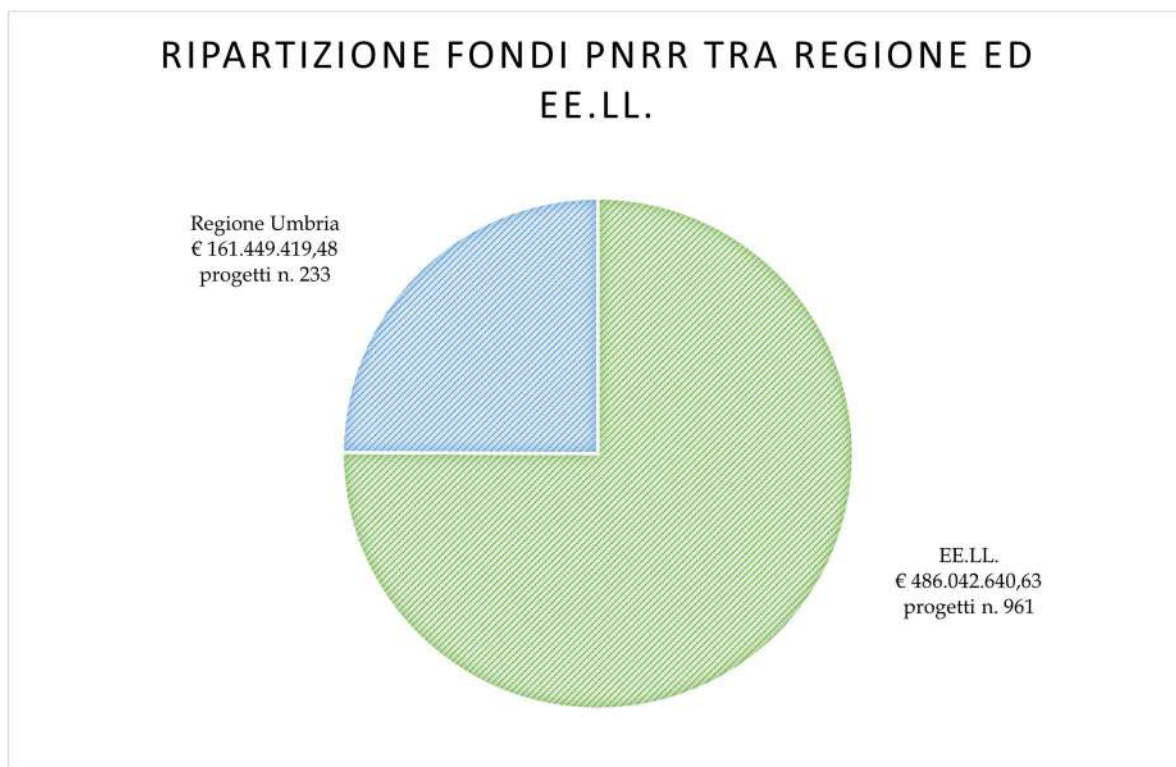

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

### **3 I PROGETTI FINANZIATI DALLE RISORSE DEL PNRR DI COMPETENZA DELLA REGIONE UMBRIA**

Si riportano di seguito gli esiti dell'analisi operata sulle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi riguardanti l'Amministrazione regionale, alla luce della documentazione di dettaglio trasmessa dalla Regione con nota 0108174 del 15.5.2023 (assunta al protocollo della Sezione 1067 del 16.5.2023), di risposta alla nota istruttoria della Sezione 640 del 24.4.2023, specificamente riferita al PNRR, nonché delle ulteriori informazioni fornite con note dell'Amministrazione regionale prot. n 0093112 del 26 aprile 2023 (assunta al protocollo della Sezione 665 del 26 aprile 2023) e prot. 0108170 del 15 maggio 2023 (assunta al protocollo della Sezione 1066 del 16 maggio 2023), nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'e.f. 2022.


Dalla elaborazione dei dati trasmessi dalla Regione, riferiti al 31.12.2022 ed al 31.3.2023, risulta un totale di 289 progetti, di cui 15 progetti privi di un correlato CUP, 5 revocati e 55 finanziati dal PNC. I progetti avviati sono 180, pari al 62% del totale.

I finanziamenti degli stessi - come illustrato graficamente di seguito - sono pari ad euro 268.988.544,97, di cui: con fondi PNRR euro 161.449.418,48 (60%), con fondi del PNC per euro 76.704.084,19 (28%) e con altre risorse per euro 30.835.041,30 (15%)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

**Grafico 4 - Distribuzione dei 289 progetti per tipologia di finanziamento**

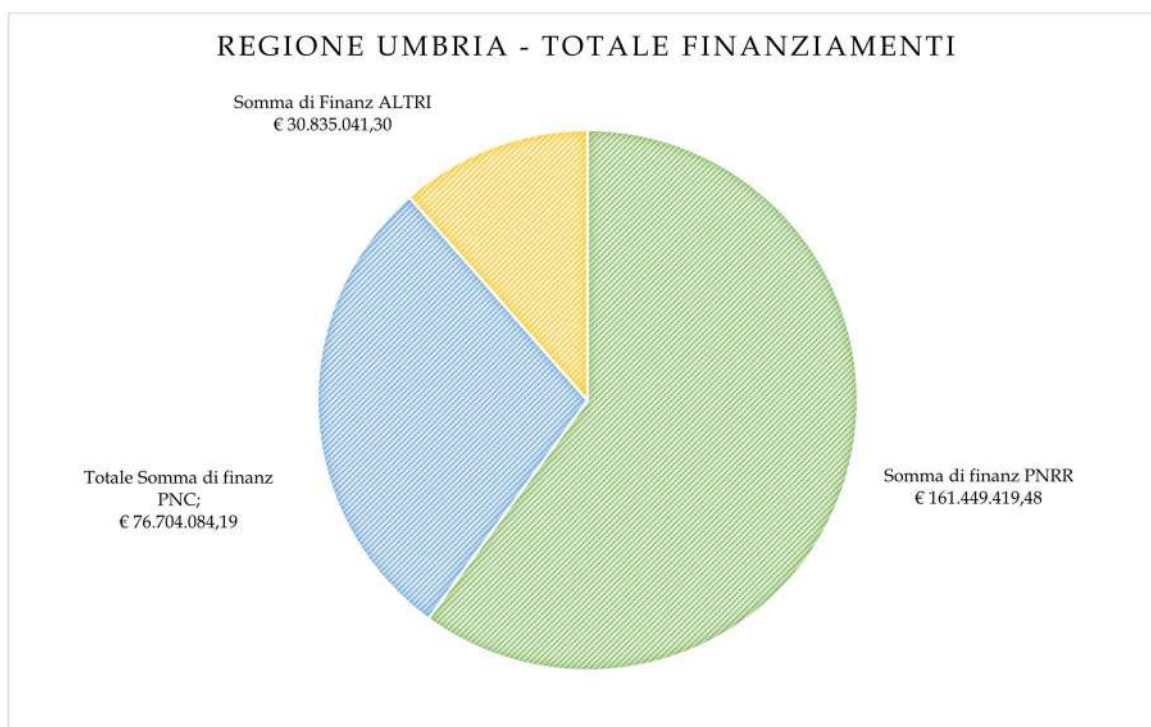

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

La parte preponderante dei progetti e dei fondi PNRR è concentrata nella Missione 6 Salute, con 102 progetti, per un valore di euro 100.183.630,77. I progetti relativi alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo) sono pari a 89, per un valore di euro 21.380.500,88; nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione, ecologica) risultano 53 progetti, per un totale di euro 10.181.386,64; la Missione 5 (Inclusione e coesione), pur a fronte di un numero inferiore di progetti (44), assorbe risorse per euro 29.703.901,19; risulta, infine un solo progetto, non ancora finanziato, relativo alla Missione 4 (Istruzione e Ricerca).


**Tabella 1 - Numero progetti per missione**

MISSIONI	PROGETTI
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	<b>89</b>
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	<b>53</b>
M4 Istruzione e ricerca	<b>1</b>
M5 Inclusione e coesione	<b>44</b>
M6 Salute	<b>102</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>289</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL



## Grafico 5 - Distribuzione delle risorse PNRR per Missione - Regione Umbria

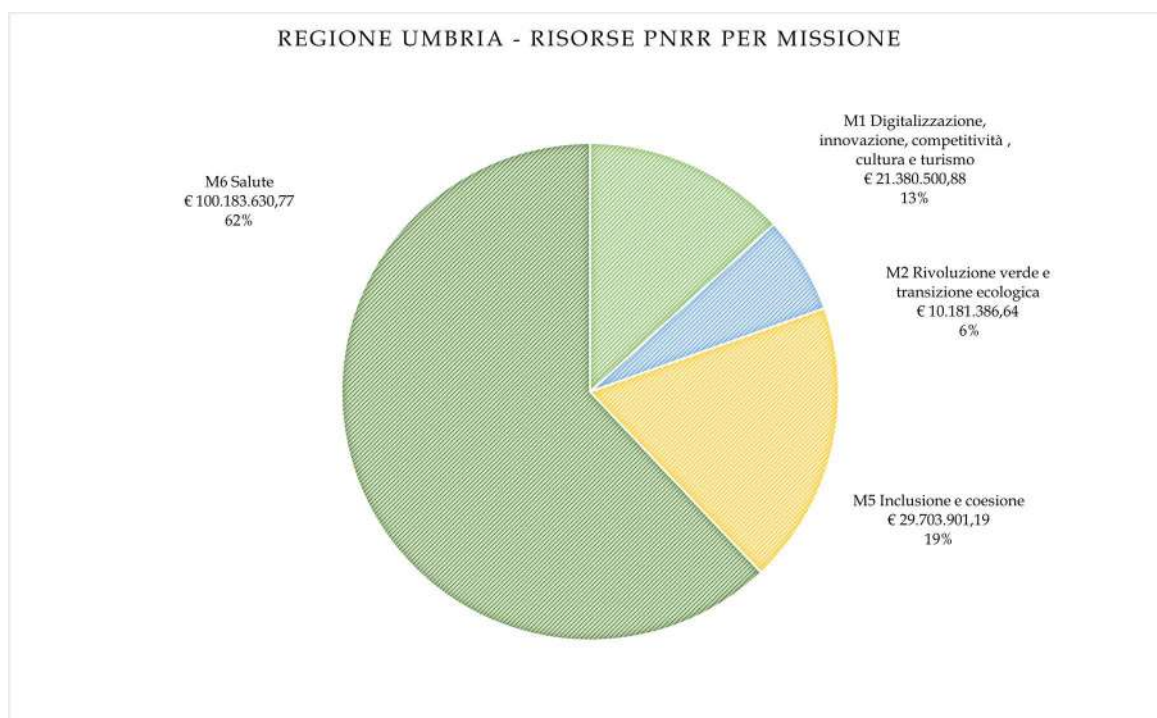

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

In particolare, la parte preponderante dei progetti e dei fondi PNRR è concentrata nella Missione 6 Salute, con 102 progetti, per un valore di euro 100.183.630,77. I progetti relativi alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo) sono pari a 89, per un valore di euro 21.380.500,88; nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione, ecologica) risulta 1 progetto, per un totale di euro 3.786.422,57; la Missione 5 (Inclusione e coesione), con 44 progetti, assorbe risorse per euro 29.703.901,19; risulta, infine un solo progetto, non ancora finanziato, relativo alla Missione 4 (Istruzione e Ricerca).

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi totali suddivisi per Ministero titolare:

**Tabella 2 - Numero progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti
Dipartimento della funzione pubblica	<b>1</b>
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)	<b>14</b>
Ministero del lavoro e politiche sociali	<b>1</b>
Ministero della cultura MIC	<b>76</b>
Ministero della salute	<b>102</b>

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile MIMS	93
Ministero dell'istruzione	1
<b>Totale complessivo</b>	<b>289</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria e EE.LL

Si deve poi evidenziare che, rispetto ai 289 progetti totali, la Regione Umbria risulta soggetto attuatore di 236, che assorbono finanziamenti per euro 209.230.684,93, di cui: con fondi PNRR euro 155.054.455,41 (74%), con fondi del PNC per euro 29.183.287,73 (14%) e con altre risorse per euro 24.992.941,79 (12%), come dal seguente grafico. Si evidenzia, pertanto, che per la quasi la totalità dei finanziamenti del PNRR (euro 161.449.418,48) la Regione Umbria rappresenta il soggetto attuatore.

Di seguito si espongono i dati - desunti dal disegno di legge relativo al "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2022" approvato dalla Giunta regionale<sup>4</sup> - riferiti ai capitoli di spesa specificamente dedicati dalla Regione al PNRR<sup>5</sup>:

**Tabella 3 - Risultanze da Rendiconto 2022 Regione Umbria**

Missione	Previsione definitiva di competenza	Impegni	Pagamenti c/competenza	Fondo pluriennale vincolato	Economie di competenza	Residui passivi da esercizio di competenza
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	3.967.333,00	1.379.613,08	1.123.140,76	0,00	2.587.719,92	256.472,32
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	12.045.221,50	5.497.738,75	5.497.738,75	5.497.738,75	1.049.744,00	0,00
M5 Inclusione e coesione	7.460.027,00	405.808,30	258.103,51	2.871.538,58	4.182.680,12	147.704,79
M6 Salute	105.364.169,47	19.931.626,58	0,00	0,00	85.432.542,89	19.931.626,58
<b>Totale complessivo</b>	<b>128.836.750,97</b>	<b>27.214.786,71</b>	<b>6.878.983,02</b>	<b>8.369.277,33</b>	<b>93.252.686,93</b>	<b>20.335.803,69</b>

Fonte: Corte dei conti dati del rendiconto Regione Umbria 2022

<sup>4</sup> DGR 28 aprile 2023, n. 442

<sup>5</sup> Cfr. art. 9, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, nonché art. 3, comma 3, decreto MEF 11.10.2021.

Risultano previsioni definitive di competenza per euro 128.836.750,97, con impegni per euro 27.214.786,71 (21,12%), economie per euro 93.252.68,93 (72,38%) – correlate principalmente alla Missione 6 – ed euro 8.369.277,13 (6,50%) posti a F.P.V.. I pagamenti ammontano a euro 6.878.983,02 (25,28% degli impegni assunti), con conseguente formazione di residui passivi per euro 20.335.883,69. Le previsioni definitive di competenza sono riferite per l'81,78% alla Missione 6, per il 3,08% alla Missione 1, per il 9,35% alla Missione 2 e per il 5,79% alla Missione 5.

Pertanto, il complessivo stato di avanzamento finanziario, quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso, di euro 161.449.418,48, ed i pagamenti effettuati, di complessivi euro 6.878.983,02, è pari al 4,26%.

Tra i progetti dei quali la Regione risulta soggetto attuatore principale finanziati principalmente con risorse del PNRR, 3 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; 2 afferiscono alla Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” e 1 alla Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Con riferimento alla Missione 1:

- 1 progetto (CUP I64E21025920006), con scadenza 30.06.2025, “contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR” (M1C1I2.2), per il quale è previsto un report semestrale di monitoraggio con termine ultimo 31.12.2022, che risulta rispettato. Emergono finanziamenti PNRR per euro 7.402.000,00, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 1.379.613,08 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 1.201.472,00. La Regione ha ulteriormente chiarito che si tratta di un progetto di assistenza tecnica, avviato il 01.09.2021, che prevede per l’Umbria un’allocazione di euro 7.402.000 come risorse da investire in una *task force* di 22 esperti esterni, per fornire supporto alle pubbliche Amministrazioni umbre nella gestione, in particolare, delle procedure complesse e degli arretrati. È stata raggiunta la prima *milestone* il 30.06.2022, con la definizione della *baseline* sulle procedure da monitorare, ed è stato inviato al DFP il Rapporto di Monitoraggio e Valutazione sulle attività condotte nell’ambito del primo e del secondo semestre 2022, come previsto dal cronoprogramma. Le fasi procedurali successive riguardano la redazione del report semestrale di monitoraggio (30.06.2023; 31.12.2023; 30.06.2024; 31.12.2024; 30.06.2025).

- 1 progetto (CUP I99I22000490001), con scadenza 30.06.2025, di “digitalizzazione del patrimonio culturale” (M1C3I1.1). Risultano finanziamenti PNRR per euro 1.563.612,19, nessun impegno assunto e nessun pagamento disposto al 31.12.2022. La Regione ha riferito che si tratta di un intervento volto alla digitalizzazione del patrimonio culturale custodito nei musei, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura. Il progetto dell’Umbria è inserito in un più complesso e articolato intervento di competenza del Ministero della Cultura - *Digital Library*, al quale sono demandate le scelte operative rispetto alle modalità di attuazione, ai costi, alla tempistica. In linea con tale tempistica, è stata trasmessa alla *Digital Library* la prima stesura del “Piano dei fabbisogni”, che rappresenta la base per la realizzazione del *target* “risorse da digitalizzare”, pari almeno a 390.903 oggetti digitali prodotti. È in corso il consolidamento del piano dei fabbisogni e l’analisi delle strategie di gara, in interlocuzione con Invitalia, che sarà centrale di committenza per le gare per la fornitura dei servizi di digitalizzazione. Il cronoprogramma dell’intervento riporta una sola *milestone* finale per la produzione di risorse digitali: il 30.06.2025. Le tappe intermedie sono il frutto di interlocuzioni tra MiC - DL, Regioni e Invitalia, quest’ultima in qualità di stazione appaltante; pertanto, il cronoprogramma non è fissato rigidamente ma è considerato un’agenda di lavoro, flessibile in funzione della diffusione degli elaborati prestazionali ed economici prodotti dai soggetti coordinatori.

Per la Missione 2:

- 1 progetto (CUP da perfezionare), non avviato e relativo ad “innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” (M2C1I2.3). Risultano finanziamenti PNRR per euro 3.786.422,57, nessun impegno assunto e nessun pagamento disposto al 31.12.2022. La Regione ha riferito che, con nota prot. 0181325 del 28.03.2023, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato alle Regioni di non tener conto della data del 30.03.2023, indicata nel cronoprogramma, per l’adozione dei bandi, causa adeguamento in corso alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Dai dati forniti dalla Regione risultano, inoltre, 1 progetto afferente alla Missione 2, 11 progetti afferenti alla Missione 5 e 26 progetti afferenti alla Missione 6 di valore superiore ad un milione di euro, con soggetto attuatore/esecutore differente dall’Amministrazione regionale.

Per la Missione 2, l’intervento (CUP I69I21000020008) di “rinnovo flotta treni per trasporto regionale con mezzi elettrici e a idrogeno” (M2C2I4.4.2), risulta finanziato con risorse PNRR per euro 6.394.964,07 ed è previsto l’avvio della procedura entro il 30.06.2023; sono state

concesse anticipazioni, per euro 639.496,41, nessun impegno assunto e nessun pagamento con risorse PNRR disposto al 31.12.2022.

Relativamente alla Missione 5, risultano:

- 4 progetti<sup>6</sup>, con scadenza 31.03.2026, relativi ad “Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione” (M5C2I2.3), per i quali è prevista l’adozione della determina a contrarre entro l’11.08.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.209.246,73 e da altre fonti per euro 1.856.597,22, nonché anticipazioni, per euro 820.924,67, integralmente impegnate al 31.12.2022, e nessun pagamento disposto alla medesima data con risorse PNRR;
- 7 progetti<sup>7</sup>, con scadenza 31.03.2026, di «Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) “Vivere l’Umbria”» (M5C2I2.3), per i quali è prevista l’adozione della determina a contrarre entro il 06.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.297.776,56 e da altre fonti per euro 2.570.406,78, nonché anticipazioni, per euro 829.777,65, impegni al 31.12.2022 per euro 8.594.149,52 e nessun pagamento disposto alla medesima data con risorse PNRR.

Con specifico riferimento alla Missione 6, risultano:

- 7 progetti<sup>8</sup>, con scadenza 30.06.2026, relativi a “Case della comunità” (M6C1I1.1), dei quali 5 aggiudicati nei termini e 2 da aggiudicare entro il 31.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 21.294.025,57 e da altre fonti per euro 1.049.856,26, nonché anticipazioni, per euro 16.356,03, relativamente ad uno degli interventi (CUP F43D22000330001), impegni al 31.12.2022 per euro 1.716.210,92 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 41.746,44;
- 3 progetti<sup>9</sup>, con scadenza 30.06.2026, relativi ad “Ospedali di comunità” (M6C1I1.3), dei quali 1 aggiudicato nei termini e 2 da aggiudicare entro il 31.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 11.971.313,00, impegni al 31.12.2022 per euro 2.091.591,82 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 22.052,16;
- 7 progetti<sup>10</sup>, con scadenza 30.09.2025, di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (M6C2I1.1.1), per i quali risulta tempestivamente stipulato il relativo contratto.

<sup>6</sup> CUP I15F21000030001, I24E21000290001, I54E21000280001, I89J21000400001.

<sup>7</sup> CUP I18I21000170B324:B335, I48I21000090001, I58I21000300001, I68I21000470001, I78I21000110001, I88I21000120001, I89J21000280001.

<sup>8</sup> CUP F18I22000480006, F58I22000420006, F93D22000280006, F31B21006630001, F38I21003400001, F41B22001450001, F43D22000330001.

<sup>9</sup> CUP F88I22000510006, F43D22000340001, F93D21005050001.

<sup>10</sup> CUP F17H22001210007, F37H22001050001, F47H22001310001, F67H22001170001, F37H22001080007, F95F22000320008, I47H22000920001.

Risultano finanziamenti PNRR per euro 19.434.761,98, nessun impegno assunto e nessun pagamento con risorse PNRR disposto al 31.12.2022;

- 2 progetti<sup>11</sup>, con scadenza 31.12.2024, di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature: M6C2I1.1.2), per i quali risultano rispettati i termini previsti. Risultano finanziamenti PNRR per euro 4.808.400,00, impegni al 31.12.2022 per euro 4.708.400,00 e nessun pagamento disposto alla medesima data con risorse PNRR;

- 2 progetti<sup>12</sup>, con scadenza 31.12.2024, di adeguamento sismico (M6C1I1.2.1), da aggiudicare entro il 31.10.2023. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.562.053,05, impegni al 31.12.2022 per euro 2.300.000,00 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 30.262,49;

- 2 progetti<sup>13</sup>, con scadenza 31.12.2024, di rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - FSE (M6C1I1.3.1), di cui uno avviato. Risultano finanziamenti PNRR per euro 8.700.035,53, nessun impegno assunto e nessun pagamento con risorse PNRR disposto al 31.12.2022;

- 3 progetti<sup>14</sup>, con scadenza 20.05.2025, di valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN (M6C2I2.1), non avviati. Risultano finanziamenti PNRR per euro 3.000.000,00.

Conclusivamente, in relazione ai 41 progetti descritti, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 113.424.611,25, sulla base di quanto comunicato, 5 risultano non ancora avviati, 21 in fase di aggiudicazione, in 11 casi è prossima l'adozione della determina a contrarre, per 2 interventi sono in corso procedimenti preliminari e valutazioni intermedie, un intervento è in fase d'analisi dei fabbisogni.

È emerso, inoltre, che l'Ente abbia ricevuto per i predetti progetti anticipazioni per complessivi euro 2.306.554,76 e che, al 31.12.2022, abbia disposto pagamenti per complessivi euro 1.295.533,09. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 113.424.611,25, ed i pagamenti effettuati, di euro 1.295.533,09, è pari a circa l'1,14%.

---

<sup>11</sup>CUP F99J22002130002 e F19J22001700002.

<sup>12</sup> CUP I49J22000940006 e F46G21001580001.

<sup>13</sup> CUP I97H22003320006; un intervento risulta privo di CUP.

<sup>14</sup> CUP F99I22001370001, F99I22001380001, I43C22000610006.

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, la Regione Umbria ha segnalato, con riferimento alle ipotesi in cui rappresenta il soggetto attuatore, che per 68 progetti il CUP non risulta registrato/censito, in un caso è stato effettuato l'accesso con credenziali, ma sono state riscontrate difficoltà nel caricamento dei dati e 13 progetti non sono stati caricati nel sistema. È stato segnalato il mancato rispetto del cronoprogramma con riferimento a 4 progetti, tutti con valore inferiore ad 1 milione di euro.


## 4 I PROGETTI FINANZIATI DALLE RISORSE DEL PNRR DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI UMBRI

### 4.1 PROVINCIA DI PERUGIA

Dai dati e dalle informazioni tramessi dalla provincia di Perugia con nota del 15 maggio 2023, risultano 47 progetti complessivi, di cui 37 finanziati dalle risorse PNRR e 10 finanziati da sole risorse PNC<sup>15</sup>.

Il totale dei finanziamenti riferibili ai 47 progetti - di cui 42 avviati - ammonta a complessivi euro 62.672.437,70, di cui risorse PNRR per euro 58.232.706,70, risorse PNC per euro 3.722.731,00 ed altre risorse per euro 717.000,00, come esposto nel seguente grafico.

Grafico 6 - Distribuzione dei 47 progetti per tipologia di finanziamento

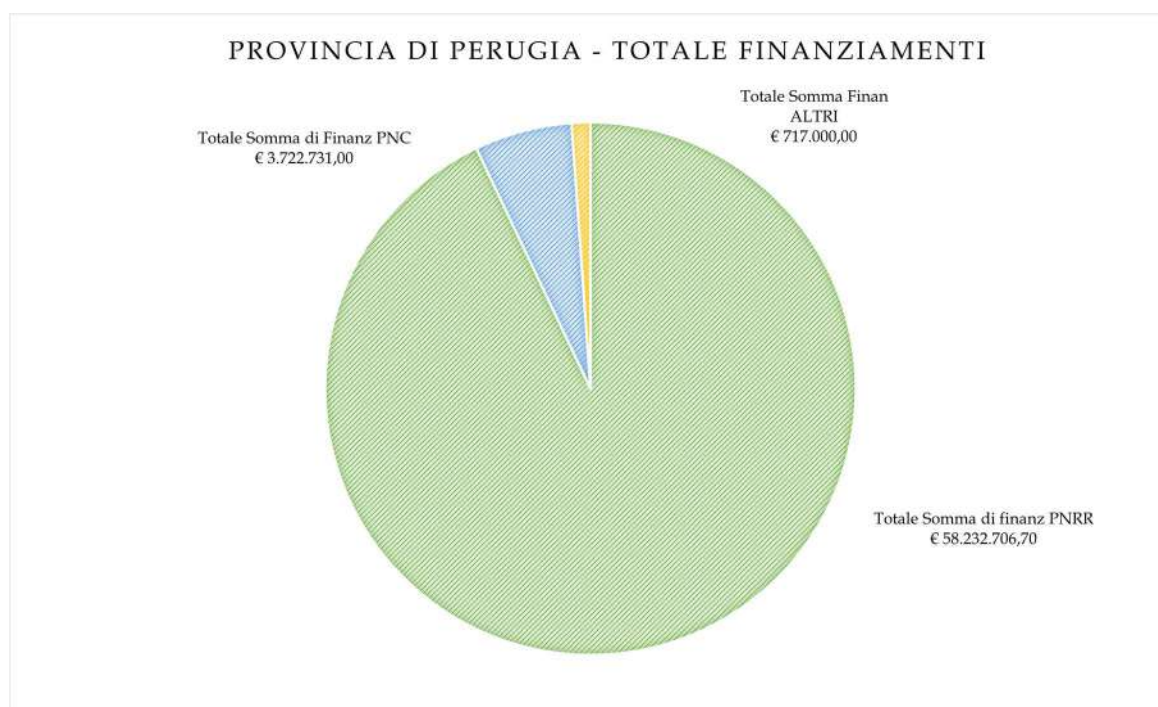

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Perugia

Al 31 dicembre 2022 risultano assunti impegni per complessivi euro 4.051.135,58, disposti pagamenti per euro 2.394.047,39, tutti a valere sulle risorse del PNRR ed al netto di Iva, con anticipazioni ricevute al 31 dicembre 2022 per euro 9.504.635,77, relativamente a 34 progetti.


<sup>15</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.



Lo stato di avanzamento finanziario dei 47 progetti, quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso, di euro 58.232.706,70, ed i pagamenti effettuati, di complessivi euro 2.394.047,39, è pari al 4,11%.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 37 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR – per euro 58.232.706,70 – dei quali l'Amministrazione provinciale ha indicato essere soggetto attuatore.

Grafico 7 - Distribuzione dei 37 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni

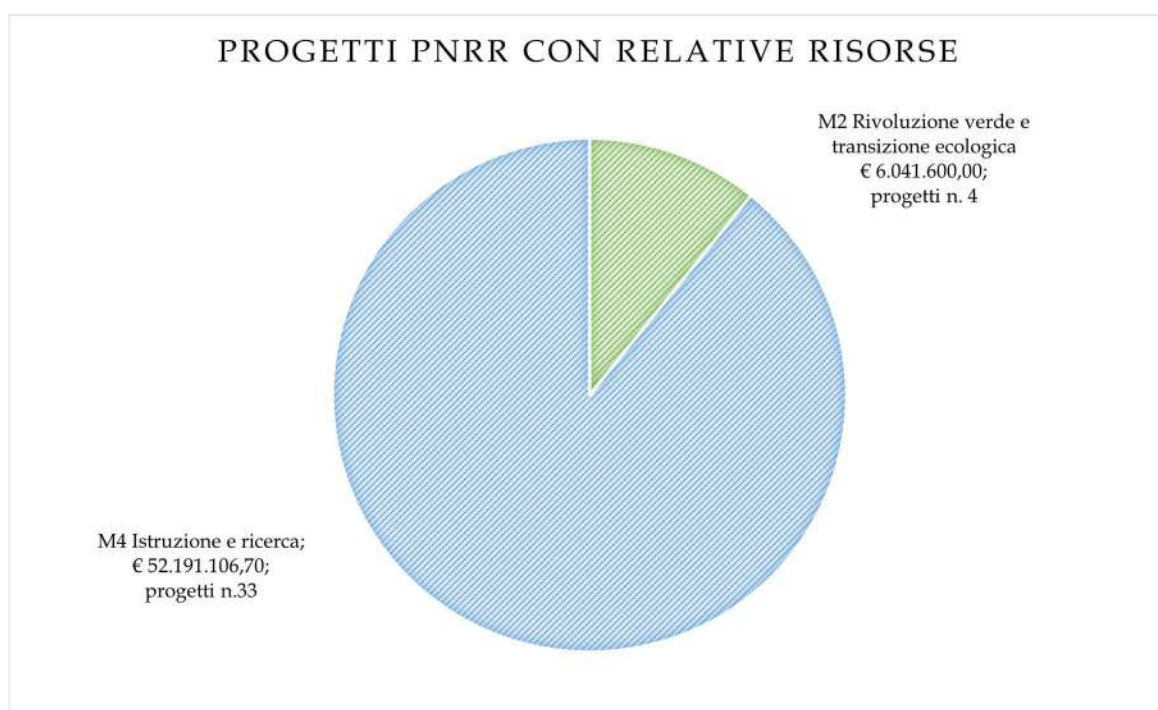

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Perugia

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta essere la M4 "Istruzione e ricerca" (euro 52.191.106,70 per 33 progetti), la quale assorbe l'89,63% del totale delle risorse; alla Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica", corrispondono 4 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 6.041.600,00, pari al 10,37% del totale delle risorse.

Per uno dei 37 progetti la copertura finanziaria viene assicurata da risorse non afferenti al PNRR o al PNC, per un valore di euro 717.000,00; 10 progetti risultano finanziati con sole risorse del PNC per un valore complessivo di euro 3.722.731,00.

Per i 47 progetti, le Amministrazioni Titolari degli interventi risultano essere le seguenti:

**Tabella 4 – Numero progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti
Ministero dell'istruzione e del merito – MIM	34
Ministero infrastrutture e trasporti - MIT	13
<b>Totale complessivo</b>	<b>47</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Perugia

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 18<sup>16</sup> mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro.

Gli stessi afferiscono tutti alla Missione 4, riguardano interventi di manutenzione straordinaria di Istituti secondari superiori e risultano finanziati con sole risorse provenienti dal PNRR, per un valore complessivo di euro 50.889.068,26; 5 risultano in fase di progettazione, 12 in fase di esecuzione, 1 non è stato avviato.

È emerso, inoltre, che l'Ente abbia ricevuto per i predetti progetti anticipazioni per complessivi euro 6.784.640,78 e che, al 31.12.2022, abbia assunto impegni per euro 2.164.129,74 e disposto pagamenti per complessivi euro 1.287.361,58. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 50.889.068,26, ed i pagamenti effettuati, di euro 1.287.361,58, è pari a circa il 2,52%.

Per quanto riguarda le segnalazioni della provincia di Perugia in relazione al sistema ReGiS, è emerso che per 10 progetti la stessa Amministrazione è in attesa della validazione del quadro economico pre-gara, mentre per 3 progetti non risulta essere stato ancora caricato dal Ministero competente il corrispondente intervento. L'Ente non ha segnalato ritardi nello svolgimento delle attività.

## 4.2 PROVINCIA DI TERNI


Dai dati e dalle informazioni tramessi dalla provincia di Terni con nota del 19 maggio 2023, risultano 18 progetti complessivi, tutti finanziati con risorse PNRR<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> CUP J93H19000680001, J48B20001380001, J73C23000010001, J96F22000110001, J14E21001130001, J15E22000180006, J38B20000480001, J51B21000530001, J55E22000120006, J62C21000580001, J62E20000030001, J63H19000730001, J63H19000980001, J91B21000500001, J92C22000200006, J95E22000120006, J98B20000350001, J99J22000950006.

<sup>17</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

Il totale dei finanziamenti riferibili ai 18 progetti – di cui 14 avviati – ammonta a complessivi euro 14.161.489,61, di cui risorse PNRR per euro 12.955.708,60 ed altre risorse per euro 1.205.781,01, come esposto nel seguente grafico.

Grafico 8 - Distribuzione dei 18 progetti per tipologia di finanziamento

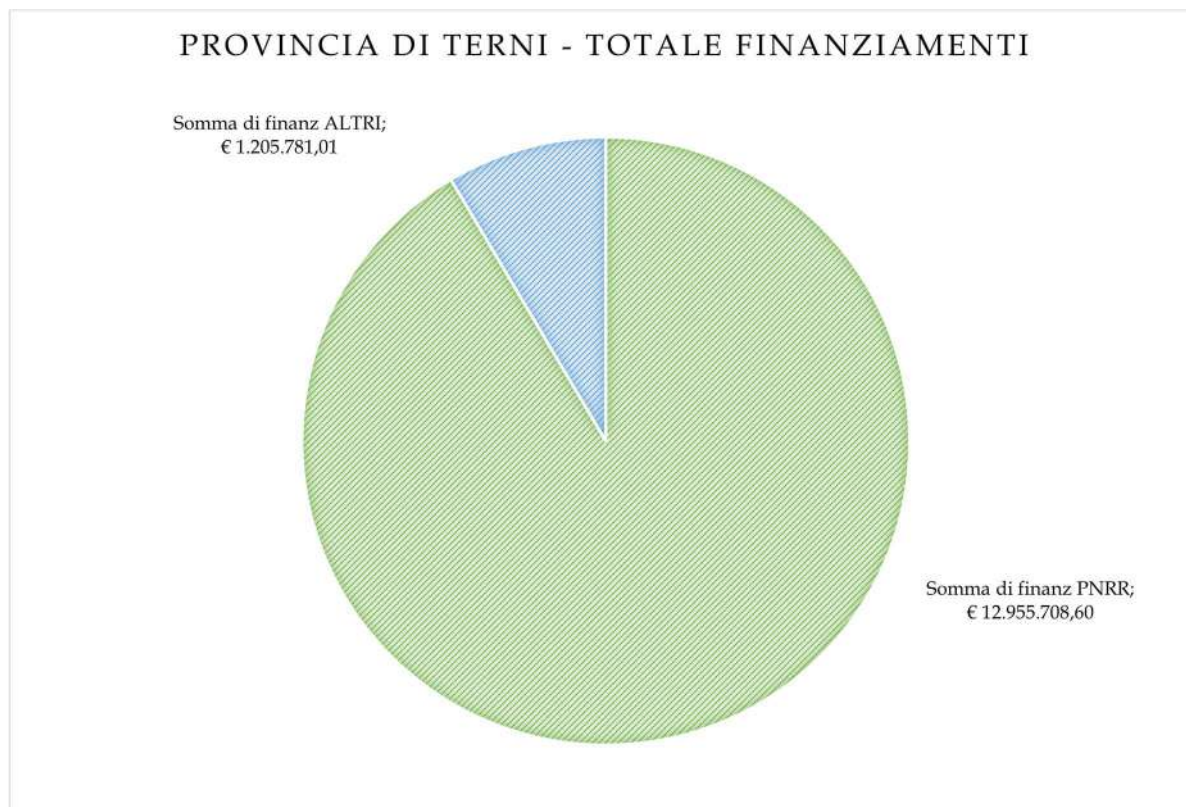

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Provincia di Terni

Al 31 dicembre 2022 risultano assunti impegni per complessivi euro 286.499,25, disposti pagamenti per euro 47.782,92 a valere sulle risorse del PNRR ed al netto di Iva, con anticipazioni ricevute al 31 dicembre 2022 per euro 927.272,36, relativamente a 8 progetti. Lo stato di avanzamento finanziario dei 18 progetti, quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso, di euro 12.955.708,60, ed i pagamenti effettuati, di complessivi euro 47.782,92, è pari allo 0,36%.

I 18 progetti finanziati afferiscono tutti alla Missione 4 - "Istruzione e ricerca" e l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento risulta essere il Ministero dell'istruzione e del merito.

Tra i progetti finanziati con risorse del PNRR, 6<sup>18</sup> mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro.

Gli stessi afferiscono tutti alla Missione 4, riguardano, come per la provincia di Perugia, interventi di manutenzione straordinaria di Istituti secondari superiori; gli interventi risultano finanziati con risorse provenienti dal PNRR per un valore complessivo di euro 9.693.000,00, e con risorse diverse per euro 738.000,00; in base a quanto comunicato, 3 sono in fase di aggiudicazione dei lavori, 1 in fase di progettazione esecutiva e 2 risultano non avviati.

L'Ente ha ricevuto, per i predetti progetti, anticipazioni per complessivi euro 711.600,00 e che, al 31.12.2022, ha assunto impegni per euro 111.707,21 e disposto pagamenti per complessivi euro 6.075,29. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 9.693.000,00, ed i pagamenti effettuati, di euro 6.075,29, è pari a circa lo 0,1%.

La provincia di Terni non ha fornito specifiche informazioni in merito all'utilizzo della piattaforma ReGiS, né segnalato specifiche difficoltà nella gestione delle risorse PNRR. Non vengono riferiti ritardi nello svolgimento delle attività.

### **4.3 COMUNE DI PERUGIA**

Da quanto comunicato dal Comune di Perugia, lo stesso è soggetto attuatore di 58 progetti complessivi finanziati dalle risorse PNRR<sup>19</sup>.


Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti - di cui 50 avviati e 1 già concluso - ammonta a complessivi euro 184.598.525,45, di cui risorse del PNRR per euro 160.001.215,78 e altre risorse estranee al PNRR per euro 24.597.309,67, come esposto nel seguente grafico.

---

<sup>18</sup> CUP F48B20000530001, F42E20000090001, F43F20000010001, F45F22000340006, F34E22000080006, F45E20000420002.

<sup>19</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.

### Grafico 9 - Distribuzione dei 58 progetti per tipologia di finanziamento

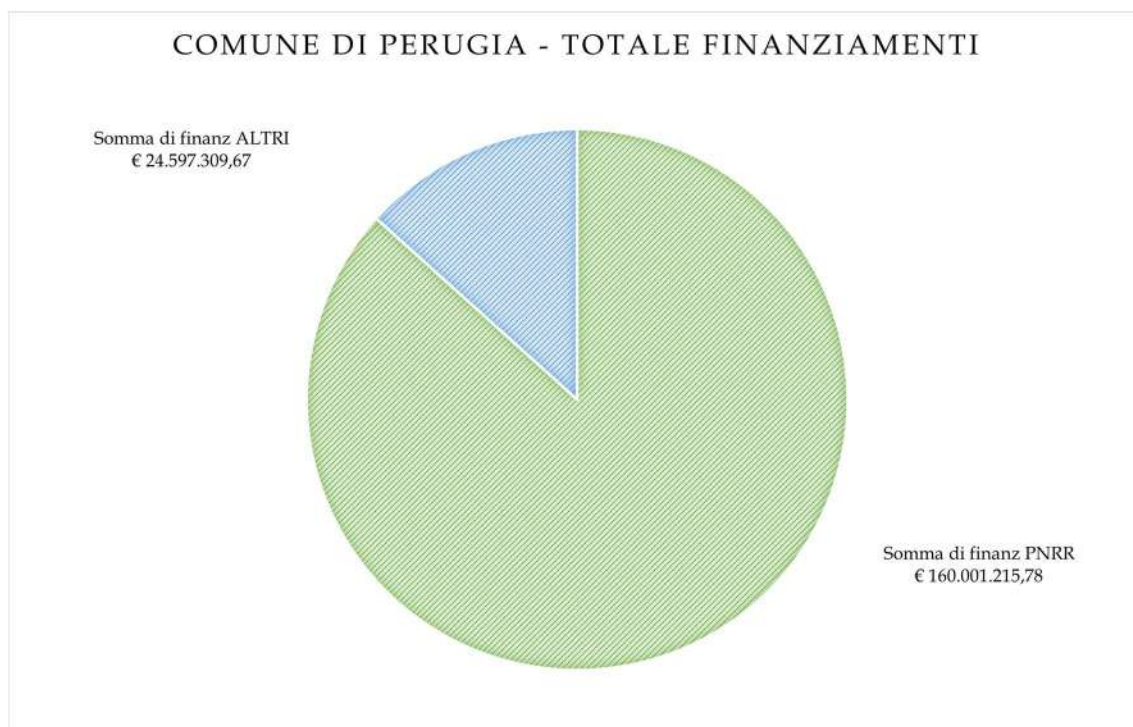


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Perugia

Risultano assunti impegni al 31.12.2022 per complessivi euro 1.328.423,66, con pagamenti effettuati a valere sulle risorse del PNRR al netto Iva per euro 167.112,09 e a valere su altre risorse per euro 58.936,90, con anticipazioni ricevute alla medesima data per euro 13.851.901,37 su 26 dei 58 progetti. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra i finanziamenti complessivamente concessi per i predetti progetti ed i pagamenti effettuati, è pari a circa lo 0,12%.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 58 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

**Grafico 10 – Distribuzione dei 58 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni**

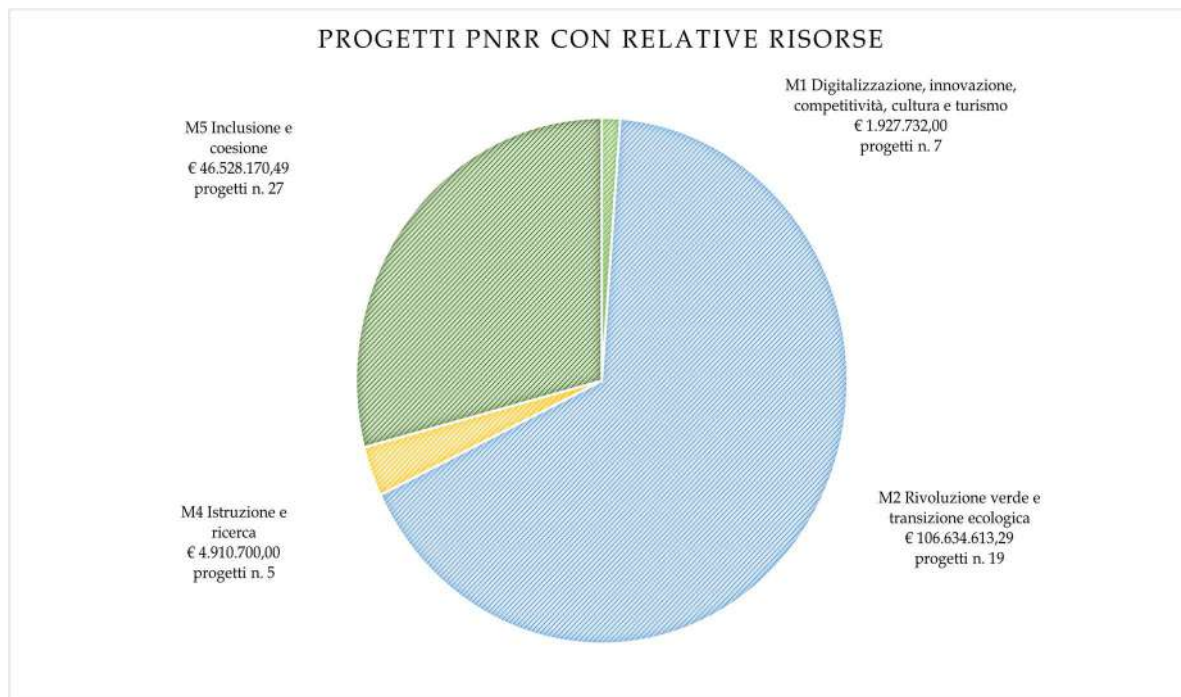

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Perugia

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta essere la M2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (euro 106.634.613,29 per 19 progetti), la quale assorbe il 66,65% del totale delle risorse; alla Missione 5 “Inclusione coesione”, corrispondono 27 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 46.528.170,49, pari al 29,08% del totale delle risorse; alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” sono stati destinati euro 4.910.700,00, per 5 progetti (3,07%) ed alla Missione M1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” euro 1.927.732,00 per 7 progetti (1,20%).

Per i 58 progetti, le Amministrazioni titolari degli interventi risultano essere le seguenti:

**Tabella 5 – Numero progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (PINQUA)	16
Ministero dell'interno (Piccole opere)	11
Ministero dell'interno (Rigenerazione urbana)	5

Ministero dell'istruzione	6
PCM - Dip Protezione Civile	2
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale	7
PCM - Dipartimento per lo sport	2
<b>Totale complessivo</b>	<b>58</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Perugia

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 22 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; tra questi, 5 progetti risultano finanziati anche con risorse estranee al PNRR.

Di tali interventi, 6<sup>20</sup> – di cui 4 di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – afferiscono alla Missione 2. A fronte di finanziamenti con risorse PNRR per euro 103.824.218,8 e con altre risorse per euro 19.471.082,91, risultano anticipazioni di euro 9.517.025,58, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 320.419,52 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 147.795,70.

Un intervento (CUP C91C22000510006), di titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, finanziato con risorse PNRR per euro 1.031.574,00, afferisce alla Missione 1 ed è volto alla abilitazione al *cloud* per le Amministrazioni locali; con riferimento a tale progetto non risultano assunti impegni né disposti pagamenti al 31.12.2022.

Con riferimento alla Missione 4 risultano 2 interventi (CUP C91B21002500001 e C99J22000350006), di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, finanziati con risorse PNRR per euro 3.785.000,00 e con altre risorse per euro 275.000,00; al 31.12.2022 risultano assunti impegni per euro 192.363,49 e non disposti pagamenti.

Alla Missione 5 afferiscono 13 progetti<sup>21</sup>, per un finanziamento totale di euro 40.523.610,22 a valere su risorse PNRR e di euro 4.571.226,76 a valere su altre risorse; al 31.12.2022 risultano riconosciute anticipazioni per euro 3.806.361,05, assunti impegni per euro 265.162,96 e non disposti pagamenti.

<sup>20</sup> CUP C90J22000020001, C91B21006380001, C91B22001050006, C91B22001880001, C91B22001900001, C98H22000380002.

<sup>21</sup> CUP C84H22000290006, C91B21000930001, C93D21001630001, C93D21001640001, C94E21000060001, C95B22000110006, C95F21000480005, C97H21000420001, C97H21002230001, C99J21007650001, F93D21000880001, H94E21000070006, H99J21000380001.

Dei 22 interventi descritti, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 149.164.403, 3 risultano non avviati e, in base a quanto comunicato, 14 in progettazione, 2 in fase di predisposizione del bando e del capitolato di gara, 1 in corso di aggiudicazione, 1 in fase di inserimento del CUP. In una sola ipotesi (CUP C91B21002500001) è stato segnalato il mancato rispetto del termine conclusivo di fase, con registrazione di uno scostamento di 10 giorni *“dovuto a integrazioni del progetto definitivo da porre a base di gara per appalto integrato a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi”*.

L'Ente ha complessivamente ricevuto, per i predetti progetti, anticipazioni per euro 13.323.386,6 e, al 31.12.2022, ha assunto impegni per euro 777.945,97 e disposto pagamenti per complessivi euro 147.795,7. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 149.164.403, ed i pagamenti effettuati, di euro 147.795,7, è pari a circa lo 0,09%.

Il comune di Perugia ha evidenziato il mancato inserimento del CUP in ReGiS con riferimento a 3 progetti; in merito alle attività svolte, l'Ente ha segnalato il mancato rispetto del cronoprogramma con riferimento a tre fattispecie: in due ipotesi è stato registrato uno slittamento di pochi giorni; in un caso, si riferisce di ritardi dovuti alla rivisitazione del progetto in esito al percorso partecipativo con la cittadinanza, senza indicazione dei termini conseguentemente rideterminati.

#### **4.4 COMUNE DI TERNI**

Il comune di Terni risulta soggetto attuatore di 7 progetti, integralmente finanziati con risorse del PNRR<sup>22</sup> per euro 2.899.153,00, in relazione ai quali non risultano assunti impegni e disposti pagamenti al 31.12.2022, con conseguente avanzamento finanziario pari a zero.


Di seguito è graficamente esposta la distribuzione per Missioni dei 7 progetti.

---

<sup>22</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.



**Grafico 11 - Distribuzione dei 7 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni**

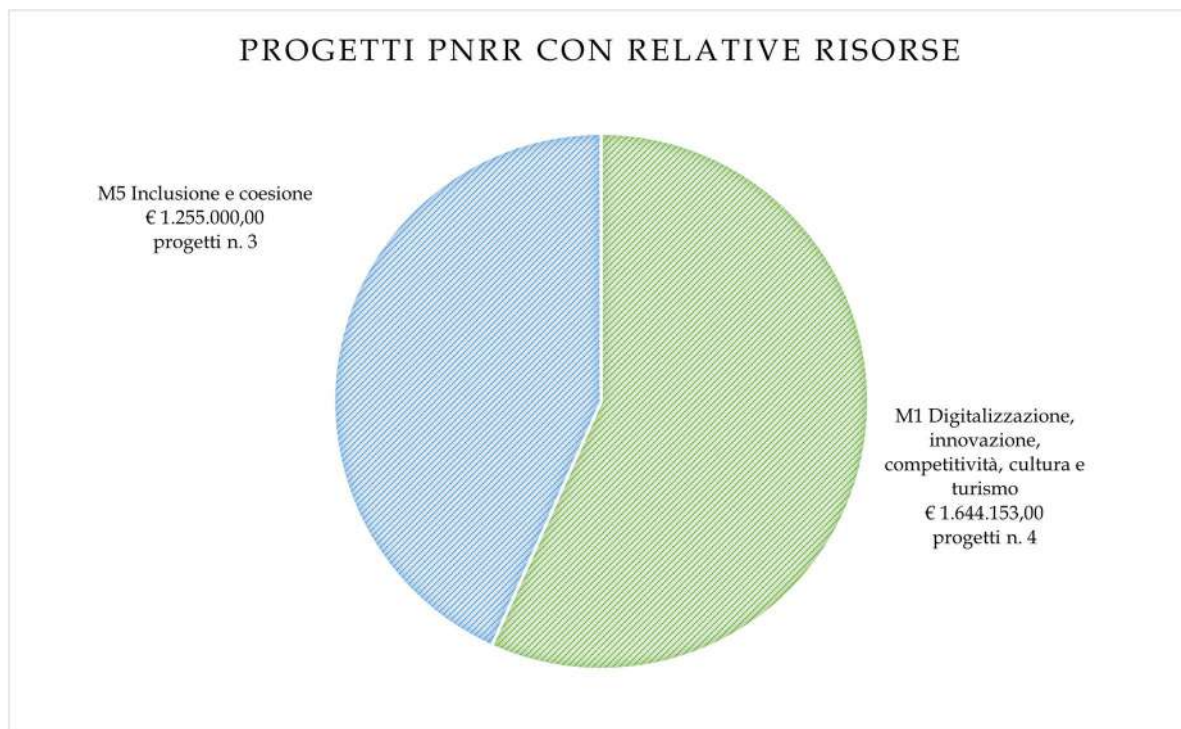

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Terni

I finanziamenti sono destinati principalmente alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” (euro 1.644.153,00 per 4 progetti), la quale assorbe il 56,71% del totale delle risorse; alla Missione 5 - “Inclusione e coesione” corrispondono 3 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 1.255.000,00, pari al 43,29% del totale delle risorse. Per i 7 progetti, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi risultano le seguenti:

**Tabella 6 - Numero progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3
PCM - Dipartimento della trasformazione digitale	4
<b>Totale complessivo</b>	<b>7</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Terni

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, solo uno mostra un valore pari o superiore ad un milione di euro. Si tratta di un intervento di “implementazione di un Piano

di migrazione al cloud per 20 servizi” (CUP F41C23000050006), finanziato per euro 1.003.880,00 e afferente alla Missione 1 (M1C1I1.2); come per gli altri interventi, a fronte dell’assenza di impegni e pagamenti, lo stato d’avanzamento finanziario è pari a zero. In merito l’Ente ha indicato, quale fase procedurale tempestivamente completata, l’inserimento del CUP, da effettuarsi entro il 21.01.2023; non viene indicata la data di conclusione dell’intervento.

In merito all’utilizzo della piattaforma ReGiS, il comune di Terni ha riferito di non aver rilevato particolari criticità; analogamente, l’Ente non ha segnalato difficoltà con più ampio riguardo all’utilizzo tempestivo e corretto del complessivo finanziamento. Non sono stati segnalati ritardi negli adempimenti connessi alle attività previste.

## **4.5 COMUNI UMBRI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15 MILA ABITANTI**

Dai dati e dalle informazioni tramessi dai Comuni umbri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti<sup>23</sup>, questi risultano soggetti attuatori di 234 progetti complessivi finanziati dalle risorse PNRR<sup>24</sup>.


Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti – di cui 180 avviati – ammonta a complessivi euro 150.164.860,78, di cui risorse PNRR per euro 138.800.928,08, risorse PNC per euro 7.583.575,00 ed altre risorse per euro 3.780.357,70, come esposto nel seguente grafico.

---

<sup>23</sup> Hanno fornito riscontro i comuni di Assisi, Bastia umbra, Città di Castello, Corciano, Foligno, Gubbio, Marsciano, Narni, Orvieto, Spoleto, Todi, Umbertide.

<sup>24</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all’appendice.


**Grafico 12 - Distribuzione dei 234 progetti per tipologia di finanziamento**

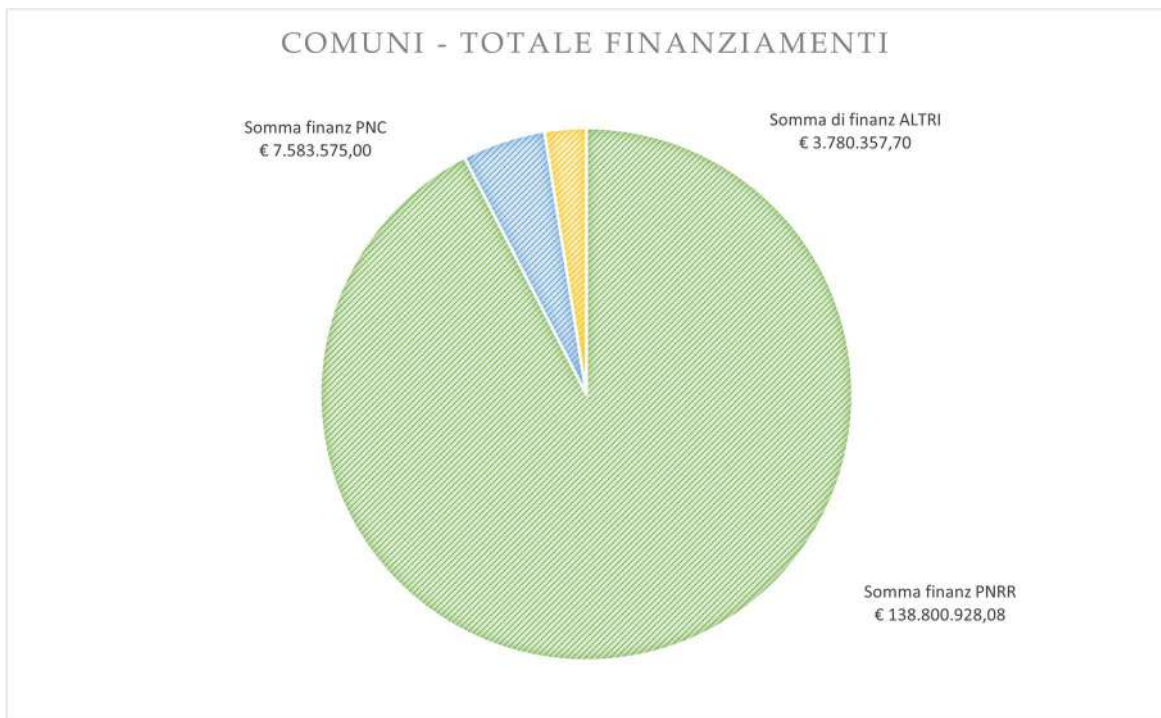

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 234 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

**Grafico 13 - Distribuzione dei 234 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni**

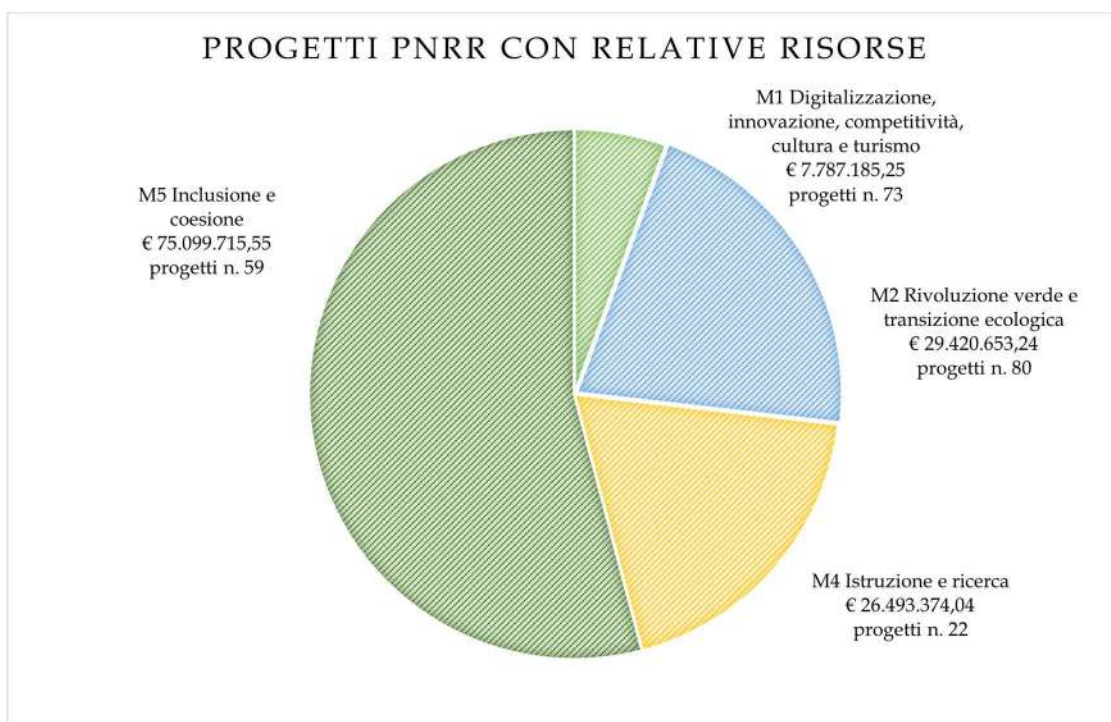

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta la M5 - "Inclusione e coesione" (euro 75.099.715,55 per 59 progetti), la quale assorbe il 54,1% del totale delle risorse; alla Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica", corrispondono 80 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 29.420.653,24, pari al 21,3% del totale delle risorse; alla Missione 4 - "Istruzione e ricerca" sono stati destinati euro 26.493.374,04, per 22 progetti (19%) ed alla Missione 1 - "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" euro 7.787.185,25, per 73 progetti (5,6% circa).

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 39 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; 5 interventi risultano finanziati anche con risorse estranee al PNRR.

Nell'ambito della Missione 2 risultano finanziati 5 progetti<sup>25</sup>- 4 attivati ed 1 concluso - riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'interno, per euro 14.734.235,69, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 1.822.452,78 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 721.928,01.

Con riferimento alla Missione 4 risultano finanziati 10 progetti<sup>26</sup>, tutti avviati e riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito, per euro 19.551.974,04, con anticipazioni ricevute per euro 590.280,00, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 405.571,57 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 30.187,59.

Risultano, infine, finanziati 24 progetti<sup>27</sup> afferenti alla Missione 5 - di cui 2 non avviati - principalmente riferiti al Ministero dell'interno, per euro 58.232.790,78, con anticipazioni ricevute per euro 3.938.053,6, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 747.282,29 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell'IVA per euro 3.982,00.

Conclusivamente, con riferimento ai 39 progetti descritti - di cui, per quanto comunicato, 21 sono in fase di progettazione, 4 in fase di aggiudicazione, 6 in fase di stipula del contratto, 2 collaudati, 1 concluso e 2 non avviati -, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore

---

<sup>25</sup> CUP G77H20000940004 (comune di Assisi), G11B22000280006 (comune di Città di Castello), D33H19000670001 (comune di Corciano), J47H19001540005 (comune di Todì), I87H20001370001 (comune di Umbertide).

<sup>26</sup> CUP G78H22000010001 e G75E22000160006 (comune di Assisi), G15E22000270006 e G11B22000850006 (comune di Città di Castello), B31B22001200006 (comune di Narni), I49I23000010006 (comune di Orvieto), B33H20000540005 (comune di Spoleto), J45E22000060006 e J45E22000050006 (comune di Todì), I88I22000050006 (comune di Umbertide).

<sup>27</sup> CUP G73I22000110001 e G75F21000310001 (comune di Assisi); C81B21006730001 e C87H21001880001 (comune di Bastia Umbra); G13D21001150001 e G13D21001160001 (comune di Città di Castello); D37H21001430001 (comune di Corciano); C69J21016770001, C61B21003590005, C69J21016740001, C69J21016760001, C69J21016730001, C61B21003680001 e C65B22000110006 (comune di Foligno); J64E21000630001 (comune di Marsciano); B74H22000160006, B14H22000280006, B33D21002590001, B31B21003790001 (comune di Narni); I44E21002090001 (comune di Orvieto); B33D210027600018 (comune di Spoleto); J43D21003110001 (comune di Todì); I81B21002390001 e I81B21002380001 (comune di Umbertide).

complessivo di euro 92.519.000,51, gli Enti hanno disposto pagamenti per complessivi euro 756.097,6. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 92.519.000,51 ed i pagamenti effettuati, di euro 756.097,6, è pari a circa lo 0,08%.

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, gli Enti hanno segnalato criticità con riferimento a 28 progetti, sia manifestando generale difficoltà nell'utilizzo della piattaforma, sia segnalando le richieste di assistenza formulate. Per 5 interventi gli Enti hanno rappresentato difficoltà nel rispetto del cronoprogramma.

## **4.6 COMUNI UMBRI CON POPOLAZIONE TRA 5 E 15 MILA ABITANTI**

Dai dati trasmessi dai Comuni umbri con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti<sup>28</sup>, risultano 101 progetti complessivi finanziati dalle risorse PNRR<sup>29</sup>.


Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti - di cui 69 avviati - ammonta a complessivi euro 32.470.417,65, di cui risorse PNRR per euro 29.750.557,96 ed altre risorse per euro 2.719.859,69, come esposto nel seguente grafico.

---

<sup>28</sup> Hanno fornito riscontro i comuni di Amelia, Deruta, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Magione, Montefalco, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Giustino, Spello, Trevi

<sup>29</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.


**Grafico 14 - Distribuzione dei 101 progetti per tipologia di finanziamento**

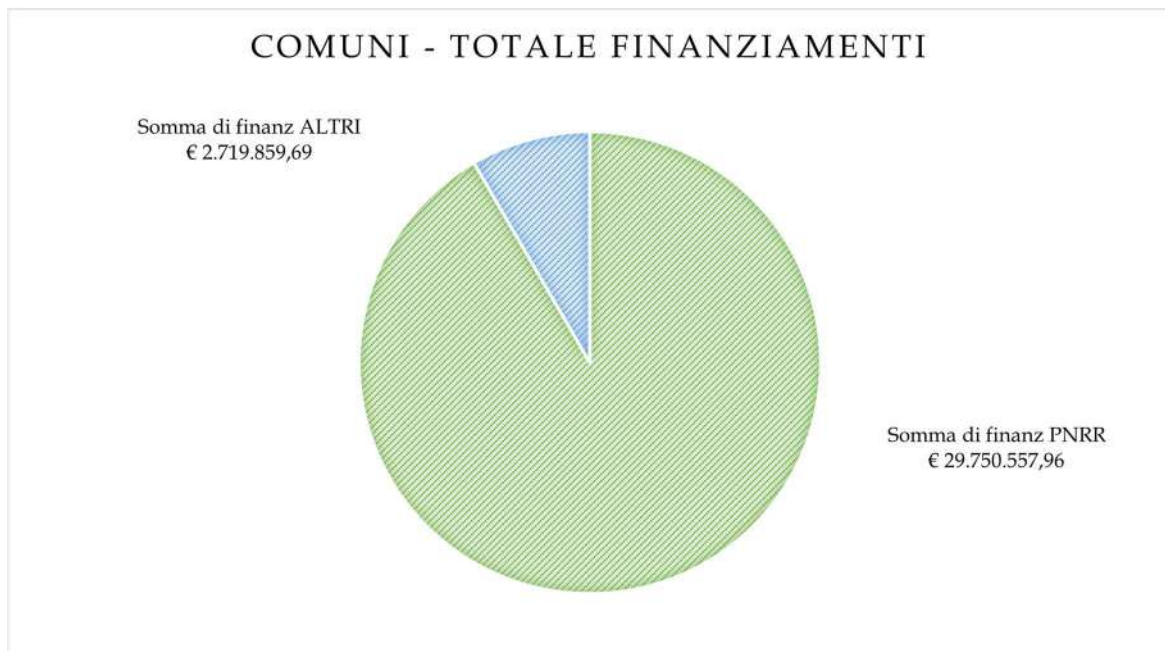

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 101 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

**Grafico 15 - Distribuzione dei 101 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni**

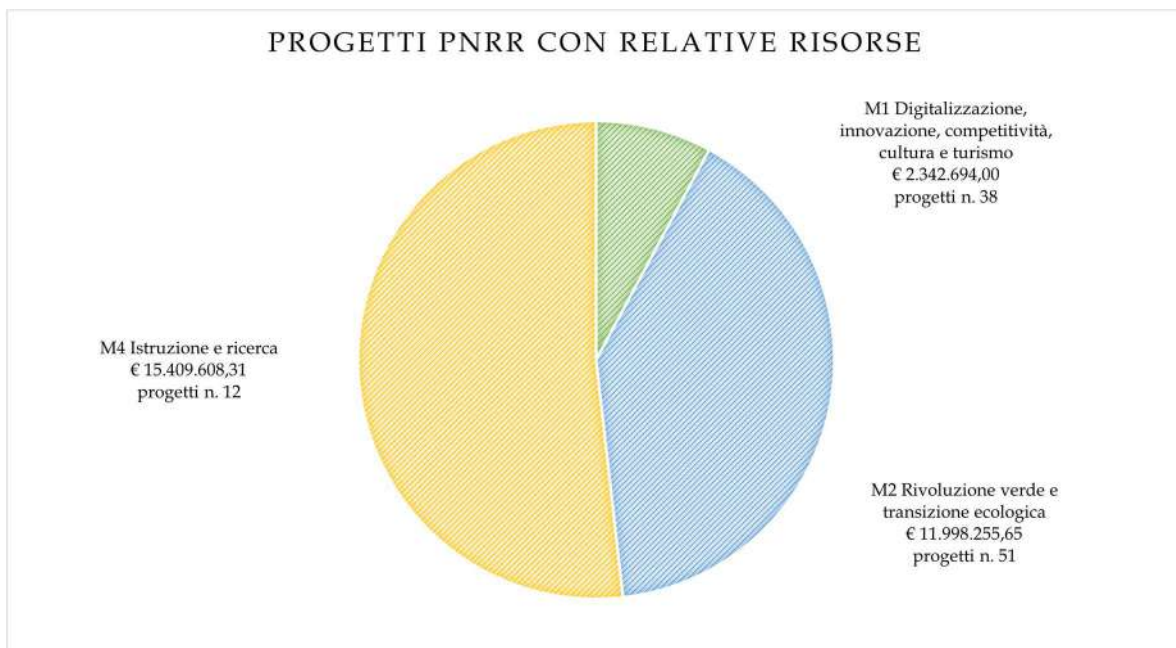

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta la M4 “Istruzione e ricerca” (euro 15.409.608,31 per 12 progetti), la quale assorbe circa il 52% del totale delle risorse; alla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, corrispondono 52 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 11.998.255,65, pari al 40% del totale delle risorse; alla Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” sono stati destinati euro 2.342.694,00, per 38 progetti (8% circa).

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 9 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; solo un intervento risulta finanziato con risorse estranee al PNRR.

Nell’ambito della Missione 2 risultano finanziati 2 progetti<sup>30</sup>, riferiti al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’interno, per euro 3.687.899,65, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 984.614,00 e nessun pagamento disposto alla medesima data.

Con riferimento alla Missione 4 risultano finanziati, inoltre, 7 progetti<sup>31</sup>, tutti riferiti al Ministero dell’istruzione e del merito, per euro 13.128.024,31, con anticipazioni ricevute per euro 240.000,00, impegni assunti al 31.12.2022 per euro 2.769.228,31 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR al netto dell’IVA per euro 195.625,01.

Conclusivamente, con riferimento ai 9 progetti descritti - tutti avviati, e, per quanto comunicato, 3 in fase di progettazione, 3 in aggiudicazione e 2 affidati - finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 16.815.923,96, gli Enti hanno disposto pagamenti per complessivi euro 195.625,01. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 16.815.923,96, ed i pagamenti effettuati, di euro 195.625,01, è pari a circa 1,16%.

In merito all’utilizzo del sistema ReGiS, gli Enti hanno segnalato criticità per 15 progetti. Non emergono ritardi nell’attuazione.

---

<sup>30</sup> CUP G31B22000640006 (comune di Amelia) e C97H20001600001 (comune di Montefalco).


<sup>31</sup> CUP B53H19000610005 (comune di Deruta); I21B22000010006 e I25F22000000006 (comune di Gualdo Tadino); J54E22000380006 e J51B22000670002 (comune di Magione); B59J22001430002 e B55E22000210006 (comune di San Giustino).

## 4.7 COMUNI UMBRI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5 MILA ABITANTI

Dai dati trasmessi dai Comuni umbri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti<sup>32</sup>, risultano 506 progetti complessivi, sui 562 totali, finanziati dalle risorse PNRR<sup>33</sup>.

Il totale dei finanziamenti riferibili a tali progetti – di cui 311 avviati – ammonta a complessivi euro 124.478.382,99, di cui risorse PNRR per euro 83.402.370,51, risorse PNC per euro 36.447.205,53 ed altre risorse per euro 4.628.806,95, come esposto nel seguente grafico.

Grafico 16 - Distribuzione dei 506 progetti per tipologia di finanziamento

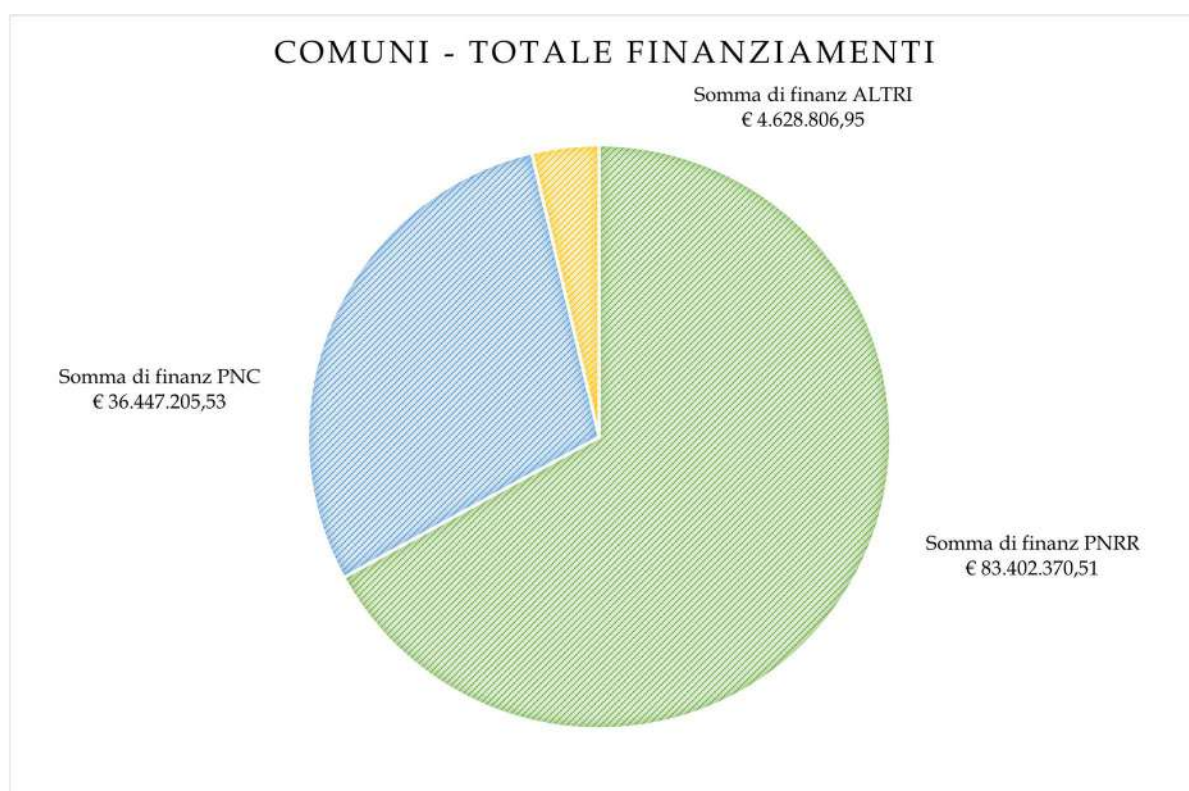

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.


Si illustra graficamente di seguito la distribuzione per Missioni dei 506 progetti finanziati dalle risorse provenienti dal PNRR.

<sup>32</sup> Hanno fornito riscontro i comuni di Acquasparta, Alleronia, Alviano, Arrone, Attigliano, Avigliano umbro, Baschi, Bettona, Bevagna, Calvi dell'Umbria, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Costacciaro, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Guardea, Lisciano Niccone, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Monteleone di Spoleto, Montone, Norcia, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Piegara, Pietralunga, Porano, Preci, San Gemini, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Stroncone, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina.

<sup>33</sup> Per una disamina dei dati disaggregati si rimanda all'appendice.



Grafico 17 - Distribuzione dei 506 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni

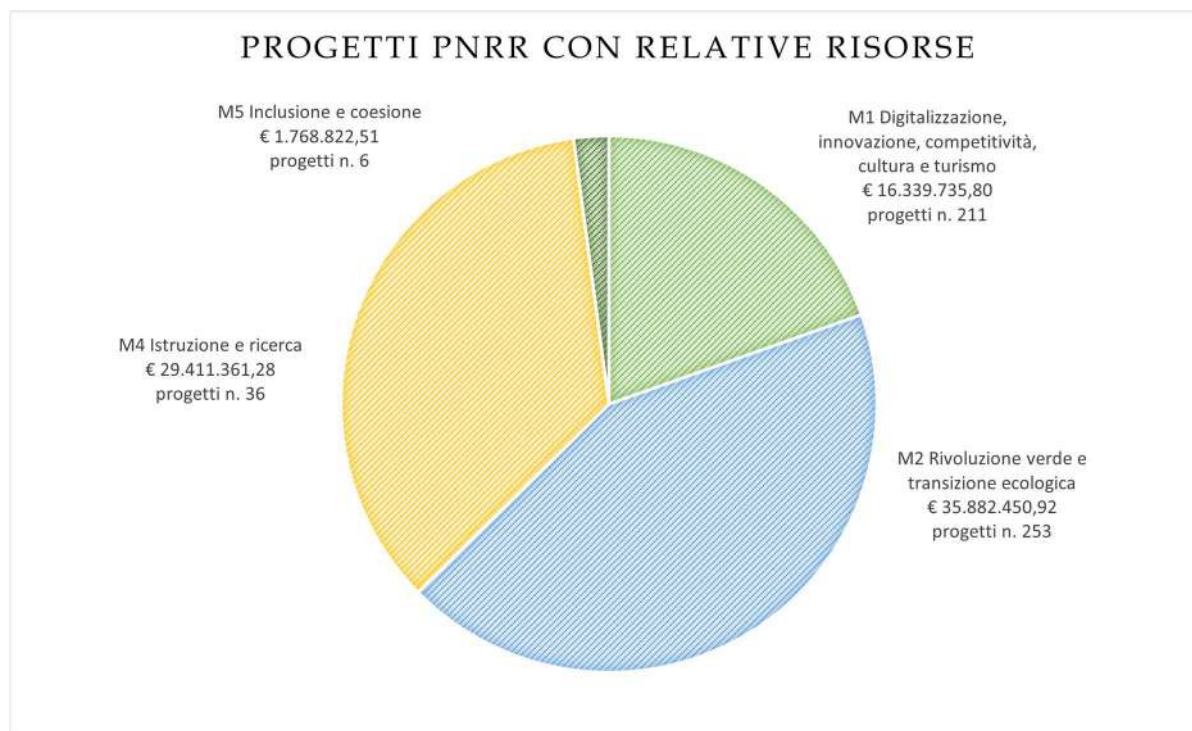

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati EE.LL.

La Missione destinataria della maggior parte dei finanziamenti risulta essere la M2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (euro 35.882.450,92 per 253 progetti), la quale assorbe il 43,03% del totale delle risorse; alla Missione 4 - “Istruzione e ricerca” corrispondono 36 progetti, per un finanziamento complessivo di euro 29.411.361,28, pari al 35,27% del totale delle risorse; alla Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” sono stati destinati euro 16.339.735,80, per 211 progetti (19,59 %) ed alla Missione 5 - “Inclusione e coesione” euro 1.768.822,51, per 6 progetti (2,2%).

Tra i progetti finanziati principalmente con risorse del PNRR, 18 mostrano un valore pari o superiore ad un milione di euro; solo due interventi risultano finanziati con risorse estranee al PNRR.

Nell’ambito della Missione 1 risultano finanziati 5 progetti<sup>34</sup>, tutti riferiti al Ministero della cultura, per euro 8.716.973,80, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 506.588,66 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR, al netto dell’IVA, per euro 27.000,00.

<sup>34</sup> CUP E16C22000000006 (comune di Allerona), J74H22000060006 (comune di Massa Martana), D83G22000010006 (comune di Monte Castello di Vibio), I57B22000020006 (comune di Otricoli), J29I22000140004 (comune di Pietralunga).

Risultano, poi, finanziati 3 progetti relativi alla Missione 2<sup>35</sup>, riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito, per euro 7.494.946,28; due progetti non sono stati avviati e risulta che non sia stato assunto alcun impegno e disposto alcun pagamento con risorse PNRR al 31.12.2022.

Con riferimento alla Missione 4 risultano finanziati, inoltre, 10 progetti<sup>36</sup>, tutti riferiti al Ministero dell'istruzione e del merito, per euro 15.979.663,94, con impegni assunti al 31.12.2022 per euro 1.452.621,11 e pagamenti alla medesima data disposti con risorse PNRR, al netto dell'IVA, per euro 1.333,00.

Conclusivamente, dei 18 progetti descritti, finanziati dalle risorse del PNRR per un valore complessivo di euro 32.191.584,02, 4 non sono stati ancora avviati e, per quanto comunicato, 4 sono in fase di aggiudicazione, 2 in esecuzione e 6 in fase di progettazione; gli Enti hanno disposto pagamenti per complessivi euro 28.333,00. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato quale rapporto tra il finanziamento complessivamente concesso per i citati progetti, di euro 32.191.584,02, ed i pagamenti effettuati, di euro 28.333,00, è pari a circa 0,08%.

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, gli Enti hanno segnalato criticità in relazione a 68 progetti, dovute tendenzialmente all'assenza del CUP nel sistema o a difficoltà nell'utilizzo di quest'ultimo. Sono stati segnalati ritardi nell'esecuzione con riferimento a due interventi.

---

<sup>35</sup> CUP F22C22000050006 (comune di Alviano), I96J14000590001 (comune di Castel Viscardo), H11B22001190007 (comune di San Gemini).

<sup>36</sup> CUP G95E22000040006 (comune di Acquasparta), B13G23000000006 (comune di Bevagna), I35E22000190006 (comune di Cannara), J78I2100050006 (comune di Massa Martana), G38H22000070006 (comune di Montone), J25E22000230006 (comune di Pietralunga), D98E18000080001 (comune di Porano), D72J23000000002 (comune di scheggia e Pascelupo), B13H19000790001 (comune di Sigillo), D95E22000200006 (comune di Valfabbrica).

## 5 REGIS IL QUADRO EMERGENTE DALLA BANCA DATI REGIS SUI PROGETTI DEL PNRR IN UMBRIA


Dalla banca dati ReGiS, sono stati estrapolati, alla data del 4 luglio 2023, mediante la ricerca “Analisi libera”, i progetti relativi agli interventi finanziati dalle risorse del PNRR che risultano avere attuazione sul territorio regionale, escludendo quelli con ambito di attuazione nazionale. La tabella ed il grafico che seguono mostrano la ripartizione dei 3.339 progetti così censiti per Amministrazioni centrali titolari dell'intervento:

**Tabella 7 - Numero progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti
Ministero affari esteri e cooperazione internazionale	44
Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste	152
Ministero ambiente e sicurezza energetica	4
Ministero dell'università e della ricerca	47
Ministero del lavoro e politiche sociali	33
Ministero della cultura	354
Ministero della giustizia	1
Ministero della salute	133
Ministero dell'interno	588
Ministero dell'istruzione e del merito	1071
Ministero imprese e del made in Italy	24
Ministero infrastrutture e trasporti	70
PCM - Dipartimento affari regionali e autonomie	9
PCM - Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universitario	61
PCM - Dipartimento politiche di coesione	10
PCM - Dipartimento protezione civile	40
PCM - Dipartimento trasformazione digitale	691
PCM - Dipartimento per lo sport	7
<b>Totale complessivo</b>	<b>3339</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

**Grafico 18 – Ripartizione dei 3339 progetti PNRR per amministrazione centrale titolare dell'intervento**

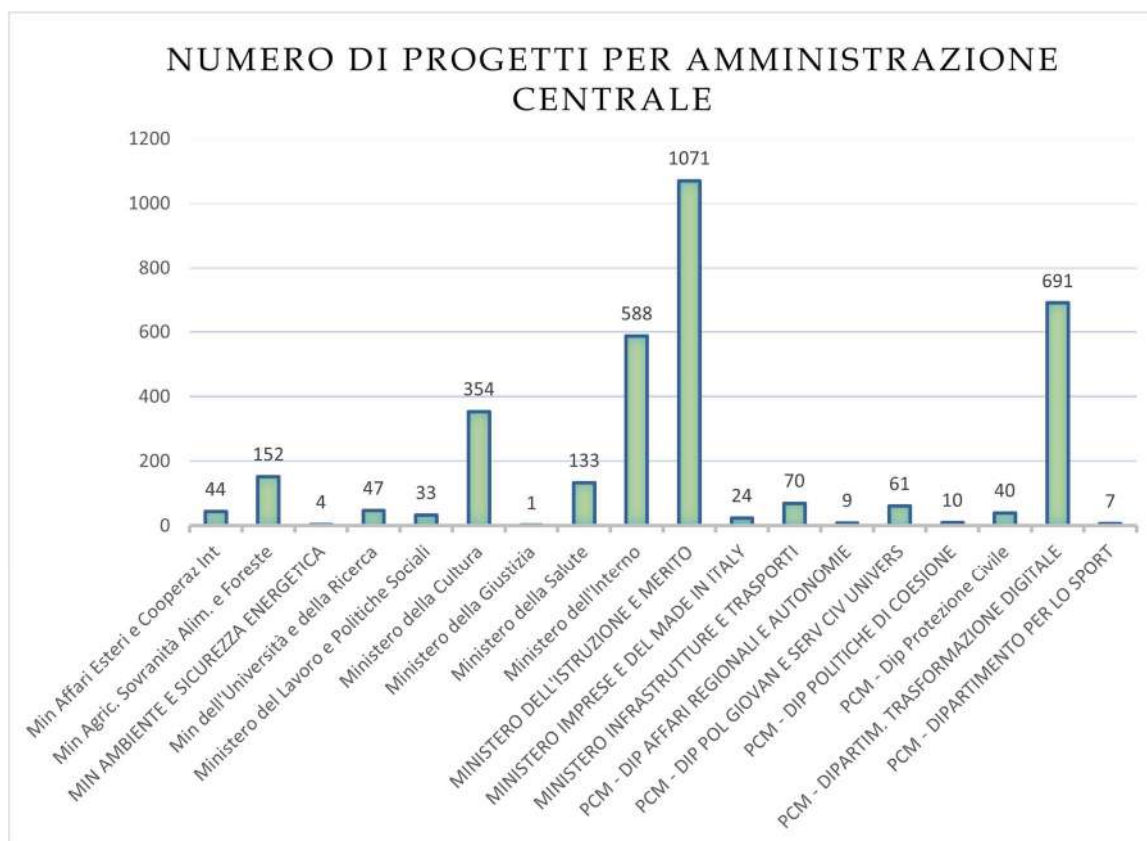

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

L'Amministrazione centrale titolare del maggior numero di progetti (1071) risulta il Ministero dell'istruzione e del merito, seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento trasformazione digitale (691 progetti). Significativi appaiono gli interventi riferiti al Ministero dell'interno (588), al Ministero della cultura (354), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (152) ed al Ministero della salute (133).

Di seguito si illustra il costo ammesso degli interventi ed i pagamenti effettuati al momento registrati dal sistema, come ripartiti tra le diverse Amministrazioni titolari degli interventi.

**Tabella 8 – Costo ammesso e pagamenti dei progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti	Costo ammesso (m€)	Pagamenti (m€)
Ministero affari esteri e cooperazione internazionale	44	9.247.820,00	3.543.910,00
Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste	152	11.358.884,74	0,00
Ministero ambiente e sicurezza energetica	4	723.847.888,00	0,00
Ministero dell'università e della ricerca	47	51.098.533,02	0,00
Ministero del lavoro e politiche sociali	33	19.956.554,49	0,00
Ministero della cultura	354	53.098.252,68	741.548,13
Ministero della giustizia	1	1.595.000,00	4.964,00
Ministero della salute	133	95.263.909,00	923.121,91
Ministero dell'interno	588	159.602.134,56	13.017.971,05
Ministero dell'istruzione e del merito	1071	233.142.354,55	2.976.743,81
Ministero imprese e del made in Italy	24	5.297.084,46	0,00
Ministero infrastrutture e trasporti	70	266.267.294,09	5.129.481,27
PCM - Dipartimento affari regionali e autonomie	9	4.000.000,00	0,00
PCM - Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universitario	61	47.539.671,76	0,00
PCM - Dipartimento politiche di coesione	10	11.999.567,49	0,00
PCM - Dipartimento protezione civile	40	23.386.662,08	1.491.296,73
PCM - Dipartimento trasformazione digitale	691	25.678.500,60	216.744,35
PCM - Dipartimento per lo sport	7	16.800.000,00	215.134,27
<b>Totale complessivo</b>	<b>3339</b>	<b>1.759.180.111,52</b>	<b>28.260.915,52</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

Risulta, pertanto, che, rispetto ai 3339 progetti che hanno ambito d'attuazione nel territorio regionale, il totale del costo ammesso ammonta ad euro 1.759.180.111,52 ed i pagamenti effettuati registrati dal sistema ammontano a complessivi euro 28.260.915,52.

Dai dati esposti si evince, più in particolare, che per i 4 progetti nella titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – destinatari della parte più rilevante delle risorse del PNRR (723,8 milioni di euro) – non risulta disposto ancora alcun pagamento. Il maggior numero di progetti (1071) risulta, come visto, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, per complessivi 233,1 milioni di euro, con pagamenti effettuati per complessivi 2,9 milioni di euro.

Per i 70 progetti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta un costo ammesso di 266,2 milioni di euro e pagamenti effettuati per un ammontare complessivo di 5,1 milioni di euro.


La tabella ed il grafico che seguono mostrano la ripartizione per Amministrazione centrale titolare dell'intervento della quota di progetti (in totale 1.735) di competenza degli enti territoriali umbri:

**Tabella 9 - Numero progetti per amministrazione titolare**

Ministero Titolare	Progetti
Ministero del lavoro e politiche sociali	32
Ministero della cultura	302
Ministero della salute	129
Ministero dell'interno	588
Ministero dell'istruzione e del merito	161
Ministero infrastrutture e trasporti	64
PCM - Dipartimento politiche di coesione	6
PCM - Dipartimento protezione civile	29
PCM - Dipartimento trasformazione digitale	417
PCM - Dipartimento per lo sport	7
<b>Totale complessivo</b>	<b>1735</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGIS.

**Grafico 19 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali umbri per amministrazione centrale titolare dell'intervento**

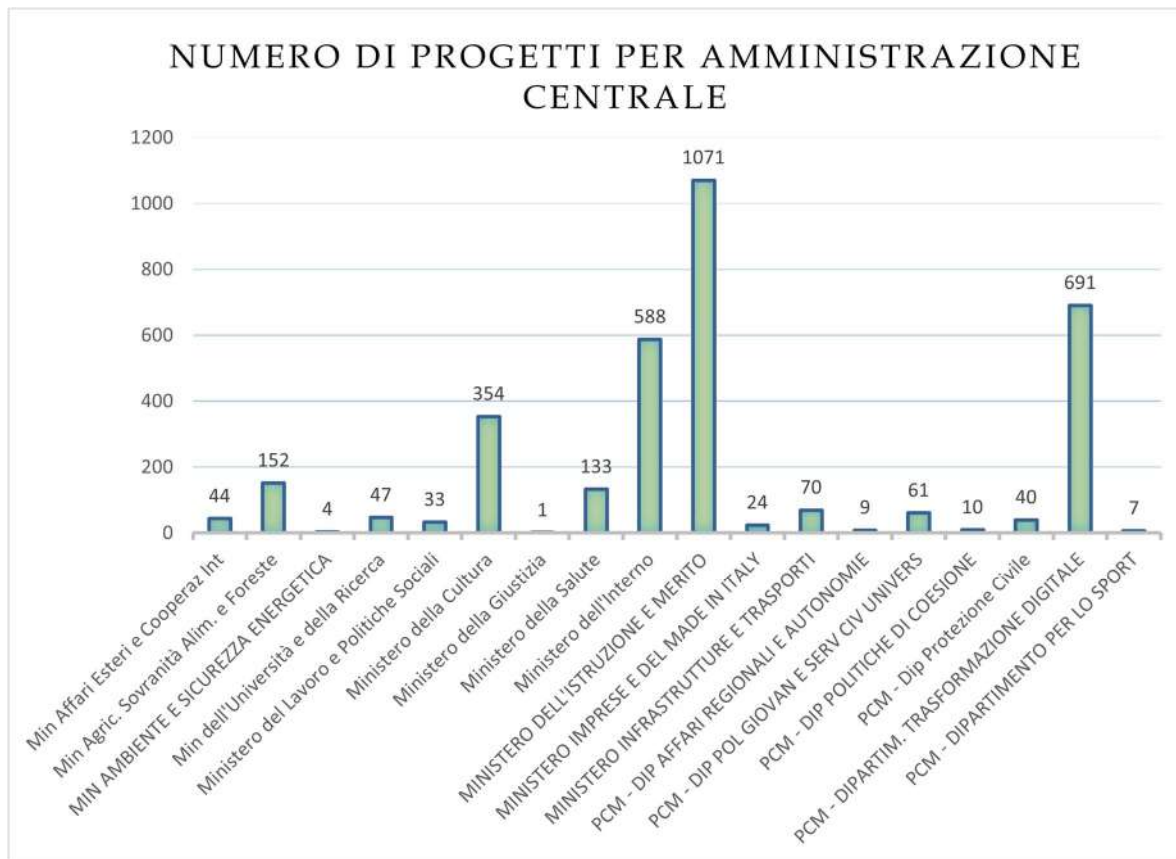


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

L'Amministrazione centrale titolare del maggior numero dei progetti (588) risulta il Ministero dell'interno, seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento trasformazione digitale con 417 progetti, dal Ministero della cultura con 302 progetti, dal Ministero dell'istruzione e merito con 161 progetti e dal Ministero della salute con 129 progetti.

Si rappresenta graficamente di seguito la ripartizione dei 1735 progetti per Missioni.

**Grafico 20 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali tra le differenti Missioni**

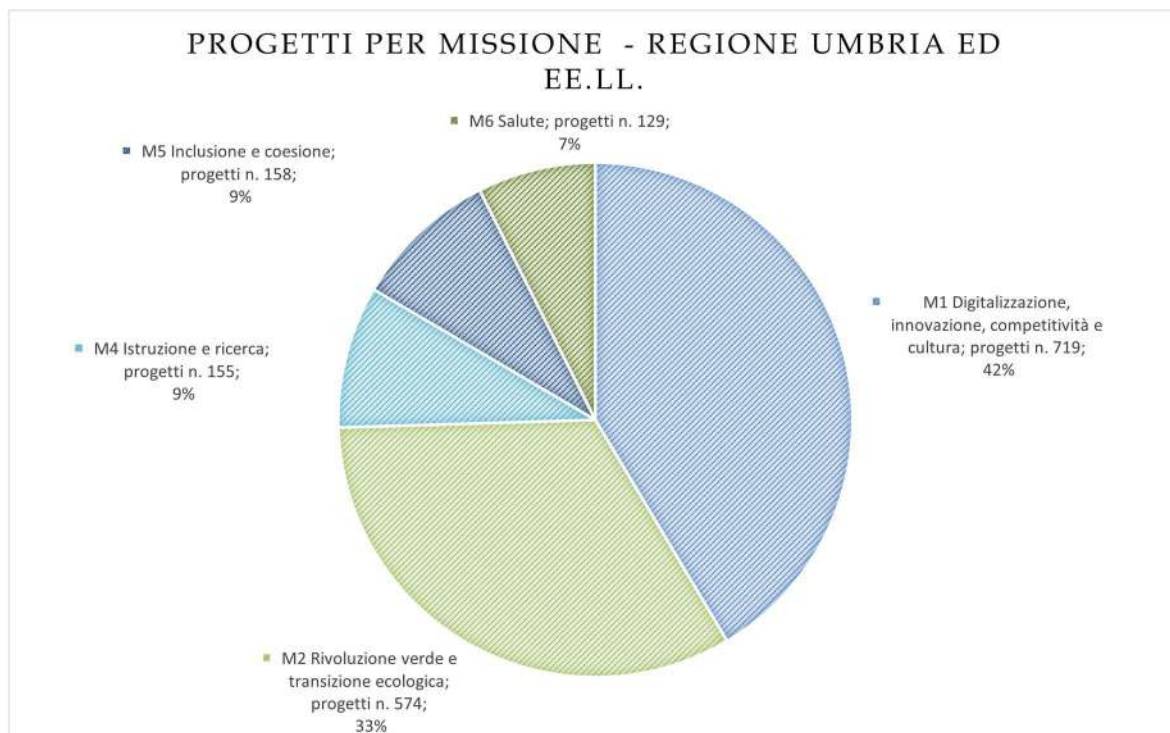

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

La Missione in cui si concentrano la maggior parte dei progetti PNRR (719, pari al 42% del totale) è la M1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, seguita dalla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” con 574 progetti (33% del totale), dalle Missioni 5 - “Inclusione e coesione” e 4 - “Istruzione e ricerca” con 158 e 155 progetti (9% del totale) e, infine, dalla Missione 6 - “Salute” con 129 progetti (7% del totale).

La tabella che segue mostra la ripartizione dei progetti tra le differenti Missioni con indicazione del costo ammesso e dei pagamenti effettuati registrati dal sistema.



**Tabella 10 – Costo ammesso e pagamenti per Missioni**

Ministero Titolare	Progetti - codice CUP	Costo ammesso progetti (m€)	Pagamenti progetti (m€)
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	719	63.824.430,56	280.243,25
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	574	214.548.060,46	14.578.035,35
M4 Istruzione e ricerca	155	167.141.288,22	2.976.743,81
M5 Inclusione e coesione	158	184.646.324,78	333.098,70
M6 Salute	129	94.038.781,00	923.121,91
<b>Totale complessivo</b>	<b>1735</b>	<b>724.198.885,02</b>	<b>19.091.243,02</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ReGiS.

Risulta, pertanto, dalla banca dati ReGiS, che, dei 1735 progetti PNRR di competenza degli enti territoriali umbri, il costo ammesso ammonta in totale ad euro 724.198.885,02 ed i pagamenti effettuati ammontano a complessivi euro 19.091.243,02.

I progetti che drenano più risorse fanno riferimento alla Missione 2 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (574) con costo ammesso di 214,5 milioni di euro e pagamenti effettuati per complessivi 14,5 milioni di euro; per i 158 progetti relativi alla Missione 5 - “Inclusione e coesione” risulta un costo ammesso di oltre 184,6 milioni di euro e pagamenti effettuati per complessivi 333 mila euro circa; in relazione ai 129 progetti della Missione 6 - “Salute” il costo ammesso è di circa 94 milioni di euro .

Per i 719 progetti della Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, il costo ammesso risulta inferiore a quanto risultante per le altre Missioni (63,8 milioni di euro); i pagamenti disposti sono pari a circa 280 mila euro.

## 6 CONCLUSIONI

Il monitoraggio svolto dalla Sezione in merito alla gestione delle risorse del PNRR e allo stato di attuazione dei progetti di competenza della Regione e degli Enti locali umbri ha consentito, in primo luogo, di censire i progetti finanziati ed individuarne il valore complessivo. Dei 1194 interventi segnalati - finanziati con risorse PNRR per euro 647.492.060,11 - 410 risultano riferiti alla Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (euro 200.158.959,74), 137 alla Missione 5 - "Inclusione e coesione" (euro 154.355.609,7), 126 alla Missione 4 - "Istruzione e ricerca" (euro 141.371.858,93) e 422 alla Missione 1 - "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", connotata, però, da minori finanziamenti totali (euro 51.422.000,93). Alla Missione 6 - "Salute", coinvolgente unicamente la Regione, afferiscono 100 progetti (euro 100.183.630,77). Oltre il 40% di tali progetti risultano di competenza di Amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

L'indagine della Sezione ha riguardato specificamente gli interventi con valore pari o superiore ad un milione di euro. Sono stati verificati 154 progetti - pari al 13% del totale - per un valore complessivo di euro 465.701.441, pari al 72% delle risorse totali; di tali interventi, 9 sono riferiti alla Missione 1 (euro 19.718.039,99), 18 alla Missione 2 (euro 139.922.687,02), 53 alla Missione 4 (euro 113.026.700,55), 48 alla Missione 5 (euro 115.263.424,3) e 26 alla Missione 6 (euro 77.770.589,13). Il 26% dei progetti è gestito dalla Regione (41), 24 progetti risultano di competenza delle due Province (16%) e 89 interventi sono riferiti alle Amministrazioni comunali (58%), 18 dei quali affidati a Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (12%).

Sia rispetto a tale significativo campione, sia con riferimento alla totalità dei progetti, è stato possibile accertare - sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Enti, che sul punto risultano aggiornate al mese di maggio 2023, momento di invio dei riscontri alle richieste istruttorie della Sezione - il tendenziale rispetto del cronoprogramma delle attività predisposto: su 1194 progetti, sono stati segnalati ritardi solo con riferimento a 14 interventi, dei quali uno con valore finanziato superiore al milione di euro. Dei 154 interventi selezionati per valore - dei quali 17 non sono stati avviati - 50, pari a circa un terzo, sono in fase di progettazione, e 36, pari al 23% circa, risultano in fase di aggiudicazione. La realizzazione appare, pertanto, ordinata e generalmente tempestiva, rispetto alle scadenze prefissate; d'altro canto, si nota che, a fronte delle complessive scadenze per la conclusione degli interventi, al più previste per il 30

giugno il 2026, allo stato attuale i progetti si trovano generalmente ad un grado iniziale di realizzazione: soli 16 interventi sono in esecuzione, 2 in fase di collaudo ed uno concluso. Si registra, parallelamente, uno stato d'avanzamento finanziario embrionale. A fronte di finanziamenti con risorse PNRR per euro 465.701.441, risultano disposti pagamenti al 31.12.2022 per euro 3.540.761,27, pari allo 0,7%.

Gli Enti hanno dato dimostrazione d'adeguamento generale alle previsioni in tema di tracciabilità delle operazioni e di tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR. Dalle verifiche concernenti il campione di interventi selezionati per valore, sulla base delle dichiarazioni formulate dagli Enti nella compilazione delle tabelle fornite, risultano sporadici casi di mancato rispetto delle previsioni dell'art. 9, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, 77<sup>37</sup>, riscontrati nelle informazioni fornite da alcune delle Amministrazioni comunali, in particolare le meno popolose, e dalla provincia di Terni, con riferimento a parte dei progetti.

Appare, infine, meritevole di specifica segnalazione il riscontro di ripetute segnalazioni da parte degli Enti circa difficoltà nell'utilizzo del sistema ReGiS. Tra le Amministrazioni coinvolte nell'indagine, solo il comune e la provincia di Terni non hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo del sistema. In particolare, oltre a generali difficoltà nell'utilizzo della piattaforma e conseguenti richieste di assistenza formulate, con frequenza è stata segnalata l'assenza del CUP all'interno del sistema.

---

<sup>37</sup> Circolare MEF 26 luglio 2022, n. 29

## 7 APPENDICE

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
da perfezionare	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Mission 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 1	2.3	3.786.422,57			NO		€ -	€ -	€ -	NO							Con nota MASAF - Sgr Sicilia DISR - Pci, Interno Ministero Agricoltura e Foreste, il 20/03/2023 è stato comunicato alle Regioni di non tener conto della data del 30/03/2023 indicata nel Concorso per l'adozione Bandi causa adeguamento in corso normativa in materia di aiuti di Stato
84E21025920006	Contributo per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel processo di attuazione del PNRR - PNRR M1C1 - Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Componente 1	Assistenza tecnica a livello centrale e locale	7.000.000,00		NO	NO	NO	€ 1.379.613,08	€ 1.201.472,00	€ -	SI	01.09.2021	REPORT SEMESTRALE DI MONITORAGGIO	31-12-2022	SI	30.09.2025	CARICAMENTO DEI DATI NELLA PORTALE DI MONITORAGGIO, VERIFICA E AGGIORNAMENTO MENSILE DEI DATI CARICATI SU REGIS	
83C22000640005	per la realizzazione dei subinvestimenti del programma Salute Ambiente Biodiversità e Clima art 11 comma 2 D.L. 59	Collegato Missione 6 "Salute"	Componente 1	1.1		1.866.019,80		no					SI		entro 31 marzo 2023 (T1 2023): determinazione dell'importo di spesa per la realizzazione del progetto (ovvero formalizzazione della richiesta di offerta o di lettera invito) relativo agli interventi di ammodernamento di strutture regionali - entro 30 giugno 2023 (T2 2023): aggiudicazione interventi di ammodernamento di strutture e delle fabbricati, ovvero conclusione delle procedure di appalto per la fornitura di beni o servizi - entro 30 settembre 2023 (T3 2023): avvio degli interventi di ammodernamento attraverso la stipula dei contratti (ovvero i lavori degli stessi in regime di urgenza)	31/03/2023	SI	31/12/2023	COMPETENZA ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	LA REGIONE UMBRIA E' SOGGETTO REALIZZATORE IN VIRTU' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CONSTITUITO SUPERIORE SANITA' CON LA REGIONE UMBRIA, RATIFICATO IN DATA 18/02/2023 CON DURATA FINALE 31/12/2026. A SUA VOLTA LA REGIONE UMBRIA HA STIPULATO ACCORDI ATTUATIVI CON ARPA, ASL UMBRIA 1 E ASL UMBRIA 2 A CUI SONO STATE DELEGATE LE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTI, IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E' COFINANZIATO DALLA REGIONE UMBRIA E DALLA REGIONE UMBRIA PER UN TOTALE TEMPORALE DI 4 ANNI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.679.208,00. PER L'ANNO 2023 LE RISORSE ASSEGNATE DAL SOGGETTO ATTUATORE (ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA') SONO COMPLESSIVAMENTE PARI A EURO 1.866.019,80. LE RISORSE DEVONO TRADURRE IN IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BENI DI INVESTIMENTO NECESSARI PER DARE ATTUAZIONE AL PROGETTO PNC INVESTIMENTO 1.1: RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS - SNPA A LIVELLO REGIONALE, REGIONALE E LOCALI, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CAPACITA' UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA. PERTANTO QUESTA
B9E2000490001	Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale"	Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo)	Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0)	Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"	1.563.612,19	0	0	NO	0	€ -	€ -	€ -	SI		1. Analisi fabbisogni/Finilizzazione strategie di gara 2. Realizzazione atti di gara per l'affidamento	presumibile 15/02/2023		30/09/2025 Milestone M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate nella Digital Library, per la Regione Umbria target € 390.903	* Le tempistiche delle fasi procedurali sono concordate tra MC Digital Library e Invitalia sulla base dell'anzianità delle elaborazioni progettuali della DL (elenco prezzi (prestazioni) e sono soggette a flessibilità in funzione di problematiche emerse	
B9E2000490001	Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale"	Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo)	Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0)	Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"	1.563.612,19	0	0	NO	0	€ -	€ -	€ -	SI		2. Realizzazione atti di gara per l'affidamento	*		30/09/2025 Milestone M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali prodotte e pubblicate nella Digital Library, per la Regione Umbria target € 390.903	* A seguito di interruzione con DL e Invitalia che è stata sospesa per conto della Regione	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
B9220049001	Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale"	Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo)	Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0)	Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"	1.563.612,19	0	0	NO	0	€ -	€ -	€ -	Si	3. Pubblicazione gara	-		30/06/2025 Missione M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali per la pubblicazione e l'aggiornamento della Digital Library; per la Regione Umbria target 390.903 risorse digitali		* A seguito di interruzione con DL e Invalita cte è stata sospesa l'attività per conto della Regione
B9220049001	Sub. I. 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale"	Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo)	Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0)	Investimento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"	1.563.612,19	0	0	NO	0	€ -	€ -	€ -	Si	4. Esecuzione (Accordo Quadro; O.d.A.; Contratto specifico; S.A.L.; Accertamento esecuzione)	30/06/2025		30/06/2025 Missione M1C3-2 scadenza T4 2025: 65 milioni di risorse digitali per la pubblicazione e l'aggiornamento della Digital Library; per la Regione Umbria target 390.903 risorse digitali		
					127.695,77	0	0	no	no	€ -	€ -	€ -	no						DGR n. 1108 del 26/10/2022
					134.687,67	0	0	no	no	€ -	€ -	€ -	no						DGR n. 1108 del 26/10/2022
					123.921,49	0	0	no	no	€ -	€ -	€ -	no						DGR n. 1108 del 26/10/2022
					120.948,23	0	0	no	no	€ -	€ -	€ -	no						DGR n. 1108 del 26/10/2023
					176.896,85	0	0	no	no	€ -	€ -	€ -	no						DGR n. 1108 del 26/10/2024
					151.578,41	0	0	no	no	€ -	€ -	€ -	no						DGR n. 1108 del 26/10/2025

Missione 1

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
		"Organizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Componente 1																
					107.810,43	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	no						DGR n. 1108 del 26/10/2026
					115.614,57	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	no						DGR n. 1108 del 26/10/2027
					73.474,49	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	no						DGR n. 1108 del 26/10/2028
					128.516,47	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	no						DGR n. 1108 del 26/10/2029
					257.678,43	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	no						DGR n. 1108 del 26/10/2030
					216.241,19	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	no						DGR n. 1108 del 26/10/2031
61F2003280006	Reti di servizi di facilitazione digitale	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Componente 1	1.7.2	75000	0	0	no	€ -	€ -	€ -	-	NO						DGR n. 1108 del 26/10/2022
692100020008	D.M. 31/05/2021 Rinnovo licita treni per trasporto regionale con mezzi elettrici e idrogeno	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 2	4.4.2	6.394.964,07 €	0,00 €	0,00 €	no	€ -	€ -	€ -	-	SI	Avvio della procedura (data determina e contrarre o atti assimilabili)	30/06/2023	si	07/04/2023	Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA	
														Aggiudicazione Contratti di Fornitura	30/06/2023			Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA	
														Consegna rotabili (intermedia e prevista dal Contratto di Fornitura)	31/12/2024			Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA	
														Messa in servizio (intermedia)	31/12/2024			Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA	
														Consegna finale rotabili (prevista dal Contratto di Fornitura)	31/12/2024			Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA	
														Messa in servizio ultima unità rotabili	31/12/2024			Caricamento step a cura del soggetto attuatore TRENITALIA SPA	
														Setteconservazione contratti relativi alle forniture ed infrastrutture di supporto	31/12/2022	si	30/12/2022	Caricamento step a cura del soggetto attuatore Umbria TPL e Mobilità S.p.A. su BIDAP	
6902101750001	D.M. 31/05/2021 Acquisto autobus ad alimentazione a metano, elettrico ed idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, sedili di trasporto pubblico.	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 2	4.4.1	0,00 €	10.139.185,00 €	0,00 €	no	€ -	€ -	€ -	-	SI	Realizzazione del 50% del programma di forniture	31/12/2024			Caricamento step a cura del soggetto attuatore Umbria TPL e Mobilità S.p.A. su BIDAP	
														Completamento del programma di forniture	31/12/2026			Caricamento step a cura del soggetto attuatore Umbria TPL e Mobilità S.p.A. su BIDAP	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RIBORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
I17B22000320004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	95.243,35 €	- €	23.810,84 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I17B22000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	95.243,35 €	- €	23.810,84 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I17B22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	95.243,35 €	- €	23.810,84 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I18C22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	#####	si	- €	- €	- €	- €	si	Firma atto d'obbligo	03-gen-23	si	18-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I18C22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	#####	si	- €	- €	- €	- €	si	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I8C22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	#####	si	- €	- €	- €	- €	si	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
I8C22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	115.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	03-gen-23	si	20-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
I8C22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	115.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
I8C22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	115.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
I8C22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	104.500,65 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I8C22000390006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	104.809,65 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I8C22000390006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	104.809,65 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I8C22000340004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	58.809,60 €	- €	14.702,40 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I8C22000340004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	58.809,60 €	- €	14.702,40 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I8C22000340004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	58.809,60 €	- €	14.702,40 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
87B22000350004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	40.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000350004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	40.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000350004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	40.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	77.878,00 €	- €	19.470,00 €	si	- €	- €	- €	- €	- €	si	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	77.878,00 €	- €	19.470,00 €	si	- €	- €	- €	- €	- €	si	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
87B22000380004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	77.878,00 €	- €	19.470,00 €	si	- €	- €	- €	- €	si	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	119.720,00 €	- €	29.930,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	-	-		rinuncia con Pec n. 274574 del 15 dicembre 2022
87B22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	134.978,88 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	134.978,88 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000380006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	134.978,88 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RIBORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RIBORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
137B22000390006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.970.00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
137B22000390006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.970.00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
137B22000390006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.970.00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000260004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000.00 €	- €	600.00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	14-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000260004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000.00 €	- €	600.00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
138C22000260004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000270004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	19-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000270004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000270004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	41.370,03 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I38C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	41.370,03 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	41.370,03 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	148.560,00 €	- €	37.140,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	148.560,00 €	- €	37.140,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	148.560,00 €	- €	37.140,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
138C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 216.360,00 €	- € 216.360,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	19-dic-22	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 216.360,00 €	- € 216.360,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 216.360,00 €	- € 216.360,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000310006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	13-dic-22	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000310006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
138C22000310006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000320006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	19-dic-22	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000320006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000320006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IL CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
138C22000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	-	-		rinuncia con Pec n. 17849 del 25 gennaio 2023

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
138C22000340006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000340006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000340006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000350006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
138C22000350006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
I38C22000350006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	282.051,20 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	19-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	282.051,20 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I38C22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	282.051,20 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H47B22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	37.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H7B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	37.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H7B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	37.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H7B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	41.537,20 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	14-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H7B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	41.537,20 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H7B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	41.537,20 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
H7B23000000004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	57.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	no	22-feb-23	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	A seguito di accoglimento di domanda di riesame istanza è stata presentata istanza di annullamento con DD n. 1246 del 08/02/2023
H7B23000000004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	57.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H7B23000000004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	57.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H8C22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	66.616,11 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H8C22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	66.616,11 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H8C22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	65.616,11 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000220004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	144.000,00 €	- €	36.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000220004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	144.000,00 €	- €	36.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000220004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	144.000,00 €	- €	36.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	34.139,75 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	14-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H8C22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	34.139,75 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	34.139,75 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	78.400,00 €	- €	19.600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	13-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	78.400,00 €	- €	19.600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	
H8C22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	78.400,00 €	- €	19.600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema RegIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
H8C22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	132.532,50 €	- €	33.233,13 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H8C22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	132.532,50 €	- €	33.233,13 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
H8C22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	132.532,50 €	- €	33.233,13 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
57522000250006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	148.312,53 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	-	-		rinuncia con Pec n. 277930 del 20 dicembre 2022
57522000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	72.080,70 €	si	- €	- €	- €	- €	si	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	13-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
5752200023004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	72.080,70 €	si	- €	- €	- €	- €	si	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
5752200023004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	72.080,70 €	si	- €	- €	- €	- €	si	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
5752200024006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	147.800,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
5752200024006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	147.800,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
5752200024006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	147.800,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
57B22000250006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
57B22000250006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
57B22000250006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
57B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	12-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
57B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
IS7B23000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS7B23000000004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	123.308,43 €	- €	30.827,11 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	no	24-feb-23	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	A seguito di accoglimento di domanda di riesame finanza è stata ammessa a finanziamento con DD n. 1246 del 06/02/2023
IS7B23000000004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	123.308,43 €	- €	30.827,11 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS7B23000000004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	123.308,43 €	- €	30.827,11 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000280006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.966,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
IS8C22000280006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.996,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000280006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.996,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	69.150,67 €	- €	17.287,67 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	SI	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	69.150,67 €	- €	17.287,67 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	69.150,67 €	- €	17.287,67 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
IS8C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	128.000,00 €	- €	32.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	128.000,00 €	- €	32.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giù-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	128.000,00 €	- €	32.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	54.866,39 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
IS8C22000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	54.866,39 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giù-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
87B2200020004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	54.866,39 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	78.445,60 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	78.445,60 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	78.445,60 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	135.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
87B22000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	135.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000230006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	135.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	146.865,23 €	- €	#####	si	- €	- €	- €	- €	si	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	14-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	146.865,23 €	- €	#####	si	- €	- €	- €	- €	si	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	146.865,23 €	- €	#####	si	- €	- €	- €	- €	si	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
87B22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	43.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	43.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000240004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	43.500,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	48.951,72 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B22000250004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	48.951,72 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
8782200028004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	48.951,72 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8782200028004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.600,00 €	- €	681.734,72 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8782200028004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.600,00 €	- €	681.734,72 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8782200028004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.600,00 €	- €	681.734,72 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
88C22000210004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	116.000,00 €	- €	29.000,00 €		- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	-	-		non sottoscritte atto d'obbligo inviate con Pec n. 26788Z del 05 dicembre 2022

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
I86C22000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.891,20 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	12-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I86C22000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.891,20 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I86C22000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	149.891,20 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I86C22000230004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	119.959,31 €	- €	29.989,83 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	-	-		rinuncia con Pec n. 267902 del 19 dicembre 2022
I77B22000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	131.916,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I77B22000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	131.916,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	131.916,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000340004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	40.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000340004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	40.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000340004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	40.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I77B22000350004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	10.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000350004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	10.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	10.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	10.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000360004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	10.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I77B22000380004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	10.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	83.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	83.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000370004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	83.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000380004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I77B22000390004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000390004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000390004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	140.000,00 €	- €	35.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000390004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	140.000,00 €	- €	35.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I77B22000390004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	140.000,00 €	- €	35.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I78C22000190004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 185.990,60 €	- € 185.990,60 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	12-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000190004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 185.990,60 €	- € 185.990,60 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000200004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 39.000,00 €	- € 39.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000200004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 39.000,00 €	- € 39.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	sì	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000200004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 39.000,00 €	- € 39.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
I78C2200020004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	39.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000210006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000210006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000210006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I78C22000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	125.225,26 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
178C2000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	125.225.26 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
178C2000220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	125.225.26 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
187B22000320004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000.00 €	- €	13.180.00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	19-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
187B22000320004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000.00 €	- €	13.180.00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
187B22000320004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000.00 €	- €	13.180.00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RIBORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RIBORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
87522000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	106.163,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87522000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	106.163,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87522000330004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	106.163,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
88C22000200006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	19-dic-22	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
88C22000200006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	I CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
88C2200220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B2200220004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B2200220004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B2200220004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
87B2200220006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	14-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
8752200023006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200023006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	- €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200023004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	110.400,00 €	- €	27.600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200023004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	110.400,00 €	- €	27.600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200023004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	110.400,00 €	- €	27.600,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
8752200024004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 428.000,00 €	- € 428.000,00 €	si	- €	- €	- €	si	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200024004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 428.000,00 €	- € 428.000,00 €	si	- €	- €	- €	si	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200024004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 428.000,00 €	- € 428.000,00 €	si	- €	- €	- €	si	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200025004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 381.800,00 €	- € 381.800,00 €	no	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200025004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 381.800,00 €	- € 381.800,00 €	no	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
8752200025004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 381.800,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200026004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 410.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200026004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 410.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200026004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 410.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200027004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- € 50.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	II CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RIBORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RIBORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
8752200270004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	50.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200270004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	50.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	445.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	16-dic-22	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	445.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-gli-23	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
8752200280004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	445.000,00 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	IICUP non risulta registrato nel sistema REGIS	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
87522000290004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	52.098,18 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	-			Rinuncia PEC prot. 61429 del 16/03/23
88C22000370006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	88.500,00 €	- €	- €	si	- €	- €	- €	- €	si	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	si	15-dic-22	Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
88C22000370006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	88.500,00 €	- €	- €	si	- €	- €	- €	- €	si	Inizio lavori	30-giù-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
88C22000370006	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	88.500,00 €	- €	- €	si	- €	- €	- €	- €	si	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	
88C23000300004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Component 3	2.2	150.000,00 €	- €	91.929,87 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Firma atto d'obbligo	31-dic-22	no	27-feb-23	Il CUP non risulta registrato nel sistema ReGIS	A seguito di accoglimento di domanda di riesame istanza è stata ammessa a finanziamento con DD n. 1246 del 06/02/2023



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
I88C2300030004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Componente 3	2.2	150.000,00 €	- €	91.929,87 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Inizio lavori	30-giu-23	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I88C2300030004	"Protezione e valorizzazione dell'Architettura e del paesaggio Rurale"	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"	Componente 3	2.2	150.000,00 €	- €	91.929,87 €	no	- €	- €	- €	- €	no	Fine lavori	31-dic-25	-	-	Il CUP non risulta registrato nel sistema REGIS	
I84E2101860001	Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e librari dell'Umbria - Lotto 1: Realizzazione nuovo edificio, loc. Santo Chiodo - Spoleto	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 3	A3.2 Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali		5.000.000,00	1.300.000,00	No	No	Cap.06905_S - € 6.674,61 Cap.A6905_S - € 152.515,66 Cap.B6905_S - € 125.012,84 Cap.B8905_S - € 0	Cap.06905_S - € 6.674,61 Cap.A6905_S - € 152.515,66 Cap.B6905_S - € 125.012,84 Cap.B8905_S - € 0	€	- si	Approvazione Progettazione (PFFE) a base di gara	30/06/2022	SI	30/06/2022	non ricorre (BDAP)	Accertamenti su prenotazioni € 4.819.514,90
I30D21002470001	Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e librari dell'Umbria - Lotto n. 2: "Recupero dell'ex Mattatoio.	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 3	A3.2 Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali		4.750.000,00	750.000,00	No	No	Cap.06905_S - € 3.3447,51 Cap.A6905_S - € 907.900,46	Cap.06905_S - € 2.831,60 Cap.A6905_S - € 62.743,37	€	- si	Approvazione Progettazione (PFFE) a base di gara	30/06/2022	SI	30/06/2022	non ricorre (BDAP)	Accertamenti su prenotazioni € 4.109.821,45
I15F21000030001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1121 Città di Castello EX Scuola Montessori	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINGUA)	1.244.774,04 €	- €	286.408,87 €	SI	NO	€ 124.477,40	€	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/09/2023	-	31/03/2028	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
I15E210002040001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1143 Città di Castello	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	138.774,89 €	- €	31.815,94 €	SI	€ 13.877,49	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
I24E21000220001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1216 Pietralunga Ex Scuole Agrarie Cardileob	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	2.081.215,40 €	- €	458.005,45 €	SI	€ 208.121,54	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
I34E21000210001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1221 Gubbio Ex Scuola Ponte d'Assi	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	829.049,35 €	- €	183.255,79 €	SI	€ 82.904,94	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
I34E21000220001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1220 Gubbio Ex Tondo	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	594.152,04 €	- €	133.000,78 €	SI	€ 59.415,20	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
I34E21000230001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1222 Gubbio Siano Spirito	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	621.787,02 €	- €	139.365,85 €	SI	€ 62.178,70	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
I51B21000340001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - ID 1140 San Giuliano Ampliamento Scuola Copata	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	57.262,34 €	- €	150.000,00 €	SI	€ 5.726,23	- €	- €	si			si	31/03/2026	CUP NON CENSITO NEL SISTEMA REGIS	ALTRI FINANZIAMENTI INCLUDE FONDI PROPRI COMUNE - INTERVENTO GIA' REALIZZATO DAL COMUNE

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz ALTRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
ISD21000280001	ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 1 - ID 1142 Sanguinetto Sapii vendi Selsi Lama	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	621.869,15 €	- €	754.344,99 €	SI	€ 62.189,92	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI INCLUDE FOI E FONDI PROPRI COMUNE
IS4E21000280001	ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 1 - ID 1129 San Giustino Ex Magazzini Comunal	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	3.500.008,35 €	- €	793.953,21 €	SI	€ 350.000,84	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
IS4E21000280001	ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 1 - ID 1139 San Giustino Ex Scuola Corpasano	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	406.881,70 €	- €	91.293,90 €	SI	€ 40.688,17	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI, DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
IS4E21000370001	ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1218 Cierna Ex Scuole Selsi	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	336.141,74 €	- €	76.155,29 €	SI	€ 33.614,17	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI, DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
IS4E21000380001	ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1219 Cierna Ex Magazzini Patrino	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	276.949,78 €	- €	63.650,80 €	SI	€ 27.634,96	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
IS4E21000370001	ID n. 407 - "Aba Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 3 - ID 1219 Cierna Ex Magazzini Patrino	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	138.174,89 €	- €	30.670,90 €	SI	€ 13.817,49	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
887421000360001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1207 Umbertide Calcio F8 Bar	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	97.022,42 €	- €	22.273,03 €	SI	NO	€ 9.702,24	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	FINANZIAMENTO PNRR COMPRESIVO DEL FOI
887421000370001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1208 Umbertide Calcio F7 Campo da Tennis	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	83.204,93 €	- €	19.090,50 €	SI	NO	€ 8.320,49	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
887421000380001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1210 Umbertide Calcio F7 Spogliatoi piscina	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	138.774,89 €	- €	31.815,04 €	SI	NO	€ 13.877,49	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
887421000390001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1211 Umbertide Calcio F7 Piscina	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	208.162,34 €	- €	47.723,91 €	SI	NO	€ 20.816,23	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
889421000400001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1145 Umbertide Calcio F13	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	180.077,37 €	- €	41.365,87 €	SI	NO	€ 18.007,74	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
889421000360001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1145 Umbertide Calcio F13 Abitazione rurale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	346.187,23 €	- €	79.551,55 €	SI	NO	€ 34.618,72	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	FINANZIAMENTO PNRR COMPRESIVO DEL FOI

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz ALTRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
89J21000370001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1146 Umbertide Calcacci F14 Magazzano	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	69.387,45 €	- €	15.907,97 €	SI	NO	€ 6.938,75	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
89J21000380001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1146 Umbertide Calcacci F15 Abitazione rurale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	344.719,74 €	- €	78.806,68 €	SI	NO	€ 34.471,97	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
89J21000390001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1146 Umbertide Calcacci F16 Abitazione rurale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	208.162,34 €	- €	47.723,91 €	SI	NO	€ 20.816,23	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
89J21000400001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1212 Umbertide Calcacci F10 Ristoranti/Abitazione rurale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.383.248,84 €	- €	318.229,59 €	SI	NO	€ 138.324,89	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
89J21000410001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1213 Umbertide Calcacci F11 Magazzano	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	69.387,45 €	- €	15.907,47 €	SI	NO	€ 6.938,75	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI
89J21000420001	ID n. 407 - "Alta Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1214 Umbertide Calcacci F12 Abitazione rurale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	346.337,23 €	- €	79.549,21 €	SI	NO	€ 34.633,72	- €	- €	si	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
89J2100430001	ID n. 407 - "Abn Umbria 2030. Strategie di rigenerazione" - LOTTO 2 - ID 1215 Umbertide Calcucci F16 Abitazione rurale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINOQA)	678.856,97 €	- €	- 155.915,88 €	SI	€ 67.885,70	€	€	SI	DETERMINA A CONTRARRE	11/08/2023	-	31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOI N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ABBONDIAMENTO INCONSISTIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
89J2200070006	Potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica e servizi ai locali e sistemi educativi formativi.	Missione 4 "Istruzione e ricerca"	Componente 1	1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria ITS														
89J2200070006	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SISTEMA DUALE: Programmazione e attuazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IFP) di Istruzione e Formazione Superiore (ITS) in modalità Duale	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 1	1.4 Politiche per il lavoro - "Sistema duale"	705.027,00		3.377.566,00		€ 705.027,00	€ 68.842,50	€ 332.722,50	SI		Termine del quadriennio cofinanziato con PNRR 31/12/2026	SI	31/12/2026	Effettuato l'accesso con credenziali, ma riscontrate difficoltà nel caricamento dei dati.	Necessità di supporto tecnico per utilizzo Sistema REGIS. ATTI: ACCORDO (CONVENZIONE) per la realizzazione dell'Investimento 1.4 "Sistema Duale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 5, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SISTEMA DUALE: DGR 741 del 10/07/2022; pubblicazione Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa finalizzata a valere sul PNRR Regione Umbria; DGR 644 del 28/06/2022 approvazione Criteri per la presentazione dell'offerta formativa; DD 7276 del 15/07/2022 pubblicazione Avviso Nazionale per la presentazione dell'offerta formativa; DD 12048 del 01/12/2022 approvazioni per la gestione e rendicontazione; DD 13079 del 14/12/2022 approvazione Impiego di Spesa Avviso. Con D.D. n. 5254 del 26/5/2022 sono state accertate e impegnate le annualità 2021/2022/2023/2024 per complessivi € 23.823.534,58 corrispondenti agli stanziamenti di bilancio delle medesime annualità
H14F2200050006	SVS7_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATTIOTTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			259.000,00 €		NO	€ 23.823.534,58	€	11.655,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H14F2200050006	SVS7_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATTIOTTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			259.000,00 €		NO	€ 23.823.534,58	€	11.655,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE REGIONALI E LOCALI LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H14F2200005006	SVSZ_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATTEOTTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			259.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.655,00			SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H14F2200005006	SVSZ_4 Manutenzione Straordinaria BEVAGNA CORSO MATTEOTTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			259.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.655,00			SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H24F2200005006	SVSZ_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			200.000,00 €	26.171,60 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 9.000,00			SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H24F2200005006	SVSZ_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			200.000,00 €	26.171,60 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 9.000,00			SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 € 26171,60 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E LA POLITICA REGIONALE INTERVENTI SPECIALI 2014-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H24F2200005006	SV57_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			200.000,00 €	26.171,60 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 9.000,00	9.000,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H24F2200005006	SV57_1 Manutenzione Straordinaria SAN VENANZO PIAZZA ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			200.000,00 €	26.171,60 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 9.000,00	9.000,00	SI	consegnato in via di contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H34F2200005006	SV57_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			809.091,66 €	74.321,04 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.409,13	36.409,13	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H34F2200005006	SV57_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			809.091,66 €	74.321,04 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.409,13	36.409,13	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 €74.321,04 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E LA POLITICA REGIONALE E INTERVENTI SPECIALI 2014-2022 per l'approvazione della progettazione



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz ALTRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H34F2200006006	SV57_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			809.091,66 €	74.321,04 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.409,13			SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H34F2200006006	SV57_10 Manutenzione Straordinaria CORCIANO VIA UNGARETTI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			809.091,66 €	74.321,04 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.409,13			SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H34F2200006006	SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			388.500,00 €	27.491,92 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 17.482,50			SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H34F2200006006	SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			388.500,00 €	27.491,92 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 17.482,50			SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 €27.491,92 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E DEL TERRITORIO INTERVENTI SPECIALI 11-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H34F220000000006	SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			388.500,00 €	27.491,92 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 17.482,50		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H34F220000000006	SV57_14 Manutenzione Straordinaria AMELIA VIA GERALDINI-CARLENI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			388.500,00 €	27.491,92 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 17.482,50		SI	consegnatavvio contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H42D200000000006	SV58_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			600.000,00 €	88.199,23 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 27.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H42D200000000006	SV58_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			600.000,00 €	88.199,23 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 27.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON D. RGS DEL 28/03/2023 E 88.199,23 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 7524 DEL 26-06-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E INTERVENTI SPECIALI AL 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H42D2000000006	SVS8_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			600.000,00 €	88.199,23 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 27.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H42D2000000006	SVS8_1 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			600.000,00 €	88.199,23 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 27.000,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200190006	SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			550.000,00 €	80.849,29 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 24.750,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200190006	SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			550.000,00 €	80.849,29 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 24.750,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 € 243.606,73 (inserito in "FINANZ AL TRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E DEL TERRITORIO INTERVENTI SPECIALI 11-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200190006	SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			550.000,00 €	80.849,29 €	NO	NO	€23.829.534,58	€ 24.750,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200190006	SVS7_2 Manutenzione Straordinaria TERNI PIAZZA DELLA PACE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			550.000,00 €	80.849,29 €	NO	NO	€23.829.534,58	€ 24.750,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200200006	SVS7_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €	64.892,97 €	NO	NO	€23.829.534,58	€ 36.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200200006	SVS7_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €	64.892,97 €	NO	NO	€23.829.534,58	€ 36.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DRGS 52/2023 € 64.892,97 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICHE E LA POLITICA REGIONALE INTERVENTI SPECIALI 2014-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200020006	SV57_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €	64.892,97 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200020006	SV57_3 Manutenzione Straordinaria TERNI VIA TERRE ARNOLE	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €	64.892,97 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.000,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200020006	SV56_2 Manutenzione Straordinaria TERNI SAN VALENTINO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200020006	SV56_2 Manutenzione Straordinaria TERNI SAN VALENTINO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 36.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI programati al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200020006	SV56_2 Manutenzione Straordinaria TERNI SAN VALENTINO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			800.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 36.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI		31/03/2026	NON COMPLETE	
H64F2200004006	SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			222.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 9.990,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI		31/03/2026	NON COMPLETE	
H64F2200004006	SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			222.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 9.990,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI		31/03/2026	NON COMPLETE	PROT. 1754 DEL 29/09/2022 DG.MF. DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H64F2200004006	SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			222.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 9.990,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI		31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H84F22000040006	SV57_6 Manutenzione Straordinaria TREVIA VIA BEATO RICCARDI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			222.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 9.990,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H84F22000040006	SV57_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			69.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 3.105,00		SI	affidamento della progettazione da parte della SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H84F22000040006	SV57_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			69.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 3.105,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT. 1754 DEL 29.09.2022 DG.MF. DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H84F22000040006	SV57_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			69.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 3.105,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte della SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F2200040006	SVS7_7 Manutenzione Straordinaria CITERNA VIA DEL POPOLO 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			69.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 3.105,00		SI		consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H94F22000130006	SVS7_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			390.000,00 €	64.200,11 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 17.550,00		SI		affidamento della progettazione da parte della SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H94F22000130006	SVS7_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			390.000,00 €	64.200,11 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 17.550,00		SI		approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 2) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 3) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 4) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 5) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 6) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 7) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 8) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 9) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 10) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 11) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 12) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 13) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 14) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 15) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 16) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 17) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 18) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 19) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 20) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 21) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 22) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 23) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 24) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 25) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 26) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 27) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 28) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 29) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 30) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 31) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 32) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 33) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 34) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 35) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 36) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 37) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 38) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 39) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 40) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 41) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 42) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 43) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 44) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 45) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 46) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 47) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 48) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 49) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 50) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 51) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 52) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 53) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 54) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 55) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 56) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 57) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 58) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 59) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 60) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 61) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 62) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 63) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 64) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 65) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 66) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 67) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 68) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 69) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 70) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 71) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 72) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 73) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 74) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 75) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 76) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 77) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 78) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 79) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 80) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 81) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 82) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 83) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 84) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 85) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 86) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 87) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 88) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 89) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 90) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 91) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 92) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 93) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 94) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 95) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 96) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 97) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 98) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 99) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 100) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023
H94F22000130006	SVS7_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			390.000,00 €	64.200,11 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 17.550,00		SI		aggiudicazione dei contratti da parte della SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F22000150006	SV57_5 Manutenzione Straordinaria BETTONA VIALE ROMA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			390.000,00 €	64.200,11 €	NO	NO	€23.823.534,59	€ 17.550,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H94F22000150006	SV57_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.200.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,59	€ 54.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H94F22000150006	SV57_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.200.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,59	€ 54.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	PROT. 175/4 DEL 29/09/2022 DG.MF. DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI in prosieguo al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H94F22000150006	SV57_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.200.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,59	€ 54.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F22000150006	SVST_12.1.2.3.4 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.200.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 54.000,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F22000160006	SVST_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			350.000,00 €	92.081,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.750,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F22000160006	SVST_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			350.000,00 €	92.081,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.750,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON DIRGS 52/2023 (art.26) in data 28/09/2022 (D.L. N. 2) PROT. 17524 DEL 28/09/2022 (C.C. MI) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H94F22000160006	SVST_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			350.000,00 €	92.081,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.750,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F2200170006	SV57_13 Manutenzione Straordinaria PERUGIA P.S.GIOVANNI LOGGI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			350.000,00 €	92.081,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.750,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H94F2200170006	SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO"	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.600.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 72.000,00		SI	Acquisto	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	INTERVENTO CONCLUSO
H94F2200170006	SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO"	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.600.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 72.000,00		SI	Acquisto	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	INTERVENTO CONCLUSO
H94F2200170006	SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO"	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.600.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 72.000,00		SI	Acquisto	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	INTERVENTO CONCLUSO

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F2200170066	SV58_3 Acquisto PERUGIA QUARTIERE "BELOCCHIO OTTAGONO"	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.600.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 72.000,00		SI	Acquisto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	INTERVENTO CONCLUSO
H812100160001	ID.n. 336 - Velocizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1A - ID 1313 Città di Castelluccio	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	992.852,28 €		307.542,31 €	SI	NO	€ 1.027.623,33				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER
H812100170001	ID.n. 336 - Velocizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1336 San Gemini Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.114.544,56 €		346.476,21 €	SI	NO	€ 1.154.352,94				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER
H812100090001	ID.n. 336 - Velocizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1326 Toddi Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.251.879,77 €		388.156,87 €	SI	NO	€ 1.296.592,34				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CONFINANZIAMENTO DI CUI AL CRONOGRAMMA TRAMESSO PER L'AMMISSIONE OPERATIVA E FINANZIAMENTO CORRISPONDENTE INSCRITTO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
48021000100001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1328 Toti EX Dormitorio	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	844.739,79 €		261.188,89 €	SI	NO	€ 874.911,50				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CREDITO FINANZIARIO E IMPORTO DI CREDITO PROGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
48021000110001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1329 Toti Stazione Roccella	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	574.423,06 €		178.010,30 €	SI	NO	€ 594.939,84				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CREDITO FINANZIARIO E IMPORTO DI CREDITO PROGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
48021000120001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1328 Terni Stazione Cesi	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	732.383,80 €		227.272,80 €	SI	NO	€ 758.521,75				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CREDITO FINANZIARIO E IMPORTO DI CREDITO PROGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
68021000000001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1A - ID 1309 San Giuliano Stazione di Salsi Lama	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.045.941,45 €		325.078,86 €	SI	NO	€ 1.083.299,49				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOU (FAC) ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
88021000310001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1322 Deriva Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	640.210,37 €		198.529,80 €	SI	NO	€ 663.076,87					DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER
88021000470001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 2 - ID 1324 Marsciano Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.250.982,83 €		387.877,43 €	SI	NO	€ 1.296.664,37					DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI DOVUTA AD ABBONDIAMENTI NON AGEVOLI (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
78021000110001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1330 Massa Mariana Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.061.812,32 €		330.028,84 €	SI	NO	€ 1.099.737,22					DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER
88021000120001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbria (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1B - ID 1314 Umbertide Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.100.721,54 €		341.395,18 €	SI	NO	€ 1.140.036,17					DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI FINANZIAMENTO DI CUI AL CRONOGRAMMA TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021 E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
88021000130001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1A - ID 1319 Umbrella Buzzaiochero	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	371.173,54 €		114.616,01 €	SI	NO	€ 384.430,82				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CROCIERAZIONE E IMPORTO DI CROCIERAZIONE. TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021. E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
88021000280001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 1B - ID 1317 Umbrella Casa Ceppi	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	1.471.895,09 €		451.393,59 €	SI	NO	€ 1.524.467,00				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA IMPORTO DI CROCIERAZIONE E IMPORTO DI CROCIERAZIONE. TRASMESSO PER L'AMMISSIONE DEFINITIVA A FINANZIAMENTO NEL NOVEMBRE 2021. E L'IMPORTO CORRISPONDENTE INSERITO IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)
88021000120001	ID n. 338 - Valorizzazione della ferrovia centrale Umbra (FCU) "Vivere l'Umbria" - LOTTO 3 - ID 1385 Acquapara Stazione	Missione 5 "Inclusione e coesione"	Componente 2	2.3 Programma innovativo qualità dell'abitare - (PINQUA)	551.896,66 €		170.984,24 €	SI	NO	€ 571.608,64				DETERMINA A CONTRARRE	06/10/2023		31/03/2026	ANAGRAFICA-QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI	ALTRI FINANZIAMENTI COMPRENDE FOIE FONDI PROPRI DI REGIONE E ATER. N.B. INCONGRUENZA TRA QUADRO ECONOMICO-PIANO DEI COSTI E FINANZIAMENTI QUADRO ARROTONDAMENTI IN REGIS (IMPOSSIBILE ESEGUIRE PRE-VALIDAZIONE E VALIDAZIONE)

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H54F2100000006	SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			318.000,00 €	97.714,51 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.310,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F2100000006	SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			318.000,00 €	97.714,51 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.310,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 35.037,18 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO INTERVENTI SPECIALI art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione.
H54F2100000006	SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			318.000,00 €	97.714,51 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.310,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F2100000006	SVS1_ZAP01 Ripristino alloggi FOLIGNO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			318.000,00 €	97.714,51 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.310,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H64F2200010006	SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.282,76 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H64F2200010006	SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.282,76 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 17.965,69 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STRUTTURALE LE POLITICHE ABITATIVE, INTERVENTI SPECIALI art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H64F2200010006	SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.282,76 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H64F2200010006	SVS1_ZAP02 Ripristino alloggi FOLIGNO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.282,76 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	consegnatvivo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H84F2200000006	SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi UMBERTIDE varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	52.792,60 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.320,00		€ 13.320,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H84F2200000006	SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi UMBERTIDE varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	52.792,60 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.320,00		€ 13.320,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso ai FOI/2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 19.935,59 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STRUTTURALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione.
H84F2200000006	SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi UMBERTIDE varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	52.792,60 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.320,00		€ 13.320,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H84F2200000006	SVS1_ZAPO3 Ripristino alloggi UMBERTIDE varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	52.792,60 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.320,00		€ 13.320,00	SI	consegnatario contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F2200010006	SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			306.000,00 €	52.943,76 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.770,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F2200010006	SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			306.000,00 €	52.943,76 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.770,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 31.084,95 (inserito in "FINANZ ALTRI"). 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE. 3)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 INTERVENTI SPECIALI art.26 art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H94F2200010006	SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			306.000,00 €	52.943,76 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.770,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F2200010006	SVS1_ZAP04 Ripristino alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			306.000,00 €	52.943,76 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.770,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F22000020006	SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	84.512,68 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	13.320,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F22000020006	SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	84.512,68 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	13.320,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 37858,96 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H94F22000020006	SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	84.512,68 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	13.320,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F22000020006	SVS1_ZAP05 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			286.000,00 €	84.512,68 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	13.320,00	SI	consegnatvivo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F22000030006	SVS1_ZAP06 Respiro alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			305.000,00 €	50.003,84 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.725,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F22000030006	SVS1_ZAP06 Respiro alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			305.000,00 €	50.003,84 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.725,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 49.233,92 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H94F22000030006	SVS1_ZAP06 Respiro alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			305.000,00 €	50.003,84 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.725,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F22000030006	SVS1_ZAP06 Respiro alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			305.000,00 €	50.003,84 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.725,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F2200040006	SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			301.000,00 €	74.608,83 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.545,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F2200040006	SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			301.000,00 €	74.608,83 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.545,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 44.258,39 (inserito in "FINANZ ALTRI"). 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H94F2200040006	SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			301.000,00 €	74.608,83 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.545,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94F2200040006	SVS1_ZAP07 Respietno alloggi PERUGIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			301.000,00 €	74.608,83 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.545,00	SI	consegnatvivo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H14F22000000006	SVS1_ZAF09 Ripristino alloggi TOD1 varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			266.000,00 €	12.307,90 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	11.970,00	SI	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H14F22000000006	SVS1_ZAF09 Ripristino alloggi TOD1 varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			266.000,00 €	12.307,90 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	11.970,00	SI	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 12.307,90 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, L'INTERVENTO SPECIALE art.12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H14F22000000006	SVS1_ZAF09 Ripristino alloggi TOD1 varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			266.000,00 €	12.307,90 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	11.970,00	SI	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H14F22000000006	SVS1_ZAF09 Ripristino alloggi TOD1 varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			266.000,00 €	12.307,90 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	11.970,00	SI	SI	consegnatvivo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H34F2100000006	SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			299.000,00 €	62.788,27 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.455,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H34F2100000006	SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			299.000,00 €	62.788,27 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	13.455,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI/2022	1)FOI/2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 €52.839,44 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE 3)FOI/2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 INTERVENTI SPECIALI art.31-12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H34F2100000006	SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			299.000,00 €	62.788,27 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.455,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H34F2100000006	SVS1_ZAP10 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			299.000,00 €	62.788,27 €	NO	NO	€23.823.534,58	€		13.455,00	SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H74F2100020006	SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			343.000,00 €	59.296,85 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.435,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H74F2100020006	SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			343.000,00 €	59.296,85 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.435,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI/2022	1)FOI/2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 59.296,85 (inserito in "FINANZ ALTRI"). 2)PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE. 3)FOI/2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 INTERVENTI SPECIALI art.26 al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione."
H74F2100020006	SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			343.000,00 €	59.296,85 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.435,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H74F2100020006	SVS1_ZAP11 Ripristino alloggi NARNI verde vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			343.000,00 €	59.296,85 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.435,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2100000006	SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			336.000,00 €	7.501,70 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 15.120,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2100000006	SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			336.000,00 €	7.501,70 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 15.120,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H44F2100000006	SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			336.000,00 €	7.501,70 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 15.120,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2100000006	SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			336.000,00 €	7.501,70 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 15.120,00	SI	consegnalivio contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F21000010006	SVS1_ZAP12 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			330.000,00 €	7.501,70 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 15.120,00			SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F21000010006	SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			330.000,00 €	8.007,68 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.850,00			SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F21000010006	SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			330.000,00 €	8.007,68 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.850,00			SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione
H44F21000010006	SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			330.000,00 €	8.007,68 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.850,00			SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
H44F2100010006	SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			330.000,00 €	8.007,88 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.850,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2100010006	SVS1_ZAP13 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			330.000,00 €	8.007,88 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.850,00		SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200030006	SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			315.000,00 €	11.113,66 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.175,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200030006	SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			315.000,00 €	11.113,66 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.175,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	PROT. 175/M DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F22000030006	SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			315.000,00 €	11.113,66 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.175,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F22000030006	SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			315.000,00 €	11.113,66 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.175,00		SI	consegnato in via contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F22000030006	SVS1_ZAP15 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			315.000,00 €	11.113,66 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.175,00		SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F22000040006	SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			262.000,00 €	8.057,72 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.750,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200004006	SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			262.000,00 €	8.057,72 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.790,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	PROT.17624 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione
H44F2200004006	SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			262.000,00 €	8.057,72 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.790,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200004006	SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			262.000,00 €	8.057,72 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.790,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200004006	SVS1_ZAP16 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			262.000,00 €	8.057,72 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.790,00		SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200005006	SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			326.000,00 €	6.771,39 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 14.670,00	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200005006	SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			326.000,00 €	6.771,39 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 14.670,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H44F2200005006	SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			326.000,00 €	6.771,39 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 14.670,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200005006	SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			326.000,00 €	6.771,39 €	NO	NO	€ 23.823.534,58		€ 14.670,00	SI	consegnalivio contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200060006	SVS1_ZAP17 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			326.000,00 €	6.771,39 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.670,00			SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200060006	SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			311.000,00 €	15.021,30 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.995,00			SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2200060006	SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			311.000,00 €	15.021,30 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.995,00			SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT.17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione
H44F2200060006	SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			311.000,00 €	15.021,30 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.995,00			SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200060006	SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			311.000,00 €	15.021,30 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.995,00			SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200060006	SVS1_ZAP18 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			311.000,00 €	15.021,30 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.995,00			SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200070006	SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			331.000,00 €	22.023,61 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 14.895,00			SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200070006	SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			331.000,00 €	22.023,61 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 14.895,00			SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	PROT. 175/M DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE - LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2200070006	SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			331.000,00 €	22.023,61 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 14.895,00			SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200070006	SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			331.000,00 €	22.023,61 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 14.895,00			SI	consegnato vivo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200070006	SVS1_ZAP19 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			331.000,00 €	22.023,61 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 14.895,00			SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F22000080006	SVS1_ZAP20 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			346.000,00 €	12.420,47 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.570,00			SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2000080006	SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			346.000,00 €	12.420,47 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.570,00		15.570,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	PROT.17624 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31/12/2022 per approvazione della progettazione
H44F2000080006	SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			346.000,00 €	12.420,47 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.570,00		15.570,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2000080006	SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			346.000,00 €	12.420,47 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.570,00		15.570,00	SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2000080006	SVS1_ZAP20 Rispriolino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			346.000,00 €	12.420,47 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 15.570,00		15.570,00	SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F22000090006	SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			288.000,00 €	13.416,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 12.960,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE		
H44F22000090006	SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			288.000,00 €	13.416,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 12.960,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione	
H44F22000090006	SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			288.000,00 €	13.416,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 12.960,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE		
H44F22000090006	SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			288.000,00 €	13.416,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 12.960,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F22000000006	SVS1_ZAP21 Ripristino alloggi TERNI verde ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			288.000,00 €	13.416,67 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 12.960,00		SI	Realizzazione del 50% dei lavori	31/12/2024	SI	31/03/2026	NON COMPLETE		
H44F22000000006	SVS1_ZAP22 Ripristino alloggi ASSISI verde ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.591,37 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE		
H44F22000000006	SVS1_ZAP22 Ripristino alloggi ASSISI verde ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.591,37 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 5/2/2023 2)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 1/1/2023 3)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 1/1/2023 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "	
H44F22000000006	SVS1_ZAP22 Ripristino alloggi ASSISI verde ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.591,37 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H24F22000000006	SVS1_ZAP22 Rispriatino alloggi ASSISI varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			282.000,00 €	57.591,37 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 13.140,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F22000000006	SVS1_ZAP23 Rispriatino alloggi CANNARA varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			277.000,00 €	56.877,75 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 12.465,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F22000000006	SVS1_ZAP23 Rispriatino alloggi CANNARA varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			277.000,00 €	56.877,75 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 12.465,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 2)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 3)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H54F22000000006	SVS1_ZAP23 Rispriatino alloggi CANNARA varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			277.000,00 €	56.877,75 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 12.465,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H54F2200000006	SVS1_ZAP23 Ripristino alloggi CANNARA, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			277.000,00 €	58.877,75 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 12.465,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE		
H64F2200000006	SVS1_ZAP24 Ripristino alloggi CASTIGLIONE DEL LAGO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			283.000,00 €	58.168,81 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.185,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE		
H64F2200000006	SVS1_ZAP24 Ripristino alloggi CASTIGLIONE DEL LAGO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			283.000,00 €	58.168,81 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.185,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE		1) FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.185,00. 2) PROCOI 11524 DEL 29-09-2022. D.C. MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H64F2200000006	SVS1_ZAP24 Ripristino alloggi CASTIGLIONE DEL LAGO, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			283.000,00 €	58.168,81 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.185,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H64F2200010006	SVS1_ZAP24 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			256.000,00 €	58.168,81 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.185,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F2200010006	SVS1_ZAP26 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			256.000,00 €	47.614,03 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.520,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F2200010006	SVS1_ZAP26 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			256.000,00 €	47.614,03 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.520,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1)FOI.2022 APPROVATO CON DIR.65 52/2023 (art.26) in data 11/12/2022 2)PROV.1754 DEL 29-09-2022 (C.M.I.) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H54F2200010006	SVS1_ZAP26 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			256.000,00 €	47.614,03 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.520,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H54F2200010006	SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi FOSSATO DI VICO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			256.000,00 €	47.614,03 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.520,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H84F2200000006	SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			307.000,00 €	67.671,19 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.815,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H84F2200000006	SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			307.000,00 €	67.671,19 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.815,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.815,00 2)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.815,00 3)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 13.815,00 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H84F2200000006	SVS1_ZAP28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			307.000,00 €	67.671,19 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 13.815,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H42F2200000006	SVS1_ZAF28 Ripristino alloggi GIANO DELL'UMBRIA varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			307.000,00 €	67.671,19 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	13.815,00	SI	SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H42F2200000005	SVS1_ZAF29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			322.000,00 €	67.223,73 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	14.490,00	SI	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H42F2200000005	SVS1_ZAF29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			322.000,00 €	67.223,73 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	14.490,00	SI	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 2)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 3)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 4)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H42F2200000005	SVS1_ZAF29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie ve	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			322.000,00 €	67.223,73 €	NO	NO	€23.823.534,58	€	14.490,00	SI	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H24F22000020005	SVS1_ZAP29 Ripristino alloggi GUALDO TADINO varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			322.000,00 €	67.223,73 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 14.490,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F22000020006	SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			249.000,00 €	49.353,70 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.205,00		SI	affidamento della progettazione da parte della SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H54F22000020006	SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			249.000,00 €	49.353,70 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.205,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 11.205,00 2)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 11.205,00 3)FOI.2022 APPROVATO CON D.RGS 52/2023 € 11.205,00 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H54F22000020006	SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			249.000,00 €	49.353,70 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 11.205,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte della SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H54F22000000006	SVS1_ZAP31 Ripristino alloggi NOCERA UMBRA varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			249.000,00 €	49.353,70 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 11.205,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H34F22000000006	SVS1_ZAP35 Ripristino alloggi MONTONE varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			137.000,00 €	56.373,88 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 6.165,00		SI	affidamento della progettazione da parte della SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H34F22000000006	SVS1_ZAP35 Ripristino alloggi MONTONE varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			137.000,00 €	56.373,88 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 6.165,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1) FOI 2022: APPROVATO CON DIRIGES 52/2023 (17/03/2023) DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL CLM (7/03/2023) DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE. LE POLITICHE ABITATIVE. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H34F22000000006	SVS1_ZAP35 Ripristino alloggi MONTONE varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			137.000,00 €	56.373,88 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 6.165,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte della SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H34F22000000006	SVS1_ZAF35 Ripristino alloggi MONTONE, varie vie	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			137.000,00 €	56.373,88 €	NO	NO	€23.823.534,58	€ 6.165,00		SI	consegnatavo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94J21017890001	SVS2 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.500.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 112.500,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H94J21017890001	SVS2 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.500.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 112.500,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT. 1754 DEL 29.09.2022 DG.MF.DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI in prosoga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H94J21017890001	SVS2 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.500.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,58	€ 112.500,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H95J21017660001	SV32 Manutenzione straordinaria PERUGIA QUARTIERE BELOCCHIO OTTAGONO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.500.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 112.500,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H35J21014950001	SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILCISOFI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 45.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H35J21014950001	SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILCISOFI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 45.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT. 175/4 DEL 29/09/2022 DG.MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI, in prosieguo al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H35J21014950001	SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILCISOFI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€23.823.534,56	€ 45.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H35J21014850001	SV54 Manutenzione straordinaria SPOLETO VIA DEI FILOSOFI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 45.000,00		SI	consegnativo contratto	30/06/2023	SI		31/03/2026	NON COMPETE	
H44E21003210001	SV55 Manutenzione straordinaria TERNI VIA CAMPOMICCIOLO EX MILZIA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			5.000.000,00 €	703.215,77 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 225.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte della SA	30/06/2022	SI		31/03/2026	NON COMPETE	
H44E21003210001	SV55 Manutenzione straordinaria TERNI VIA CAMPOMICCIOLO EX MILZIA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			5.000.000,00 €	703.215,77 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 225.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte della SA	31/12/2022	SI		31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI.2022	1) FOI.2022 APPROVATO CON D RGS DEL 11/11/2022. In corso di approvazione in sede di Giunta Provinciale. Al FOI.2022 APPROVATO 17/524 DEL 29/10/2022 OGNI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN TUTTA LA DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H44E21003210001	SV55 Manutenzione straordinaria TERNI VIA CAMPOMICCIOLO EX MILZIA	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			5.000.000,00 €	703.215,77 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 225.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte della SA	31/03/2023	NO		31/03/2026	NON COMPETE	CRITICITA': 1) FOI.2022 REVOCATO CON CON D RGS 52/2023 - RIMODULAZIONE INTERVENTO IN CORSO - 2) ATTESA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO COMUNE

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H43D21002980001	SV56 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			6.500.000,00 €	#####	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 282.500,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H43D21002980001	SV56 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			6.500.000,00 €	#####	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 282.500,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON D. RGS DEL 09/11/2022 E CONFERMATO CON D. RGS DEL 26/11/2022. 2) PROT. 17524 DEL 29/09/2022 DG. MIT - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione "
H43D21002980001	SV56 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			6.500.000,00 €	#####	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 282.500,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	NO	31/03/2026	NON COMPETE	CRITICITA': ATTESA RILASCO TITOLO ABILITATIVO COMUNE
H44F200030005	SV510_9 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.080.000,00 €	683.131,67 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 93.600,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2000330005	SVS10_9 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.080.000,00 €	683.131,67 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 93.600,00	€ 93.600,00	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 28/03/2023 € 92.814,4 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, INTERVENTI SPECIALI LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione *
H44F2000330005	SVS10_9 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			2.080.000,00 €	683.131,67 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 93.600,00	€ 93.600,00	SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	NO	31/03/2026	NON COMPLETE	CRITICITA': ATTESA RILASCO TITOLO ABILITATIVO COMUNE
H44F2000290006	SVS10_6 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			524.500,00 €	172.260,84 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 23.602,50	€ 23.602,50	SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2000290006	SVS10_6 Riquilibrato Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			524.500,00 €	172.260,84 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 23.602,50	€ 23.602,50	SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 28/03/2023 € 92.814,4 (inserito in "FINANZ ALTRI") 2)PROT.17524 DEL 29/09/2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE LE POLITICHE ABITATIVE, INTERVENTI SPECIALI LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione *

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2000290006	SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 4	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			524.500,00 €	172.260,84 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 23.802,50		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	NO	31/03/2026	NON COMPETE	CRITICITA': ATTESA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO COMUNE
H44F2000290006	SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 2	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			321.000,00 €	105.425,61 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.445,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2000290006	SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 2	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			321.000,00 €	105.425,61 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.445,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.10 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 16/02/2022 2)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 28/03/2022 3)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 4)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 5)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 6)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 7)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 8)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 9)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 10)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 11)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 12)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 13)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 14)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 15)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 16)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 17)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 18)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 19)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 20)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 21)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 22)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 23)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 24)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 25)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 26)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 27)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 28)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 29)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 30)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 31)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 32)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 33)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 34)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 35)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 36)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 37)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 38)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 39)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 40)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 41)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 42)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 43)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 44)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 45)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 46)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 47)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 48)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 49)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 50)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 51)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 52)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 53)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 54)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 55)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 56)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 57)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 58)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 59)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 60)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 61)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 62)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 63)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 64)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 65)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 66)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 67)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 68)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 69)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 70)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 71)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 72)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 73)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 74)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 75)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 76)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 77)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 78)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 79)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 80)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 81)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 82)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 83)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 84)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 85)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 86)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 87)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 88)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 89)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 90)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 91)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 92)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 93)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 94)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 95)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 96)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 97)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 98)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 99)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022 100)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS DEL 29/09/2022
H44F2000290006	SVS10_5 Riqualificazione Quartiere TERNI SAN LUCIO VIA BRODOLINI 2	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			321.000,00 €	105.425,61 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 14.445,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	NO	31/03/2026	NON COMPETE	CRITICITA': ATTESA RILASCIO TITOLO ABILITATIVO COMUNE

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H74F200050006	SV57_8 Riqualficazione edificio ASSISI SAN GREGORIO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			750.000,00 €	122.688,27 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 33.750,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H74F200050006	SV57_8 Riqualficazione edificio ASSISI SAN GREGORIO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			750.000,00 €	122.688,27 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 33.750,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1) FOI 2022 APPROVATO CON D.RGS DEL 18/11/2022 € 63.884,88 (inserito in "FINANZ AL TRI") - 2) PROT. 17524 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA CIVILE - 3) REGIONE UMBRIA - 4) INTERVENTI SPECIALI art. 112-2022 per l'approvazione della progettazione.
H74F200050006	SV57_8 Riqualficazione edificio ASSISI SAN GREGORIO	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			750.000,00 €	122.688,27 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 33.750,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	NO	31/03/2026	NON COMPETE	CRITICITA': 1) FOI 2022 REVOCATO CON CON D.RGS 522/2023 - 2) ATTESA RILASCO TITOLO ABILITATIVO COMUNE
H44F2000210006	SV57_9 Manutenzione straordinaria TERNI VIALE BRN	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 45.000,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H44F2000210006	SVS7_9 Manutenzione straordinaria TERNI VIALE BRN	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 45.000,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	PROT.1754 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione
H44F2000210006	SVS7_9 Manutenzione straordinaria TERNI VIALE BRN	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			1.000.000,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 45.000,00		SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2000140006	SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			664.000,00 €	111.882,52 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 29.880,00		SI	affidamento della progettazione da parte delle SA	30/06/2022	SI	31/03/2026	NON COMPETE	
H44F2000140006	SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			664.000,00 €	111.882,52 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 29.880,00		SI	approvazione della progettazione e pubblicazione del bando da parte delle SA	31/12/2022	SI	31/03/2026	Effettuata procedura art.26 accesso al FOI 2022	1)FOI 2022 APPROVATO CON D RGS 52/2023 € 111.882,52 (inserito in "FINANZ AL TRI") 2)PROT.1754 DEL 29-09-2022 DG MIT DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI proroga al 31-12-2022 per l'approvazione della progettazione *

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
H94F2200140006	SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			664.000,00 €	111.882,52 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 29.880,00			SI	aggiudicazione dei contratti da parte delle SA	31/03/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H94F2200140006	SVS7_11 Manutenzione Straordinaria PERUGIA VIA GREGOROVIVUS	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			664.000,00 €	111.882,52 €	NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 29.880,00			SI	consegnato a via contratto	30/06/2023	SI	31/03/2026	NON COMPLETE	
H44F2200180006	Ripristino alloggi TERNI VIA TURATI	Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	Componente 3			74.500,00 €		NO	NO	€ 23.823.534,58	€ 3.352,50			NO					NON COMPLETE	
F182200460006	CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 1.853.976,80	€ 0,00	€ 186.023,20	NO	NO	€ 53.330,70	€ 0,00	€ 0,00		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	01/02/2023	SI		Caricato	Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviata)
F182200460006	CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	1853976,8	0	186023,2	NO	NO	53330,7	0	0		AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F182200460006	CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	1853976,8	0	186023,2	NO	NO	53330,7	0	0		AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F182200460006	CASA DELLA COMUNITA' DI CITTÀ DI CASTELLO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	1853976,8	0	186023,2	NO	NO	53330,7	0	0		AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/09/2026		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F33D2000200006	CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 3.075,33	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/06/2023	N/A		Cancellato	Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F33D2000200006	CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	140000	0	0	NO	NO	3075,33	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F33D2000200006	CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	140000	0	0	NO	NO	3075,33	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
F33D2000200006	CASA DELLA COMUNITA' DI GUBBIO	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	140000	0	0	NO	NO	3075,33	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2025	N/A	30/06/2026		
F43D2000350006	CASA DELLA COMUNITA' DI TODI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 404.573,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 15.388,29	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Cancellato	Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia)
F43D2000350006	CASA DELLA COMUNITA' DI TODI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	404573	0	0	NO	NO	15388,29	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F43D2000350006	CASA DELLA COMUNITA' DI TODI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	404573	0	0	NO	NO	15388,29	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
F43D2000420006	CASA DELLA COMUNITA' DI TODI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	404573	0	0	NO	NO	15388,29	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2025	N/A	30/06/2026		
F58I2000420006	CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 21.999,35	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Cancellato	Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia)
F58I2000420006	CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	1500000	0	0	NO	NO	21999,35	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F58I2000420006	CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	1500000	0	0	NO	NO	21999,35	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
FR30200420006	CASA DELLA COMUNITA' DI MAGIONE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	150000	0	0	NO	NO	21999,35	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2025	N/A	30/09/2026		
FR3022001120006	CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 27.559,32	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/08/2023	N/A		Caricabo	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Affidamento autonomo
FR3022001120006	CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	200000	0	0	NO	NO	27559,32	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
FR3022001120006	CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	200000	0	0	NO	NO	27559,32	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
FR3022001120006	CASA DELLA COMUNITA' DI LUMBERTIDE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	200000	0	0	NO	NO	27559,32	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2025	N/A	30/09/2026		
FR302200270006	CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 6.382,21	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/08/2023	N/A		Caricabo	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Affidamento autonomo
FR302200270006	CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	200000	0	0	NO	NO	6382,21	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
FR302200270006	CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	200000	0	0	NO	NO	6382,21	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
FR302200270006	CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE SAN GIOVANNI	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	200000	0	0	NO	NO	6382,21	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2025	N/A	30/09/2026		
FR302200280006	CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 5.536.023,20	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 110.880,87	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Caricabo	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Accordo Quadro (Invitalia)
FR302200280006	CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	550025,2	0	0	NO	NO	110880,87	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
FR3D200280006	CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	5556023,2	0	0	NO	NO	10880,87	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
FR3D200280006	CASA DELLA COMUNITA' DI PERUGIA VIA XIV SETTEMBRE	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	5556023,2	0	0	NO	NO	10880,87	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/06/2026		
F17H22001070001	Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	€ 676725,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Cancato	Modalità affidamento progettazione:Accordo Quadro (Inviata) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviata)
F17H22001070001	Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	676725	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F17H22001070001	Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	676725	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F17H22001070001	Fabro - casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	676725	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/06/2026		
F31B21006630001	Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	€ 2.344.012,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	03/11/2022	SI		Cancato	Modalità affidamento progettazione:Accordo Quadro (Inviata) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviata)
F31B21006630001	Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	2344012	0	0	NO	NO	150000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F31B21006630001	Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	2344012	0	0	NO	NO	150000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F31B21006630001	Amelia - casa della comunità-va Primo Maggio, intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento, e arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità prese in carico della persona	2344012	0	0	NO	NO	150000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/06/2026		



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F37H2200820001	"Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI	Cancato	Modalità affidamento: espletamento Accordo Quadro (Invitalia) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia)	
F37H2200820001	"Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	300000	0	0	NO	NO	180000	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F37H2200820001	"Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	300000	0	0	NO	NO	180000	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F37H2200820001	"Spello -casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	300000	0	0	NO	NO	180000	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/06/2026		
F38I2100340001	"Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 3.265.072,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 800.000,00	€ 25.390,41	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/10/2023	N/A		Cancato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F38I2100340001	"Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	326512	0	0	NO	NO	800000	25390,41	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F38I2100340001	"Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	326512	0	0	NO	NO	800000	25390,41	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2026	N/A			
F38I2100340001	"Narni casa della comunità fuori Porta Ternana ristrutturazione ex-natibus comunale e aree"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	326512	0	0	NO	NO	800000	25390,41	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/06/2026	N/A	30/06/2026		
F41B22001450001	Terni - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 3.480.001,57	€ 0,00	€ 863833,06	NO	NO	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Cancato	Modalità affidamento: espletamento Accordo Quadro (Invitalia) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Invitalia)
F41B22001450001	Terni - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	348001,57	0	863833,06	NO	NO	80000	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F41B22001450001	Terni - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	348001,57	0	863833,06	NO	NO	80000	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
F41B22001460001	Temi - viale Trieste casa della comunità, intervento di ristrutturazione e nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	346/001,57	0	86383,08	NO	NO	80000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/09/2026		
F43D2200330001	Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 3.275.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 800.000,00	€ 16.396,03	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/10/2023	N/A		Caricabo	Modalità affidamento progettazione: Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F43D2200330001	Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	3275000	0	0	NO	NO	500000	16396,03	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F43D2200330001	Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	3275000	0	0	NO	NO	500000	16396,03	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2026	N/A			
F43D2200330001	Oviedo - casa della comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	3275000	0	0	NO	NO	500000	16396,03	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/09/2026		
F47H21009760001	Cascia - casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e ampli	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 157.250,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	N/A	N/A		Caricabo	L'immobile è oggetto di ricostruzione post-sisma pertanto l'intervento è in fase di rimodulazione
F47H21009760001	Cascia - casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e ampli	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	157250	0	0	NO	NO	5000	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	N/A	N/A			
F47H21009760001	Cascia - casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e ampli	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	157250	0	0	NO	NO	5000	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	N/A	N/A			
F47H21009760001	Cascia - casa di comunità - via Giovanni XXIII intervento di ristrutturazione e ampli	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	157250	0	0	NO	NO	5000	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	N/A	N/A	30/09/2026		
F47H22001190001	*Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifinitizzazioni	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Caricabo	Modalità affidamento progettazione: Accordo Quadro (Inviabile) Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviabile)
F47H22001190001	*Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifinitizzazioni	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	700000	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F47H22001190001	"Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifunzionalizzazione"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	700000	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F47H22001190001	"Nocera Umbra-casa della comunità, intervento di manutenzione straordinaria della copertura e rifunzionalizzazione"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	700000	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2028	N/A	30/06/2026		
F57H21008450001	Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 198.250,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 8.250,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	N/A	N/A		Caricato	L'immobile è oggetto di ricostruzione post-sisma pertanto l'intervento è in fase di rimodulazione
F57H21008450001	Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	198250	0	0	NO	NO	8250	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	N/A	N/A			
F57H21008450001	Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	198250	0	0	NO	NO	8250	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	N/A	N/A			
F57H21008450001	Nocera - via dell'Ospedale - casa di comunità - ristrutturazione edilizia e fornitura di arredi	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	198250	0	0	NO	NO	8250	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	N/A	N/A	30/06/2026		
F97H22000820001	"Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/09/2023	N/A		Caricato	Modality affidamento: occupazione/Affidamento autonomo Modality affidamento lavoro: Affidamento autonomo
F97H22000820001	"Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	300000	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F97H22000820001	"Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	300000	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F97H22000820001	"Casa di comunità - Montefalco - completamento opere di manutenzione straordinaria della copertura"	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	300000	0	0	NO	NO	200000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2028	N/A	30/06/2026		
F77H22001500006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRANA 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e intermediazione - 1.2.2.2 di cui: intermediazione territoriale	€ 284.250,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	30/11/2022	SI		Caricato	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F7H2200150006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	294284	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	21/12/2022	SI			
F7H2200150006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	294284	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	28/02/2024	N/A			
F7H2200150006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	294284	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2024	N/A	30/06/2024		
F1H2200127006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	€ 355.359,13	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	30/11/2022	SI			Caricato
F1H2200127006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	355359,13	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	21/12/2022	SI			
F1H2200127006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	355359,13	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	28/02/2024	N/A			
F1H2200127006	COT INTERCONNESSIONE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.2 di cui: interconnessione aziendale	355359,13	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2024	N/A	30/06/2024		
FME2200050006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cui: device	€ 483.581,70	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	31/09/2023	N/A			Caricato
FME2200050006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cui: device	483581,7	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	31/10/2023	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Prograt Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	4835817	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	15/11/2023	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	4835817	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	30/11/2023	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	4835817	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/03/2024	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	4835817	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	15/4/2024	N/A	30/09/2024		
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	€ 386.864,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	31/09/2023	N/A		Caricabo	
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	386864	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	31/10/2023	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	386864	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	15/11/2023	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	386864	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	30/11/2023	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	386864	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/03/2024	N/A			
F44E2200240006	COT DEVICE USL UMBRIA N. 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.3 di cur. device	386864	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	15/4/2024	N/A	30/09/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 16.684,46	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/06/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	250000	0	0	NO	NO	16684,46	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	250000	0	0	NO	NO	16684,46	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	250000	0	0	NO	NO	16684,46	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 16.684,46	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/06/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	250000	0	0	NO	NO	16684,46	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	250000	0	0	NO	NO	16684,46	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
F19D22000390006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Città di Castello - Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	250000	0	0	NO	NO	16684,46	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		
F93D22000330005	Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	€ 173.075,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 11.213,07	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/06/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F93D22000330005	Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	173075	0	0	NO	NO	11213,07	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F93D22000330005	Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	173075	0	0	NO	NO	11213,07	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2024	N/A			
F93D22000330005	Centrali Operative Territoriali (COT) - HUB - Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	173075	0	0	NO	NO	11213,07	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F38D22000340006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	€ 96.150,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 7.954,87	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/09/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F38D22000340006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	96150	0	0	NO	NO	7954,87	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	N/A			
F38D22000340006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	96150	0	0	NO	NO	7954,87	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/09/2024	N/A			
F38D22000340006	Centrali Operative Territoriali (COT) - Spoke Modulo 1 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	96150	0	0	NO	NO	7954,87	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		
F38D22000350006	Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	€ 96.150,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 7.954,87	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/09/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F38D22000350006	Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	96150	0	0	NO	NO	7954,87	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	N/A			
F38D22000350006	Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	96150	0	0	NO	NO	7954,87	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/09/2024	N/A			
F38D22000350006	Centrali Operative Territoriali (COT) Spoke Modulo 2 Perugia (Via XIV Settembre)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	96150	0	0	NO	NO	7954,87	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		
F38C22000200006	Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	€ 73.075,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 36.537,50	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/09/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F38C22000200006	Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	73075	0	0	NO	NO	36537,5	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	N/A			
F38C22000200006	Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	73075	0	0	NO	NO	36537,5	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/09/2024	N/A			
F38C22000200006	Spoke Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui COT	73075	0	0	NO	NO	36537,5	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F32C22000270006	Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	€ 73.075,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 36.537,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	30/06/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/ Affidamento autonomo
F32C22000270006	Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	73075	0	0	NO	NO	36537,5	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	N/A			
F32C22000270006	Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	73075	0	0	NO	NO	36537,5	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/03/2024	N/A			
F32C22000270006	Spoleto Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	73075	0	0	NO	NO	36537,5	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/05/2024	N/A	30/06/2024		
F42C22000070006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	€ 273.075,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Accordo Quadro (bivale)
F42C22000070006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	273075	0	0	NO	NO	30000	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	N/A			
F42C22000070006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	273075	0	0	NO	NO	30000	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	29/2/2024	N/A			
F42C22000070006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	273075	0	0	NO	NO	30000	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/04/2024	N/A	30/06/2024		
F42C22000080006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	€ 273.075,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori/Accordo Quadro (bivale)
F42C22000080006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	273075	0	0	NO	NO	30000	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	N/A			
F42C22000080006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	273075	0	0	NO	NO	30000	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	29/2/2024	N/A			
F42C22000080006	Terni Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 2	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.2.Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2.1 di cui: COT	273075	0	0	NO	NO	30000	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/04/2024	N/A	30/06/2024		



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F812200510006	Ospedale di Comunità di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	€ 2.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 91.959,82	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	10/11/2022	SI		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavoro/Accordo Quadro (Invalsa)
F812200510006	Ospedale di Comunità di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	2750000	0	0	NO	91959,82	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F812200510006	Ospedale di Comunità di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	2750000	0	0	NO	91959,82	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F812200510006	Ospedale di Comunità di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	2750000	0	0	NO	91959,82	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/06/2026		
F812200230006	Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 22.483,84	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	26/02/2019	SI		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Accordo Quadro (Altro) Modalità affidamento lavoro/Accordo Quadro (Altro) Per l'esecuzione dell'intervento si ritiene opportuno affidare la progettazione al Consorzio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria edile in essere, avente scadenza il 18/10/2023 (contratto Reg. USL n. 66/2020 e successivo rinnovo programmato Reg. USL n. 27/2021). L'Accordo quadro di cui trattasi è comunque in vigore fino al 31/12/2023. L'Accordo quadro è stato stipulato con appositi contratti attuativi, entro il arco temporale di validità dell'accordo stesso, ed entro un determinato importo massimo, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'Accordo quadro. L'Accordo quadro è in corso di esecuzione e la procedura di gara è stata indicata dall'Azienda sanitaria, e aggiudicata con Delibera n. 1200 del 26/09/2019.
F812200230006	Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	750000	0	0	NO	22483,84	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F812200230006	Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	750000	0	0	NO	22483,84	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F812200230006	Ospedale di Comunità di Perugia (ex Centro Servizi Gioco)	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	750000	0	0	NO	22483,84	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/03/2026	N/A	30/06/2026		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F43D220048001	Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	€ 4.442.023,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 1000000,00	€ 22.052,16	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/10/2023	N/A		Caricabo	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F43D220048001	Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	4442023	0	0	NO	NO	1000000	22052,16	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/11/2023	N/A			
F43D220048001	Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	4442023	0	0	NO	NO	1000000	22052,16	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/11/2026	N/A			
F43D220048001	Ovieto - ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	4442023	0	0	NO	NO	1000000	22052,16	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/04/2026	N/A	30/06/2026		
F45F220048001	Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	€ 680.954,40	€ 0,00	€ 127.899,14	NO	NO	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/07/2023	N/A		Caricabo	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Accordo Quadro (Inviati)
F45F220048001	Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	680954,4	0	127899,14	NO	NO	100000	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F45F220048001	Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	680954,4	0	127899,14	NO	NO	100000	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/11/2025	N/A			
F45F220048001	Terni (geriatrico) - viale Trento, 34, ospedale di comunità, intervento di ristrutturazione e completamento nuova costruzione	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	680954,4	0	127899,14	NO	NO	100000	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/03/2026	N/A	30/06/2026		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F93D210050001	Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	€ 4.779.290,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 10003000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/07/2023	N/A		Caricato	Modalità affidamento progettazione/Affidamento autonomo Modalità affidamento lavori: Affidamento autonomo
F93D210050001	Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	4779290	0	0	NO	NO	1000000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/12/2023	N/A			
F93D210050001	Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	4779290	0	0	NO	NO	1000000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	N/A			
F93D210050001	Montefelco - Ospedale di comunità, intervento di recupero funzionale e aree	Missione 6 "Salute"	Component 1	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	4779290	0	0	NO	NO	1000000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/03/2026	N/A	30/06/2026		
F17H2201210007	Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 2.575.388,53	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su PRG/SI. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata la pubblicazione del contratto di affidamento lavori. Il Consig. di Amministrazione Regionali (C.A.R.) ha considerato il progetto "SI" e ha considerato qualificante per l'avvio del progetto.
F17H2201210007	Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	2575388,53	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consig)	31/12/2022	SI			
F17H2201210007	Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	2575388,53	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
F17H2201210007	Digitizzazione dell'Ospedale di Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	2575388,53	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F37H22001050001	Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 1.184.497,32	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto.
F37H22001050001	Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1184497,32	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	31/12/2022	SI			
F37H22001050001	Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1184497,32	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
F37H22001050001	Digitizzazione dell'Ospedale di Spoleto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1184497,32	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		
F47H22001310001	Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 1.283.205,41	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto.
F47H22001310001	Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1283205,41	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	31/12/2022	SI			
F47H22001310001	Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1283205,41	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
F47H22001310001	Digitizzazione dell'Ospedale di Orvieto	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1283205,41	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F37H22001170001	Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 2.467.702,75	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto.
F37H22001170001	Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	2467702,75	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	31/12/2022	SI			
F37H22001170001	Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	2467702,75	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
F37H22001170001	Digitizzazione dell'Ospedale di Foligno	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	2467702,75	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		
F37H22001080007	Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 1.942.836,97	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Nelle relazioni mensili di monitoraggio trasmesse al Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto.
F37H22001080007	Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1942836,97	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	31/12/2022	SI			
F37H22001080007	Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1942836,97	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
F37H22001080007	Digitizzazione dell'Ospedale di Gubbio - Guelfo Tadino	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	1942836,97	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F8F2200320008	Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 5.415.065,50	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto.
F8F2200320008	Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	5413065,5	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	31/11/2022	SI			
F8F2200320008	Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	5413065,5	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
F8F2200320008	Digitalizzazione della struttura ospedaliera S.M.Misericordia - Perugia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	5413065,5	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		
I47H2200920001	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	€ 4.568.065,50	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)	15/04/2022	SI		Caricato	Il progetto risulta avviato in base ai dati riportati su REGIS. Ministero della Salute, il progetto risulta nello stato "NON AVVIATO" in quanto non è stata ancora effettuata l'adesione agli AC Consip da RUP aziendali, fase che l'MIS considera qualificante per l'avvio del progetto.
I47H2200920001	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	4568065,5	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO (fase in capo a Consip)	31/11/2022	SI			
I47H2200920001	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	4568065,5	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	31/07/2025	N/A			
I47H2200920001	DIGITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 1.1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	4568065,5	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	30/09/2025	N/A	30/09/2025		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
FR16J22001150006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
FR16J22001150006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	09/09/2022	SI			
FR16J22001150006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	28/09/2022	SI			
FR16J22001150006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	28/09/2022	SI	31/12/2024		
FR16J22011990004	SISTEMA RADIOLOGICO FISSO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 254.383,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 254.383,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
FR16J22011990004	SISTEMA RADIOLOGICO FISSO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	254383	0	0	NO	NO	254383	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	24/01/2023	SI			
FR16J22011990004	SISTEMA RADIOLOGICO FISSO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	254383	0	0	NO	NO	254383	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	16/11/2024	N/A			
FR16J22011990004	SISTEMA RADIOLOGICO FISSO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	254383	0	0	NO	NO	254383	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
FR16J22002110002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 849.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
FR9J22002110002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	848000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/03/2024	N/A			
FR9J22002110002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	848000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	16/11/2024	N/A			
FR9J22002110002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	848000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
FR9J22002120002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 848.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
FR9J22002120002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	848000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	31/03/2024	N/A			
FR9J22002120002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	848000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	16/11/2024	N/A			
FR9J22002120002	ANGIOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	848000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
FR9J22002130002	PET/TC	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 2.415.400,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 2.415.400,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
FR9J22002130002	PET/TC	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	2413400	0	0	NO	NO	2413400	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	15/11/2022	SI			



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
FR9J2002130002	PE17TAC	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	2413400	0	0	NO	NO	2413400	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	16/11/2024	N/A			
FR9J2002130002	PE17TAC	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	2413400	0	0	NO	NO	2413400	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
FR9J2002180002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
FR9J2002180002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	07/09/2022	SI			
FR9J2002180002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	10/11/2022	SI			
FR9J2002180002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	11/11/2022	SI	31/12/2024		
FR9J2002200006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
FR9J2002200006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	10/08/2022	SI			
FR9J2002200006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	18/04/2023	SI			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
FR9J2002200006	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	18/4/2023	SI	31/12/2024		
FR9J2002190002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Coniep)				Caricato	
FR9J2002190002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	10/08/2022	SI			
FR9J2002190002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	18/04/2023	SI			
FR9J2002190002	ECOTOMOGRAFO	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	18/4/2023	SI	31/12/2024		
144E2000360002	Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 386.043,29	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Coniep)				Caricato	
144E2000360002	Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	386043,29	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
144E2000360002	Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	386043,29	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
144E2000360002	Mammografo completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	386043,29	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
144E22000370006	Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 41.401,50	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 41.401,50	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comsig)				Caricato	
144E22000370006	Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	41401,5	0	0	NO	NO	41401,5	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	13/07/2022	SI			
144E22000370006	Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	41401,5	0	0	NO	NO	41401,5	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	06/12/2022	SI			
144E22000370006	Ecografo multidisciplinare per endoscopia completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	41401,5	0	0	NO	NO	41401,5	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	20/12/2022	SI	31/12/2024		
144E22000380006	Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 41.401,50	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 41.401,50	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comsig)				Caricato	
144E22000380006	Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	41401,5	0	0	NO	NO	41401,5	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	13/07/2022	SI			
144E22000380006	Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	41401,5	0	0	NO	NO	41401,5	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	11/10/2022	SI			
144E22000390006	Ecografo Multidisciplinare ambulatoriale completo di sonde	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	41401,5	0	0	NO	NO	41401,5	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	25/10/2022	SI	31/12/2024		
144E22000390006	Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 81.917,33	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 81.917,33	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comsig)				Caricato	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINO ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
144E2200400006	Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	81917,33	0	0	NO	NO	81917,33	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	02/09/2022	SI			
144E2200400006	Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	81917,33	0	0	NO	NO	81917,33	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	17/10/2022	SI			
144E2200400006	Ecografo Cardiologico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	81917,33	0	0	NO	NO	81917,33	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	24/10/2022	SI	31/12/2024		
144E2200400006	Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 81.182,33	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 81.182,33	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
144E2200400006	Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	81182,33	0	0	NO	NO	81182,33	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	02/09/2022	SI			
144E2200400006	Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	81182,33	0	0	NO	NO	81182,33	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	18/11/2022	SI			
144E2200400006	Ecografo Emodinamico completo di sonde cardiologiche	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	81182,33	0	0	NO	NO	81182,33	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
144E2200410006	Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 79.612,05	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 79.612,05	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
144E2200410006	Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	79612,05	0	0	NO	NO	79612,05	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	13/07/2022	SI			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
I44E2200410006	Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	79812,05	0	0	NO	NO	79812,05	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	30/12/2022	SI			
I44E2200410006	Ecografo cardiologico 3D con sonde cardiologiche e 3D	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	79812,05	0	0	NO	NO	79812,05	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	26/4/2023	SI	31/12/2024		
F19J2200170002	Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 2.295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 2.295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)				Caricato	
F19J2200170002	Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	2395000	0	0	NO	NO	2395000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F19J2200170002	Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	2395000	0	0	NO	NO	2395000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F19J2200170002	Sostituzione Acceleratore Lineare c/o Osp. Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	2395000	0	0	NO	NO	2395000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F19J22001710002	Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 951.380,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)				Caricato	
F19J22001710002	Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	951380	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F19J22001710002	Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	951380	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F19J22001790002	Sostituzione RM c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	951380	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J22001790002	Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 914.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep)				Caricato	
F39J22001790002	Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	914000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J22001790002	Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	914000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J22001790002	Sostituzione RM c/o Ospedale Giulio - Guadio Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	914000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F89J22003260002	Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep)				Caricato	
F89J22003260002	Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	530000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F89J22003260002	Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	530000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F89J22003260002	Sostituzione TC c/o Ospedale di Umbertide	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	530000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
FMEZ200420002	Sostituzione TC c/o Città della Pieve	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
FMEZ200420002	Sostituzione TC c/o Città della Pieve	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	530000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
FMEZ200420002	Sostituzione TC c/o Città della Pieve	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	530000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
FMEZ200420002	Sostituzione TC c/o Città della Pieve	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	530000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F19J2201720002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 280.600,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
F19J2201720002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	280600	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F19J2201720002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	280600	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F19J2201720002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	280600	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J2201800002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 280.600,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINO ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F79J2201800002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	289000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F79J2201800002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	289000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F79J2201800002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	289000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F79J2201270002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F79J2201270002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F79J2201270002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F79J2201270002	Sostituzione Polifunzionale c/o Ospedale di Assisi	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F79J2201730006	Sostituzione Ecdotografica c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F79J2201730006	Sostituzione Ecdotografica c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	38900	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
F19J22001730006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	38930	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F19J22001730006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Città di Castello	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	38930	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/11/2024	N/A	31/12/2024		
F19J22001810006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 36.510,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)				Caricato	
F19J22001810006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	39510	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F19J22001810006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	39510	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F19J22001810006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	39510	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F19J22001160006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)				Caricato	
F19J22001160006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F19J22001160006	Sostituzione Ectodemografo c/o Ospedale Media Valle del Tevere	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F4B22001160006	Sostituzione Ectomografo c/o Ospedale Meda Valle del Tevere	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
FM4E2200430006	Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 36.510,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep)				Caricato	
FM4E2200430006	Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	36510	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
FM4E2200430006	Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	36510	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
FM4E2200440006	Sostituzione Ectomografo c/o SmeDiga P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	36510	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
FM4E2200440006	Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep)				Caricato	
FM4E2200440006	Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
FM4E2200440006	Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
FM4E2200440006	Sostituzione Ectomografo c/o Polambulatori P Europa	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	82000	0	0	NO	NO	82000	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F39J22001380006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 256.700,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 256.700,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
F39J22001380006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256700	0	0	NO	NO	256700	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J22001380006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256700	0	0	NO	NO	256700	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J22001380006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256700	0	0	NO	NO	256700	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J22001400006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
F39J22001400006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J22001400006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J22001400006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J22001420006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
F39J22001420006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	73200	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J22001420006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	73200	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J22001420006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	73200	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F49J22009880006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 256.052,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 256.052,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F49J22009880006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256052	0	0	NO	256052	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F49J22009880006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256052	0	0	NO	256052	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F49J22009880006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256052	0	0	NO	256052	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F69J22001250006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F69J22001250006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	256200	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
F89J22001250006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	256200	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F89J22001260006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	256200	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/11/2024	N/A	31/12/2024		
F89J22001260006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 260.600,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)				Caricato	
F89J22001260006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	289600	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F89J22001260006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	289600	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F89J22001430006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	289600	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F89J22001430006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consip)				Caricato	
F89J22001430006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	256200	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F89J22001430006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	256200	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F39J2201430006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	256200	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J2201450006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep)				Caricato	
F39J2201450006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J2201450006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J2201450006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F59J2201110006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 256.700,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	€ 256.700,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (base in capo a Consep)				Caricato	
F59J2201110006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256700	0	0	NO	256700	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F59J2201110006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256700	0	0	NO	256700	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F59J2201110006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256700	0	0	NO	256700	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F39J2201460006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
F39J2201460006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J2201460006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J2201460006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J2201480006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 562.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	
F39J2201480006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	562000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J2201480006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	562000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J2201480006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	562000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J2201120006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Comp)				Caricato	

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F59J22001120006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	73200	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F59J22001120006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	73200	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F59J22001120006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	73200	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J22001490006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F39J22001490006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	NO	256200	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F39J22001490006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	NO	256200	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J22001490006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	256200	0	0	NO	NO	256200	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F39J22001410006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	€ 257.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 257.200,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F39J22001410006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	257200	0	0	NO	NO	257200	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			



CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F39J22001410006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	257200	0	0	NO	NO	257200	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F39J22001410006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	257200	0	0	NO	NO	257200	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/11/2024	N/A	31/12/2024		
F49J22000910006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 256.200,29	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 256.200,29	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F49J22000910006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	256200,29	0	0	NO	NO	256200,29	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F49J22000910006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	256200,29	0	0	NO	NO	256200,29	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F49J22000910006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	256200,29	0	0	NO	NO	256200,29	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F49J22000920006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE (fase in capo a Consig)				Caricato	
F49J22000920006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F49J22000920006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
F46J2200920006	Apparecchiature Radiologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.1,2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieri (Grandi apparecchiature)	244000	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
146J2200940006	Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	€ 1.215.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/10/2023	N/A		Caricabo	
146J2200940006	Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1215000	0	0	NO	NO	300000	0	0	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
146J2200940006	Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1215000	0	0	NO	NO	300000	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
146J2200940006	Miglioramento sismico palazzine C Neurofisiopatologia	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1215000	0	0	NO	NO	300000	0	0	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F46J21001580001	Orvieto ospedale adeguamento sismico	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	€ 7.347.053,05	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 30.262,49	€ 0,00	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE	31/10/2023	N/A		Caricabo	Modifica affidamento progettazione Affidamento autonomo Modifica affidamento lavor. Affidamento autonomo
F46J21001580001	Orvieto ospedale adeguamento sismico	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	7347053,05	0	0	NO	NO	2000000	0	30262,49	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
F46J21001580001	Orvieto ospedale adeguamento sismico	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	7347053,05	0	0	NO	NO	2000000	0	30262,49	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
F46J21001580001	Orvieto ospedale adeguamento sismico	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	7347053,05	0	0	NO	NO	2000000	0	30262,49	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
F6J21005950001	Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	€ 0,00	€ 19.433.287,73	€ 0,00	NO	NO	€ 4.433.287,00	€ 0,00	€ 40.441,66	€ 0,00	AVVIATO	Publicazione di gara d'appalto e accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	31/03/2023	NO		Non caricabo	La gara è stata pubblicata dal RUP con il link della procedura di gara pubblicata è il seguente https://www.umbria2.it/it/procedura-aperta-identificativa-affidamento-modulare-appalto-antiqua-della-procedura-di-miglioramento-sismico-dello-ospedale-san-giovanni-battista-di-foligno

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
FE2C21005950001	Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	0	19433297,73	0	NO	NO	4433297	40441,66	0	AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	27/01/2024	N/A			
FE2C21005950001	Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	0	19433297,73	0	NO	NO	4433297	40441,66	0	AVVIATO	ESECUZIONE FORNITURA	15/11/2024	N/A			
FE2C21005950001	Foligno - Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista: miglioramento sismico	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - 1.2.1. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	0	19433297,73	0	NO	NO	4433297	40441,66	0	AVVIATO	COLLAUDO	31/12/2024	N/A	31/12/2024		
197H22030320006	FSE - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni	€ 4.331.429,53	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti del FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHR.	31/12/2024	N/A		Non caricato	Con nota pec prot. reg. n. 283339 del 23/10/22 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione che contiene il cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere per il raggiungimento dei T&M previsti
197H22030320006	FSE - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni	455.1429,53	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)	31/12/2025	N/A			
197H22030320006	FSE - Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni	455.1429,53	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato il collaudo F fascicolo sanitario elettronico	30/09/2026	N/A	30/09/2026		
-	FSE - Risorse per competenze digitali	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni	€ 4.189.608,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti del FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHR.	31/12/2024	N/A		Non caricato	Con nota pec prot. reg. n. 50396 del 03/03/2023 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato il piano di adeguamento tecnologico (PAT) trasmesso dalla Regione che contiene il cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere per il raggiungimento dei T&M previsti. In attesa di approvazione del PAT da parte delle Regioni, le Regioni del SSR quali soggetti attuatori esterni (DSR 382/2023), le quali devono ancora staccare i relativi CUP.
-	FSE - Risorse per competenze digitali	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - 1.3.1.2) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni	4.956/00	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)	31/12/2025	N/A			

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
-	FSE - Risorse per competenze digitali	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e l'utilizzo FSE da parte delle Regioni	4166606	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il fascicolo sanitario elettronico	30/09/2026	N/A	30/09/2026		
167H22003110001	SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DELLA REGIONE UMBRIA VIA M. ANGELONI, PERUGIA SERVIZI DIGITALI	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MIS e sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	€ 466.086,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NISIS) a livello locale - Completamento del patrimonio di nuovi flussi informativi nazionali addizionali da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria	30/09/2023	N/A		Non caricato	
167H22003110001	SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DELLA REGIONE UMBRIA VIA M. ANGELONI, PERUGIA SERVIZI DIGITALI	Missione 6 "Salute"	Component 2	1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MIS e sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	406680	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NISIS) a livello locale - Completamento del patrimonio di nuovi flussi informativi nazionali addizionali da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria	30/09/2025	N/A			
194D2100070001	TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	€ 463.213,36	€ 0,00	€ 1.321.782,64	NO	NO	€ 1.775.096,00	€ 262.803,51	€ 86.672,63	AVVIATO	Definizione fabbisogno formativo, redazione di MMG per il triennio 2021-2024	30/09/2021	SI		Caricato	L'importo dell'intervento è costituito da finanziamento PNRR (a valere sul cap. 2392) e FSN (a valere sul cap. 2393). Il D.M. 02/11/2021 prevede il finanziamento PNRR di € 463.213,36 ripartito nei tre anni 2021-2022-2023 (€ 151.071,12 per ciascun anno). Il finanziamento delle borse FSN è coperto da quote impegnate precedentemente (vestiti di spesa).
194D2100070001	TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	452413,36	0	1321782,64	NO	NO	1775096	262803,51	86672,63	AVVIATO	Publicazione del Decreto di allocazione iscrizioni alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2021-2024	31/12/2021	SI			
194D2100070001	TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	452413,36	0	1321782,64	NO	NO	1775096	262803,51	86672,63	AVVIATO	Publicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della Salute	31/12/2021	SI			
194D2100070001	TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	452413,36	0	1321782,64	NO	NO	1775096	262803,51	86672,63	AVVIATO	Concessione, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori	30/09/2022	SI			
194D2100070001	TRIENNIO 2021-2024: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 369/1999) - ammissioni triennali in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale per il conseguimento del diploma per svolgere attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formative di natura pratica	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1	452413,36	0	1321782,64	NO	NO	1775096	262803,51	86672,63	AVVIATO	Le regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale	30/09/2022	SI	30/09/2022		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	Progetto Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
194022002980007	TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 389/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilitazione professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formativa di natura pratica.	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale	€ 45213,36	€ 0,00	€ 1.133.032,64	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2022-2025	30/09/2022	SI		Non caricato	L'impegno dell'intervento è costituito da finanziamento PNRR (in valore sul cap. 2361_S) + FSN (in valore sul cap. 02260_S) ID.M. 22092022 prevede il finanziamento PNRR di € 45213,36 (in valore sul cap. 2361_S) e FSN di € 0,00 (in valore sul cap. 02260_S). L'accreditamento-impiego di spesa dell'impegno 6453213_36 PNRR è stato fatto con d.d. n. 3834 del 08/04/2023. Il finanziamento è stato iscritto in conto di spesa in quale categoria contabile (vedi tab. di spesa)
194022002980007	TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 389/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilitazione professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formativa di natura pratica.	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale	45213,36	0	1133032,64	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	Publicazione del Decreto di allocazione risorse alle Regioni per finanziare Borse Formazione MMG 2022-2025	31/12/2022	SI			
194022002980007	TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 389/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilitazione professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formativa di natura pratica.	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale	45213,36	0	1133032,64	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	Publicazione dei bandi regionali e del Piano triennale di lavoro del dipartimento del Ministero della Salute	31/12/2022	SI			
194022002980007	TRENNIO 2022-2025: corso di formazione specifica in medicina generale/corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 389/1999) - ammissione triennale in medicina e chirurgia abilitazione professionale per il conseguimento del diploma per svolgere l'attività di medico di medicina generale/corso triennale con obbligo della frequenza delle attività didattiche, teoriche e pratiche. In formazione prevede un totale di complessive 4800 ore di cui un terzo di attività seminariale e due terzi in attività formativa di natura pratica.	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.1. borse aggiuntive in formazione di medicina generale	45213,36	0	1133032,64	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori	30/06/2023	N/A			
														Le regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale	30/09/2023	N/A	30/06/2023		
F94C2300110005	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2. corso di formazione in infezioni ospedaliere	€ 362.398,03	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	Completamento procedure di selezione dei provider da parte delle Regioni	31/03/2023	SI		Non caricato	Nella colonna "Stamenti 31/12/2022" è stato inserito l'impegno complessivo assegnato alle Regioni Umbria dal DM 22/01/2022. Nuovo assegnato con il DM 31/03/2023 è stato inserito l'impegno assegnato a ciascuna delle 4 Aziende Sanitarie Regionali con DGR 322/2023.
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2024	N/A			
														Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	31/03/2025	N/A			
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2025	N/A			
														Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	30/09/2025	N/A			
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2026	N/A	30/06/2026		
14402200270006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2. corso di formazione in infezioni ospedaliere	€ 255.619,17	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	Completamento procedure di selezione dei provider da parte delle Regioni	31/03/2023	SI		Non caricato	Nella colonna "Stamenti 31/12/2022" è stato inserito l'impegno complessivo assegnato alle Regioni Umbria dal DM 22/01/2022. Nella colonna "Stamenti 31/03/2023" è stato inserito l'impegno assegnato alle 4 Aziende Sanitarie Regionali con DGR 322/2023.
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2024	N/A			
														Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	31/03/2025	N/A			
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2025	N/A			
														Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	30/09/2026	N/A	30/06/2026		
F94C2201130006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Componenti 2	2.2. Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2. corso di formazione in infezioni ospedaliere	€ 341.362,04	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	Completamento procedure di selezione dei provider da parte delle Regioni	31/03/2023	SI		Non caricato	Nella colonna "Stamenti 31/12/2022" è stato inserito l'impegno complessivo assegnato alle Regioni Umbria dal DM 22/01/2022. Nella colonna "Stamenti 31/03/2023" è stato inserito l'impegno assegnato alle 4 Aziende Sanitarie Regionali con DGR 322/2023.
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2024	N/A			
														Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	31/03/2025	N/A			
														Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2025	N/A			
														Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	30/09/2026	N/A	30/06/2026		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
F43C22000550006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere	€ 256.626,16	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	Completamento procedure di selezione dei provider da parte delle Regioni	31/03/2023	SI		Non caricato	Nella colonna "Stanzamenti 31/12/2022" è stato inserito l'importo complessivo assegnato alla Regione Umbria dal DM 22/01/2022. Nella colonna "Stanzamenti 31/03/2023" è stato inserito l'importo assegnato dalla Regione Umbria alle Sanitarie Regionali con DGR 32/2/2023.
F43C22000550006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere	256626,16	0	0	NO	NO	0	0	0	0	AVVIATO	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2024	N/A			
F43C22000550006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere	256626,16	0	0	NO	NO	0	0	0	0	AVVIATO	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	31/03/2025	N/A			
F43C22000550006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere	256626,16	0	0	NO	NO	0	0	0	0	AVVIATO	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	30/09/2025	N/A			
F43C22000550006	"Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 2.2.2 corso di formazione in infezioni ospedaliere	256626,16	0	0	NO	NO	0	0	0	0	AVVIATO	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	30/09/2026	N/A	30/09/2026		
F9822001370001	PNRR-MAD-2022-12376035	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AVVIO attività	20/05/2023	N/A		Non caricato	Per ogni fase di valutazione sono previsti 30 giorni per la presentazione della documentazione. Data finale prorogabile fino a 6 mesi
F9822001370001	PNRR-MAD-2022-12376035	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	1000000	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	VALUTAZIONE intermedia	20/05/2024	N/A			
F9822001370001	PNRR-MAD-2022-12376035	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	1000000	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	VALUTAZIONE finale	20/05/2025	N/A	20/05/2025		
F9822001380001	PNRR-POC-2022-12375910	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AVVIO attività	20/05/2023	N/A		Non caricato	Per ogni fase di valutazione sono previsti 30 giorni per la presentazione della documentazione. Data finale prorogabile fino a 6 mesi
F9822001380001	PNRR-POC-2022-12375910	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	1000000	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	VALUTAZIONE intermedia	20/05/2024	N/A			
F9822001380001	PNRR-POC-2022-12375910	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	1000000	0	0	NO	NO	0	0	0	0	NON AVVIATO	VALUTAZIONE finale	20/05/2025	N/A	20/05/2025		

CUP	titolo intervento/progetto	Missione	Componente	Investimento	finanz PNRR	finanz PNC	Finanz AL TRI	Progetto Pre-esistente	Finanz Pre-esistente	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	Proget Avviato	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA A REGIS	NOTE
143C22000610006	PNRR-MAD-2022-12376886	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NON AVVIATO	AVVIO attività	20/05/2023	N/A		Non caricato	Alta della 44.31.03/23.1 progetto non è ancora decodato, lo sarà il 21/04/23
143C22000610006	PNRR-MAD-2022-12376886	Missione 6 "Salute"	Component 2	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	1000000	0	0	NO	NO	0	0	0	NON AVVIATO	VALUTAZIONE intermedia	20/05/2024	N/A	20/05/2025		
16F2200070006	Potenziamento della resilienza cyber della sanità umbra	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"	Component 1	1.5 Cybersecurity	€ 957.822,98	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	L1 Miglioramento della consapevolezza delle persone	31/12/2024	N/A	31/12/2024	Non caricato	In attesa dell'istituzione dei capitoli in entrata e in uscita, che consentano il riacquisto di impiego, la Regione sta diffidando il provider interessato.
16F2200070006	Potenziamento della resilienza cyber della sanità umbra	Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"	Component 1	1.5 Cybersecurity	957822,98	0	0	NO	NO	0	0	0	AVVIATO	POT Attivazione del supporto specialistico per situazione campagne di uffici di call center	31/12/2024	N/A	31/12/2024	Non caricato	

PROVINCIA DI PERUGIA

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SI/NO	SI/NO	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTE (euro)	IMPORTO PRECEDENTE (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE	
SI	991H90068001		SI	ITIS VOLTA PESCIUCCO PERUGIA - ADEGUAMENTO SEMICO.DIMENSIONE E RICOSTRUZIONE	M4	C1	11.03	3.993.000,00			SI	3.993.000,00	48.257,91	103.194,36	48.257,91	AVVIATO	Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 376 DEL 27/02/2023		Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	In attesa di validazione quadro economico per gara da Regis	
	991H90068001																Avvio dei lavori	30/11/2023					
	991H90068001																	Condizione dei Lavori	31/03/2025				
	991H90068001																	Collaudi dei Lavori	30/06/2025				
SI	127H80029001		NO	S.P. N. 421 DI COLLAZIONE RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANCO KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO	M2	C4	12.01	847.000,00			NO					AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	30/09/2025	SI - 20/05/2025				
	127H80029001																	GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI	30/11/2025				
	127H80029001																	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA	30/03/2024				
	127H80029001																	INIZIO LAVORI	30/04/2024				
	127H80029001																	FINE LAVORI	30/04/2025				
	127H80029001																	RENDICONTAZIONE	31/12/2025				
SI	127H90029003		NO	S.P. N. 207 DI CACAMBRUCCI RISANAM. E CONSOLID. CORFO STADIALE A SEGUITO FENOMENI FRANOSI	M2	C4	12.01	523.000,00		717.000,00	NO					AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	30/11/2022	SI - 24/11/2022				
	127H90029003																	GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI	31/12/2022				
	127H90029003																	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA	30/04/2023				
	127H90029003																	INIZIO LAVORI	30/06/2023				
	127H90029003																	FINE LAVORI	30/06/2024				
	127H90029003																	RENDICONTAZIONE	31/12/2024				
SI	127H90031004		NO	S.P. N. 310/2 DI PAGIANO, CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO FENOMENI FRANOSI	M2	C4	12.01	870.000,00			NO					AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	30/09/2025					
	127H90031004																	GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI	30/11/2025				
	127H90031004																	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA	30/05/2024				
	127H90031004																	INIZIO LAVORI	30/04/2024				
	127H90031004																	FINE LAVORI	30/04/2025				
	127H90031004																	RENDICONTAZIONE	31/12/2025				
SI	127E200094001		NO	S.P. 241 DI SANTELEUCO DAL KM 10+00 AL KM 14+55 Riquadrificazione pavimentazioni carichi, rinnovamento segnalatica verticale ed orizzontale e miglioramento delle barriere di sicurezza	M5	C3	11.01	175.337,00		175.337,00	NO	175.337,00				AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	06/12/2022	SI - 17/11/2022				
	127E200094001																	GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI	05/04/2023				
	127E200094001																	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA	31/05/2023				
	127E200094001																	INIZIO LAVORI	01/06/2023				
	127E200094001																	FINE LAVORI	30/06/2024				
	127E200094001																	RENDICONTAZIONE	31/07/2024				



PROVINCIA DI PERUGIA

SI	J27E200176001	SE 209 VALNERINA Interventi straordinari di manutenzione ordinaria e straordinaria per adeguamento galleria e sistemazione del muro al di sotto delle reti DAL KM 47+150 AL KM 64+300	M5	C3	11.01	489.348,00	489.348,00	NO	489.348,00					PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	NON AVVIATO	31/10/2023			
	J27E200176001													GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI		31/05/2024			
	J27E200176001													AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA		31/05/2024			
	J27E200176001													INIZIO LAVORI		30/06/2024			
	J27E200176001													FINE LAVORI		30/09/2025			
	J27E200176001													RENDICONTAZIONE		31/12/2025	31/12/2025		
SI	J37E200158001	SF 470 DI POGGIODOMO Interventi di straordinaria manutenzione a tratti salinari e sistemazione di barriere DAL KM 0+000 AL KM 3+350	M5	C3	11.01	415.000,00	415.000,00	NO	415.000,00					PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	NON AVVIATO	30/06/2024			
	J37E200158001													GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI		31/06/2024			
	J37E200158001													AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA		31/07/2024			
	J37E200158001													INIZIO LAVORI		30/10/2024			
	J37E200158001													FINE LAVORI		30/09/2025			
	J37E200158001													RENDICONTAZIONE		30/11/2025	30/11/2025		
SI	J37E200160001	S.C. DI ESCALACIA MORENA Riqualficazione pavimentazione carrabile, adeguamento costruzioni di attraversamenti per caprazze e ripristino di barriere, sistemazione di barriere verticali e orizzontali, inserimento di barriere laterali DAL KM 16+958 AL KM 17+650	M5	C3	11.01	217.229,00	217.229,00	NO	217.229,00					PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	NON AVVIATO	30/04/2024			
	J37E200160001													GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI		30/06/2024			
	J37E200160001													AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA		30/07/2024			
	J37E200160001													INIZIO LAVORI		31/08/2024			
	J37E200160001													FINE LAVORI		30/09/2025			
	J37E200160001													RENDICONTAZIONE		30/11/2025	30/11/2025		
SI	J47E200090001	SF 4 Interventi di straordinaria manutenzione a tratti salinari comprendenti la sistemazione di barriere portello e sostituzione muro su curva DAL KM 0+000 AL KM 20+600	M5	C3	11.01	300.000,00	300.000,00	NO	300.000,00					PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AVVIATO	31/05/2023			
	J47E200090001													GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI		31/07/2023			
	J47E200090001													AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA		01/08/2023			
	J47E200090001													INIZIO LAVORI		30/08/2023			
	J47E200090001													FINE LAVORI		31/11/2023			
	J47E200090001													RENDICONTAZIONE		31/12/2023	31/12/2023		
SI	J47E200092001	S.C. SIKILGURBIO KM 0+000 AL KM 15+000. Consolidamento ponte fiume Chiusio e ripavimentazione della pavimentazione della strada di collegamento tra S. Sigillo e Gabbro	M5	C3	11.01	250.000,00	250.000,00	NO	250.000,00					PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AVVIATO	15/09/2023			
	J47E200092001													GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI		31/01/2024			
	J47E200092001													AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - STIPULA		31/05/2024			
	J47E200092001													INIZIO LAVORI		30/04/2024			
	J47E200092001													FINE LAVORI		30/09/2024			



	J8RE00050001																		Verbalizzare di consegna e piano lavori contestuale 18/04/2023			
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					30/06/2026
SI	J8RE00050001	LICCO ARTISTICO DE TERTIA SIOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	CI	IA,03	300,000,00	300,000,00	SI	300,000,00	223.779,46	148.887,69		AVVIATO					Avvio dei lavori				
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001	LICCO CLASSICO CLURBO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	CI	IA,03	200,000,00	200,000,00	SI	200,000,00	189.988,24	103.203,43		AVVIATO									
SI	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
SI	J8RE00050001	IFASTODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	CI	IA,03	1.980,000,00	1.980,000,00	SI	1.980,000,00	158.362,46	112.672,63		AVVIATO									
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
SI	J8RE00050001	IPSIA - TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	CI	IA,03	215,000,00	215,000,00	SI	215,000,00	53.600,47	43.954,81		AVVIATO									
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
SI	J8RE00050001	LICCO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	CI	IA,03	160,000,00	160,000,00	SI	160,000,00	112.892,17	92.534,81		AVVIATO									
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
	J8RE00050001																					
SI	J7C2300010001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "PROFEZIO" ASSISI - PG - VIA PADRE LUDOVICO DA CASORIA,3	M4	CI	IA,03	2.860,000,00	2.860,000,00	NO					NON AVVIATO									
	J7C2300010001																					



PROVINCIA DI PERUGIA

PSRE0000390001														Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 1738 DEL 03/08/2022						
PSRE0000390001														Avvio dei lavori	30/11/2023	SI - VERBALE DEL 14/07/2022 INDO LVOROI N. 18/07/2022						
PSRE0000390001														Conclusione dei Lavori	31/03/2026	Certificato Regolare esecuzione del 14/10/2022						
PSRE0000390001														Collaudo dei Lavori	30/06/2026				30/06/2026	Intervento non soggetto a collaudo		
PSRE0000400001	SI				CI	M4		226.038,44	226.038,44		226.038,44	0,00		AVVIATO							In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis	
PSRE0000400001														Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 3152 DEL 21/12/2022						
PSRE0000400001														Avvio dei lavori	30/11/2023							
PSRE0000400001														Conclusione dei Lavori	31/03/2026							
PSRE0000400001														Collaudo dei Lavori	30/06/2026							
PSRE0000400001														Collaudo dei Lavori	30/06/2026							
PSRE0000400001	SI				CI	M4		226.636,44	226.636,44		226.636,44			AVVIATO							In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis	
PSRE0000400001														Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 8 DEL 04/01/2023						
PSRE0000400001														Avvio dei lavori	30/11/2023							
PSRE0000400001														Conclusione dei Lavori	31/03/2026							
PSRE0000400001														Collaudo dei Lavori	30/06/2026							
J4E2100130001	SI				CI			1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	67.801,06	7.308,26	AVVIATO								In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis
J4E2100130001														Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 300 DEL 16/02/2023						
J4E2100130001														Avvio dei lavori	30/11/2023							
J4E2100130001														Conclusione dei Lavori	31/03/2026							
J4E2100130001														Collaudo dei Lavori	30/06/2026							
J5E220018006	SI				CI	M4		2.300.000,00	2.300.000,00					NO								In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006	SI				CI	M4		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	7.707,96		AVVIATO								In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006	SI				CI	M4		385.000,00	385.000,00		385.000,00	17.986,77		AVVIATO								In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006																						
J5E220018006	SI				CI	M4		385.000,00	385.000,00		385.000,00	17.986,77		AVVIATO								In attesa validazione quadro economico pre gara da Regis

PROVINCIA DI PERUGIA

	J8RE000490001														15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 377 DEL 22/02/2023			In corso procedimento di stipula contrattuale
	J8RE000490001														30/11/2023				
	J8RE000490001														31/03/2026				
	J8RE000490001														30/06/2026				
SI	J8RE100050001	ISTITUTO D'ARTE DEBUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE	M4	CI	13,03	4.840.000,00	4.840.000,00	SI	SI	210.733,34	61.566,58	61.566,58	AVVIATO						In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS
	J8RE100050001														15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 547 DEL 13/04/2023			In corso procedimento di stipula contrattuale
	J8RE100050001														30/11/2023				
	J8RE100050001														31/03/2026				
	J8RE100050001														30/06/2026				
SI	J8SE200020006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DIRUTTA VIA IBERNINA FREDERICO PEROTTI DA SIBBERALLE	M4	CI	13,03	2.550.000,00		NO					AVVIATO						
	J8SE200020006														15/09/2023				Su REGIS l'intervento ancora non è stato caricato dal MI.M. In corso fase di progettazione definitiva
	J8SE200020006														30/11/2023				
	J8SE200020006														31/03/2026				
	J8SE200020006														30/06/2026				
SI	J8SC2100050001	15 MARCONI QUICINO VIA ROSA ABELL - MIGLIORAMENTO SEMCO	M4	CI	13,03	3.650.000,00	3.650.000,00	SI		87.077,62	11.232,83	11.232,83	AVVIATO						In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS
	J8SC2100050001														15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 522 DEL 09/03/2023			In corso procedimento di stipula contrattuale
	J8SC2100050001														30/11/2023				
	J8SC2100050001														31/03/2026				
	J8SC2100050001														30/06/2026				
SI	J8SE2000030001	TEC.PISA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO	M4	CI	13,03	1.650.000,00	1.650.000,00	SI		75.449,33	28.881,38	28.881,38	AVVIATO						In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS
	J8SE2000030001														15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 42 DEL 18/01/2023			Contratto rep. 17477 stipulato in data 29 aprile 2023
	J8SE2000030001														30/11/2023				Consegna dei lavori entro 09/06/2023
	J8SE2000030001														31/03/2026				
	J8SE2000030001														30/06/2026				
SI	J68H9000780001	ADDEGLIAMENTO MIGLIORAMENTO SEMCO EDIFICIO EX LABORATORIO MISURE TESI DA VINCI DI PUGNO	M4	CI	13,03	2.200.000,00	2.200.000,00	SI		357.136,41	318.357,26	318.357,26	AVVIATO						In attesa validazione quadro economico pre gara da REGIS
	J68H9000780001														15/09/2023	SI - AGGIUDICATO CON D.D. 2213 DEL 29/09/2021			Contratto rep. 1398 stipulato in data 23/12/2021
	J68H9000780001														30/11/2023	SI - AVVAI EFFETTIVAMENTE IL 07/02/2022			
	J68H9000780001														31/03/2026				Conclusione lavori prevista per il 01/09/2023



PROVINCIA DI PERUGIA

SI	P98E200050001	LICEO CLASSICO MAROTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	Cl	13.03	770.000,00						16.690,07	770.000,00	SI		AVVIATO	Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023	SI - AGGIUDICATO COM.D. 521 DEL 09/09/2023			In attesa validazione quadro economico pre gara di RGA		
	P98E200050001																Avvio dei lavori	30/11/2023						
	P98E200050001																	Conclusione dei Lavori	31/03/2026					
	P98E200050001																	Collaudo dei Lavori	30/06/2026		30/06/2026			
SI	P99Z200050006	MIGLIORAMENTO SSMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIBICO SITO IN VIA VERNOCCHI 29	M4	Cl	13.03	1.516.944,00								NO		AVVIATO	Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023					Su RGA l'interventone è stato ancora caricato dal MIN	
	P99Z200050006																	Aggiudicazione dei Lavori	15/09/2023					In corso fase di progettazione definitiva
	P99Z200050006																	Avvio dei lavori	30/11/2023					
	P99Z200050006																	Conclusione dei Lavori	31/03/2026					
	P99Z200050006																	Collaudo dei Lavori	30/06/2026		30/06/2026			



PROVINCIA DI TERNI

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	F48B2000620001	IPSIA PERTINI TERNI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI ALLA NUOVA PER ESIGENZE LOGISTICHE	M4	C1	3.3	200.000	-	20.000	NO	-	25.881,87 €	22.949,79 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48B1800370002	I.T.C. DI ORVIETO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PREEXISTENTI NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.	M4	C1	3.3	268.028	-	29.863	NO	-	10.627,26 €	8.426,46 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48B18003640001	LICEO CLASSICO "F. A. GUALTIERO" DI ORVIETO: INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA PER LA MANUTENZIONE E RIPARATURA DELLA STRUTTURA ESISTENTE, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI E TINTEGGIATURE.	M4	C1	3.3	215.281	-	-	NO	-	13.387,59 €	2.281,15 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48E20000080001	ISPTC "CASAGRANDE - CESI" - SEDE P.LE BOSCO - CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRIMO LOTTO	M4	C1	3.3	560.038	-	-	SI	66.844	19.072,60 €	5.249,79 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48B2000630001	LICEO CLASSICO "G. C. TACITO" DI TERNI: MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICIO SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE	M4	C1	3.3	2.250.000	-	225.000	SI	167.175	26.018,93 €	1.224,40 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48E2000070001	ISPTC "CASAGRANDE - CESI" DI TERNI: SEDE PIAZZALE BOSCO - CORPI ORIGINARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SECONDO LOTTO	M4	C1	3.3	419.982	-	357.038	NO	-	-	-		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48E20000080001	IPSIA "PERTINI" OFFICINE DI TERNI: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINA ARI E MESTIERI	M4	C1	3.3	300.000	-	30.000	SI	28.479	5.533,51 €	3.700,44 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48E20000090001	LICEI STATALI LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENZE UMANE "ANGELONI" DI TERNI: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	M4	C1	3.3	1.850.000	-	513.000	SI	138.611	26.018,93 €	4.550,89 €		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48F20000010001	I.P.S.I.A. DI ORVIETO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO	M4	C1	3.3	1.708.000	-	-	SI	92.200	59.669,35 €	-		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48B20001190001	ITC MNRNI SCALO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	M4	C1	3.3	100.000	-	10.000	NO	-	99.497,21 €	-		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48B20001230001	ITG DI ORVIETO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	M4	C1	3.3	50.000	-	-	NO	-	-	-		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48B20001270001	LICEO ARTISTICO DI VIA GROCE (SV): INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	M4	C1	3.3	70.000	-	7.000	NO	-	335,00 €	-		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F47H20004760001	ITT DI TERNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROSPETTIVE E COPERTURA CORPO PRINCIPALE E OFFICINE	M4	C1	3.3	138.800	-	13.880	NO	-	457,00 €	-		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F48F22000340006	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ITI DI TERNI	M4	C1	1.3	1.650.000	-	-	NO	-	-	-		AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	31/08/2023 31/12/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026				
SI	F34E22000080006	REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ITI DI AMELIA	M4	C1	3.3	1.050.000	-	-	NO	-	-	-		NON AVVIATO						

PROVINCIA DI TERNI

si	F4SD200310006	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DELL'ISTITUTO IPSIA DI ORVIETO	M4	C1	3,3	180.000	-	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON AVVIATO
si	F4BE200112006	REALIZZAZIONE DI UNA TENNIS STRUTTURA DA DESTINARE A PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO DI TERNI	M4	C1	3,3	730.000	-	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON AVVIATO
si	F4BE200442002	LICEO SCIENTIFICO "DONATELLI" DI TERNI EDIFICIO PREFABBRICATO - TERNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO.	M4	C1	3,3	1.145.000	-	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NON AVVIATO

COMUNE DI PERUGIA

INQUADRO ATTIVITÀ FASCE (S/N/O)	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DALL'INAR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FISC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (S/N/O)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	DESCRIZIONE IN CASO DI TRASPARENZA AFFERMATIVA NELLA COLONNA PRECEDENTE	RACCOMANDA VALORI SU RISERVE INRSC AI NETTO IVA AL 31/12/2022	RACCOMANDA VALORI SU RISERVE INRSC AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI Indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal contenuto della fase procedurale	TERMINI ULTIMO PREVISTO Indicare per ogni fase prevedibile il termine ultimo di conclusione previsto	RISPETTO DEL TERMINE (S/N/O)	DATA FINALE Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	ATTIVITÀ RELATIVE A IRGGS	NOTE			
51	CG1220081006	PATRIMONIO IMMOBILIARE Comuni (Ottobre 2022)	M1	Cl Inv. 1.3	Misure 1.3.1	203.415,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	INSEGNAMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	24/12/2022 S	24/02/2024									
51	CG41200220006	SOSTEGNO ALLA GESTIONE E PREVENZIONE VULNERABILITÀ AMIGLIE E BAMBINI - PROGETTO PPI	M5	Cl Inv. 1.1		211.000,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	24/02/2024 31/03/2026	31/03/2026									
51	CG41200227006	PERCORSO DI AUTISMO PER PERSONE CON DISABILITÀ MANTENIMENTO PERSONE DISABILI AL PROPRIO DOMICILIO	M5	Cl Inv. 1.2		297.916,61	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	17/07/2023 04/09/2023 30/09/2023 30/06/2026 30/06/2026										
51	CG41200225006	AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTI DIFFUSI PER ANZIANI	M5	Cl Inv. 1.2		2.460.000,00	- €	- €	- €	- €	NON AVVIATO	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	08/06/2023										
51	CG41200228006	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURNOI TAGLI PERICOLO DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	M5	Cl Inv. 1.1.4		209.996,28	- €	- €	- €	- €	NON AVVIATO	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	29/05/2023 15/06/2023 29/06/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/03/2026										
51	CG12200202001	RENNOVO FLOTTE BUS - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI ADMIBIA TPL	M2	Cl Inv. 4.4.1		7.258.513,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	25/06/2023										
51	CG18200028005	ECO BOLE	M5	Cl Inv. 2.3		500.000,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	PTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PROGETTO DEFINITIVO PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	31/07/2023 30/06/2023 31/07/2023 01/10/2024 30/09/2024										
51	CG18200029001	SISTEMI DI IRRADIAZIONE SONAGLIANZA	M5	Cl Inv. 2.3		340.000,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	PTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PROGETTO DEFINITIVO PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	12/01/2021 S 31/05/2023 31/07/2023 31/08/2023 01/10/2024 30/11/2024										
51	CG18200029001	PSTE CICLABILI	M5	Cl Inv. 2.3		1.550.000,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	31/07/2023 31/10/2023 01/10/2024 02/03/2024 31/12/2024 30/04/2025										
51	CG18200029001	SISTEMI DI CONNESSIONE WH	M5	Cl Inv. 2.3		60.000,00	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	PTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PROGETTO DEFINITIVO PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	31/07/2021 S 31/05/2023 31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023 30/09/2024 31/12/2024										
51	CG18200029001	CENTRO INFANZIA CASE BIBLIOTECHE E RICOSTRUZIONE	M4	Cl Inv. 1.1		2.750.000,00	275.000,00				AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESecuzione FORNITURA COLLAUDO	11/12/2021 NO 30/12/2021 S 30/04/2023 S 31/05/2023 31/05/2023 31/12/2023 31/12/2023										
51	CG18200029001	BRT BUS RAPID TRANSIT	M2	Cl Inv. 4.2		86.711.742,76	19.471.082,91				AVVIATO	15.000,00 MANDATO N. 2022/79821 48.481,51€ MANDATO N. 2022/89518 30.997,42€ 22.429,69 MANDATO N. 2022/79828 386.370,67€ 1.315,79€ MANDATO N. 2022/2909.	15/01/2021 S 15/01/2021 S 30/09/2022 S 15/05/2023 NO 15/05/2023 NO 16/11/2022 S 15/01/2023 NO										



51	09201000620001	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL PERCORSO VILLA P.T. FELICINO	C2 Inv. 2.1	4.180.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	31/07/2023 31/07/2023 31/12/2023	31/03/2026
51	09201000640001	RECUITURA PERCORSI INDIRIZZATI DA CENTRO ABITATO DEL PERCORSO VILLA P.T. FELICINO	C2 Inv. 2.1	3.310.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	PROGETTO DEFINITIVO	15/06/2023	31/03/2026
51	09201000650001	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DELLA VIA B.S. FRANCESCO	C2 Inv. 2.1	620.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	AGGIUDICAZIONE	31/07/2023	31/03/2026
51	09201000660006	POTERAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CANTIERI DI CALICO	C2 Inv. 2.1	510.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	30/09/2023 31/07/2023 30/09/2025	31/07/2025
51	09201000620006	PLESSO SCOLASTICI DI SAN AGNANO	C1 Inv. 3.3	200.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/06/2023	30/06/2026
51	09201000690001	ERSALOGGI COMUNALI	M5	1016.999,71	- €	- €	- €	AVVANTO	STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	30/11/2023 31/07/2026 30/06/2026	31/03/2026
51	09201000320006	SPORTS E INCLUSIONE SOCIALE - RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SUSTO	C2 Inv. 3.1	500.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	PROGETTO DEFINITIVO	31/07/2023	31/07/2025
51	09201000130006	SPORTS E INCLUSIONE SOCIALE - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI BALANZANO	C2 Inv. 3.1	3.000.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	PTE RAFFORZATO ESECUTIVA	28/02/2023	31/03/2026
51	09201000640008	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA S.M. DELLA SERRA (PER)	C1 Inv. 1.2	417.000,00	- €	- €	- €	NON AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	15/06/2023 31/07/2023	30/06/2026
51	09201000650008	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA S.M. DELLA SERRA (PER)	C1 Inv. 1.2	407.000,00	- €	- €	- €	NON AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	31/07/2023 31/07/2023 30/09/2023	30/06/2026
51	09201000490005	SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	C2 Inv. 2.3	1.232.000,00	- €	- €	700.000,00	AVVANTO	PROGETTO DEFINITIVO	31/12/2022	31/03/2026
51	09201000450008	RESILIENZA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CANTIERI DI SERVIZIO PUBBLICO (PER) COMUNALI	C4 Inv. 2.2	210.000,00	133.185,39 €	178.864,67 €	- €	AVVANTO	PREDISPONIBILE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	12/08/2022	21/07/2023
51	09201000420001	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI	C2 Inv. 2.3	1.699.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/06/2023	30/09/2025
51	09201000230001	BOSCO SOTTILE E FIENNA - FORTELUCA - PONTI - VALLECFPI	M5	1.340.000,00	- €	- €	- €	AVVANTO	PROGETTO DEFINITIVO	15/06/2023 20/07/2023	31/03/2026

51	C98H200039004	M2	C4 Inv. 2.2	RESILIENZA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI MANUFATTI MANUFATTIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURE E PAVIMENTI PONTE PATTOI	200.000,00										PROGETTO CONCLUSO				CUP non presente in REGIS
51	C98H200037002	M2	C4 Inv. 2.1	GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO (LOC. VILLA PITIGNANO PITIGNANO)	700.000,00				65.977,05 €						AVVANTO		30/06/2023	31/07/2026	Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1369 del 29/12/2021 è stato approvato il Piano di "nuovi progetti" finanziato con le risorse della Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) - Componente C4.1 - Tutele del territorio e della risorsa idrica sub-investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico della Regione Umbra n. 609 del 15/09/2022. La Regione Umbra ha approvato il dettaglio degli interventi relativi ai "nuovi progetti" di cui al piano predetto, destinato al Comune di Pitignano, per il pagamento attraverso il finanziamento necessario.
51	C98H210000001	M5	C1 Inv. 2.3	CENTRO CIVICO	220.000,00									AVVANTO		15/07/2023	30/06/2024	CUP non presente in REGIS	
51	C991200101001	M2	C4 Inv. 2.2	RESILIENZA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI MANUFATTI EDIFICI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI - CVA 2.1 EDIFICI	210.000,00	140.000,00 €								AVVANTO		15/07/2023		CUP non presente in REGIS	
51	C991200102001	M2	C4 Inv. 2.2	RESILIENZA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI MANUFATTI EDIFICI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI - CVA COLLETTINA	210.000,00	140.000,00 €								AVVANTO		15/07/2024		CUP non presente in REGIS	
51	C991200103005	M5	C1 Inv. 2.3	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	200.000,00				181.702,62 €					AVVANTO		01/09/2023	01/09/2025		
51	C991200110001	M5	C1 Inv. 2.3	CENTRO VITA ASSOCIATA	950.000,00				8.088,21 €					AVVANTO		15/07/2021	15/07/2024		
51	C991200105001	M5	C1 Inv. 2.3	ASR DELLE CENTRALITÀ	3.000.000,00									AVVANTO		15/07/2021	31/12/2025		
51	C991200105001	M5	C1 Inv. 2.3	ACCESSIBILITÀ STAZIONE	799.880,00				12.655,56 €					AVVANTO		15/07/2021	31/07/2025		
51	C991200105001	M2	C4 Inv. 2.2	RESILIENZA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI MANUFATTI EDIFICI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI - CVA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON	39.880,00									AVVANTO		04/08/2021	27/12/2021		



COMUNE DI PERUGIA\_aggiornamento

SCUOTE ATTUATE PNR (S/N)	CUP	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MODERNI COMPONENTI	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTATO PRESIDENTE (S/N)	IMPETRO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	RIFIUTI ASSENTI AL 31/12/2022	PACAMENTI ESPOSTI A VALERE SU BANCHE PNR AL NETTO IVA AL 30/06/2022	PACAMENTI ESPOSTI A VALERE SU ALTRE BANCHE AL 31/12/2022	PROGETTO FINANZIATO/AVVIO	FASI PROCEDURALI	TEMINI ULTIMO PREVISSO	RETIRO DEL TERMINE (S/N)	ATTIVITA' RELATIVA A BCS	DATA FINALE	NOTE	
				da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		da compilare in caso di spesa affermata nella colonna precedente		
SI	CUP171000810006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI Covid19 (Primo 2022)	C1pw.1.1	Misure 1.1.1	203.850,00		- €	AVVANTO					AVVANTO	INSTRUMENTO CIP	24/12/2022 SI			24/02/2024		
SI	044020000006	SOSTEGNO CAPACITA' AGIDORIALE E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI PROGETTO APPI	C21-pw.1.1		211.900,00		- €	AVVANTO					AVVANTO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA, PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	15/07/2023 04/09/2023 30/09/2023 30/06/2024			15/07/2026		
SI	044020000006	PROCEDE DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' MILDIA PERILONGO PERIODO DOGIBUAI			297.306,60		- €	AVVANTO					AVVANTO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	17/07/2023					
SI	044020000006	PROCEDE DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' MILDIA PERILONGO PERIODO DOGIBUAI	C21-pw.1.2		2460.000,00		- €	NON AVVANTO					NON AVVANTO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	30/06/2024			30/06/2026		
SI	044020000006	AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-PROGETTI DIFFUSI PER FAMIGLIE			209.906,20		- €	NON AVVANTO					NON AVVANTO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	29/06/2023			15/07/2026		
SI	044020000006	INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CON AFFIDAMENTO OPERAZIONI LOCALI IN CAPO A SUPERVISIONE DEL PERSONALE DI SERVIZI SOCIALI	C2pw.2.3		500.000,00		- €	AVVANTO					AVVANTO	PRE PARCATO DI AFFIDAMENTO TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	30/06/2023 30/07/2023 15/09/2023			31/12/2024		
SI	090100000001	PROGRAMMA LOTTE BUIE-AQUISIZIONE DI LETTERE ALBIRTA A TP			340.000,00		- €	AVVANTO					AVVANTO	PITE PROGETTO DI AFFIDAMENTO TECNICO ECONOMICO, PROGETTO DEFINITIVO, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	13/03/2023 SI			30/09/2024		
SI	044020000006	ECO-SCHOOL			1500.000,00		- €	AVVANTO		30723,04 €			AVVANTO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023			30/09/2025		
SI	044020000001	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA			60.000,00		- €	AVVANTO					AVVANTO	PITE PROGETTO DI AFFIDAMENTO TECNICO ECONOMICO, PROGETTO DEFINITIVO, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	31/07/2023 SI			31/12/2024		
SI	044020000001	PARTI CIRCULARI			2.700.000,00		270.000,00	AVVANTO		202.268,00 €			AVVANTO	PROGETTO DEFINITIVO, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	14/12/2022 NO			31/12/2025		COMPLIATA IN DATA 17/12/2022 - Si tratta di somministrazione di servizi di pulizia e manutenzione appalto integrato a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi
SI	044020000001	SISTEMI DI COMPLESSIONE WIFI			86.711.342,79		19.471.682,59	AVVANTO			31.000,00 MANDATO N. 2022/2021 4.488,11 MANDATO N. 2022/2021 1.000,00 MANDATO N. 2022/2021 1.311,79 MANDATO N. 2022/2021		AVVANTO	PITE PROGETTO DI AFFIDAMENTO TECNICO ECONOMICO, PROGETTO DEFINITIVO, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, SELEZIONE FORNITURA, COLLAUDO	15/01/2023 SI			28/07/2025		
SI	044020000001	CENTRO INFANZIA CASE BRUCIATE IN DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			3.719.000,00		- €	NON AVVANTO					NON AVVANTO	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PITE MANUFATTO	15/01/2023 SI			15/07/2026		
SI	044020000001	IFE BUS RAPID TRANSIT			3719.000,00		- €	NON AVVANTO					NON AVVANTO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COLLAUDO	26/07/2023 NO					
SI	044020000006	DEMOLIZIONE SCUOLE SAMARA ROSA E. MARTINO IN CAMPI FRAGOLI SCUOLA S.M. IN CAMPO			1.200.000,00		- €	AVVANTO					AVVANTO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COLLAUDO	29/10/2023 NO			30/09/2024		
SI	044020000001	RETE DI OTTE BUCHE PER LE ATTIVAZIONI AUTOBUS/LETTRICI					- €	AVVANTO					AVVANTO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COLLAUDO	30/09/2023 NO			01/03/2024		



Stato	Codice	Descrizione	Condizione	Cod. Prov.	Importo	Cond. Prov.	Cond. Comunale	Data Inizio	Data Fine	Descrizione Lavori		
SI	013100010001	OCIOVE URBANE		M2	2.634.463,00	CE Inv. 4.1.2			AVVANTO	COLLAUDO	31/12/2024	30/04/2024
SI	013200010006	ABBITAZIONE A COVID PER LE PA LOCALI		M1	1.031.574,00	CE Inv. 1.2			AVVANTO	INSEDIAMENTO CUP	28/06/2023	24/02/2025
SI	011000010005	RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMAN-PIRENTI DI MESA IN SICILIA PER ADEGUAMENTO AL FINE DELLE PREVISIONI INCENDI DEL CIV. S. SANTIARBELO	SI	M2	30.000,00	CE Inv. 2.2			AVVANTO	COMPILAZIONE DELL'ATTIVITA'	21/07/2023	
SI	011000010005	RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMAN-PIRENTI DI MESA IN SICILIA PER ADEGUAMENTO AL FINE DELLE PREVISIONI INCENDI DEL CIV. S. SANTIARBELO	SI	M2	86.800,00	CE Inv. 2.2			AVVANTO	PRESTAZIONE ESECUTIVA	06/08/2023	30/06/2023
SI	011000010001	RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMAN-PIRENTI DI MESA IN SICILIA PER ADEGUAMENTO AL FINE DELLE PREVISIONI INCENDI DEL CIV. S. SANTIARBELO	SI	M2	110.000,00	CE Inv. 2.2			AVVANTO	PRESTAZIONE ESECUTIVA	06/08/2023	30/06/2023
SI	011000010001	RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMAN-PIRENTI DI MESA IN SICILIA PER ADEGUAMENTO AL FINE DELLE PREVISIONI INCENDI DEL CIV. S. SANTIARBELO	SI	M2	47.000,00	CE Inv. 2.2			AVVANTO	PRESTAZIONE ESECUTIVA	06/08/2023	30/06/2023
SI	011000010005	RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMAN-PIRENTI DI MESA IN SICILIA PER ADEGUAMENTO AL FINE DELLE PREVISIONI INCENDI DEL CIV. S. SANTIARBELO	SI	M2	77.777,00	CE Inv. 2.2			AVVANTO	PRESTAZIONE ESECUTIVA	06/08/2023	30/06/2023
SI	011200000006	AZIONI IRRP ID		M1	30.000,00	CE Inv. 1.4.3			AVVANTO	INSEDIAMENTO CUP	08/08/2023	08/08/2023
SI	011200000006	ESTENSIONE DELL'USO DELLE PARTECIPAZIONI NAZIONALI DI CENTRA DIGITALE - IPO OCE		M1	14.000,00	CE Inv. 1.4.4			AVVANTO	INSEDIAMENTO CUP	08/09/2023	08/09/2023
SI	011200000006	ESPERIENZA DEL CITTADINO		M1	516.523,00	Misura 1.4.1			AVVANTO	INSEDIAMENTO CUP	14/06/2023	14/06/2024
SI	011200000006	PARTICIPAZIONI DIGITALI		M1	69.000,00	Misura 1.4.5			AVVANTO	INSEDIAMENTO CUP	18/12/2023	24/09/2023
SI	011200000006	AZIONI PATTO MURAZIA		M1	82.400,00	Misura 1.4.3			AVVANTO	INSEDIAMENTO CUP	29/09/2023	14/09/2024
SI	011200000001	OCIOVE URBANE		M2	888.372,51	CE Inv. 4.1.2			AVVANTO	COMPILAZIONE DELL'ATTIVITA'	04/08/2023	31/12/2023
SI	012000100001	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TORRE DELLA CARITA' E RIQUALIF. PERCORSO VILLA PIETRO		M5	4.180.000,00	CE Inv. 2.1			AVVANTO	AGGIORNAMENTO ESECUTIVA	31/07/2023	31/07/2023
SI	012000100001	RECUPERO PERICOLOSI MOULINO DAL CANTINALE AL PONTE PANTALI. PORTI FELICIS. VILLA PIETRO, P. S. GIORD.		M5	330.000,00	CE Inv. 2.1			AVVANTO	AGGIORNAMENTO ESECUTIVA	15/06/2023	15/06/2023
SI	012000100001	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DELLA VIA S. S. FRANCESCO		M5	600.000,00	CE Inv. 2.1			AVVANTO	AGGIORNAMENTO ESECUTIVA	25/09/2023	15/09/2026
SI	012000100001	POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DI CALCIO		M5	530.000,00	CE Inv. 2.1			AVVANTO	AGGIORNAMENTO ESECUTIVA	31/07/2023	31/07/2023
SI	014000000006	PERICOLOSO DEL CANTONALE DI S. PIETRO		M4	300.000,00	CE Inv. 1.3			AVVANTO	PRESTAZIONE ESECUTIVA	14/06/2023	14/06/2026



	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
	SI	0991000180005	M5	CE7m-2.3	300.000,00		118.702,61 €	AVVANTO	31/12/2024
	SI	0991000110001	M5	CE7m-2.3	600.000,00		8.088,23 €	AVVANTO	31/12/2024
	SI	0991000150001	M5	CE7m-2.3	3.000.000,00			AVVANTO	31/12/2025
	SI	0991000170001	M5	CE7m-2.3	799.800,00		12.655,94 €	AVVANTO	31/07/2025
	SI	0991000190001	M4	CE7m-2.2	39.800,00	SI		AVVANTO	27/12/2021
	SI	0991000200006	M4	CE7m-3.3	1.035.000,00			NON AVVANTO	30/09/2026
	NO	0991000200001	M5	CE7m-2.3	565.507,76			AVVANTO	30/09/2025
	NO	0991000200001	M5	CE7m-2.3	1.071.100,00			AVVANTO	30/09/2025
	NO	0991000200006	M5	CE7m-2.3	14.484.412,51	3.477.703,14		AVVANTO	31/12/2025
	NO	0991000200001	M5	CE7m-2.3	1.800.000,00	393.532,42		AVVANTO	14/11/2024 \

COMUNE DI TERNI

SOGETTO ATTUATORE PNRR (S1/NO)	CEP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURNE COMPLESSIVE ENTE	INIZIO FINANZIAMENTO DAL PNRR (euro)	INIZIO FINANZIAMENTO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTAZIONE (S1/NO)	INIZIO FINANZIAMENTO PRECEDENTE (euro)	MISURNE ASSUNTI SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	VALORI SU RESORSE PNRR AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NO NAVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESERVOIR DEL TERMINE (S1/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGPS	NOTE
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	40.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	A1) COSTITUZIONE O RAFFORZAMENTO DI EQUIPE DAL 3° TRIMESTRE 2022 E 1° TRIMESTRE 2023;	A1) PREVISTO 1° TRIMESTRE 2023;	A1) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	1) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 04/10/2022; 2) DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.2 N. 823 DEL 24/03/2023; 3) COSTITUZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE CON DD 3285 DEL 29/11/2022; 4) AVVISO PUBBLICO PNRR MSC2 PER ACCESSO AI SERVIZI RELATIVI ALLA LINEA "Percorsi di autonomia e inclusione sociale" in data 02/12/2022; 5) SIDA BICHIESTA EROGAZIONE RISORSE per interventi finalizzati nell'ambito della Missione 5-Componente 2 - Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità ed avvio attività del 1/12/2022 con prot. n.191752 del 03/12/2022;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	A2) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PERIODO 4 TRIMESTRE 2022 - DAL 1 AL 3 TRIMESTRE 2023 - DAL 2 AL 4 TRIMESTRE 2024 - DAL 4 TRIMESTRE 2025 - E 1-2 TRIMESTRE 2026;	A2) PREVISTO NEL PERIODO 2 TRIMESTRE 2026;	A2) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	15.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	A3) PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PERIODO 4 TRIMESTRE 2022 - DAL 1 AL 3 TRIMESTRE 2023 - DAL 2 AL 4 TRIMESTRE 2024 - E 1-2 TRIMESTRE 2026;	A3) PREVISTO NEL PERIODO 1 TRIMESTRE 2026;	A3) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	60.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	A4) SOSTEGNO PERIODO DAL 1° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026;	A4) PREVISTO NEL PERIODO 2 TRIMESTRE 2026;	A4) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	B1) RIFERIMENTO ALLOGGI PERIODO 1-2 TRIMESTRE 2023;	B1) PREVISTO NEL PERIODO 2 TRIMESTRE 2023;	B1) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Individuali alloggi di proprietà comunale e valutazione immobili ATER
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	150.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	B2) RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE PERIODO ANNO 2023;	B2) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2023;	B2) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	150.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	B3) ADATTAMENTO E DOTAZIONE ANCHE ABITAZIONI PERIODO ANNO 2023;	B3) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2023;	B3) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	120.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	B4) ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI E A DISTANZA DAL 2° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026;	B4) PREVISTO NEL 2° TRIMESTRE 2026;	B4) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	60.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	C1) FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA DAL 3° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026;	C1) PREVISTO NEL 2° TRIMESTRE 2026;	C1) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	120.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	C2) COLLEGAMENTO CON ENTI E AGENZIE DEL TERRITORIO PER TIROCINI FORMATIVI DAL 3° TRIMESTRE 2023 AL 2° TRIMESTRE 2026;	C2) PREVISTO NEL 2° TRIMESTRE DEL 2026;	C2) S1;	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;
SI	F44H2200460006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO);	5	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	SI	A1) SUPERVISORIO PROFESSIONALE DI GRUPPO periodo dal 1° trimestre 2023 al 4° trimestre 2025;	A1) PREVISTO NEL PERIODO 4° TRIMESTRE 2025;	A1) S1	data convenzione 31/03/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate durante l'iter procedurale	1) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/11/2022; 2) DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.1.4 N. 822 DEL 24/03/2023;

SI	F14H2200470006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI;	5	2	1.1.4	53.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	A3) SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE PERIODO DAL 1 TRIMESTRE 2023 AL 4 TRIMESTRE 2025;	A2) PREVISTO NEL PERIODO 4 TRIMESTRE 2025;	A2) SI	data convenzione 31/03/2026	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;	
SI	F14H2200470006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI;	5	2	1.1.4	59.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	A3) SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025;	A3) PREVISTO PER IL PERIODO NEL 4 TRIMESTRE 2025;	A3) SI	data convenzione 31/03/2026	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;	
SI	F14H2200470006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI;	5	2	1.1.4	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	A1) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E TELESCORSO; PASTI A DOMICILIO; ASSISTENZA TUTELARE INTEGRATIVA PREVISTI NEGLI ANNI 2023-2024-2025 E FINO AL 30/06/2026	A1) PREVISTO NEL 2 TRIMESTRE 2026	A1) SI;	data convenzione 31/03/2026	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;	1) DETERMINA DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.1.3 N. 822 DEL 24/03/2023; 2) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28/04/2023;
SI	F44H2200470006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI;	5	2	1.1.3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	A2) FORMAZIONE SPECIFICA OPERATORI PREVISTA NEL 1 E 4 TRIMESTRE 2024	A2) PREVISTO NEL 4 TRIMESTRE 2024	A2) SI;	data convenzione 31/03/2026	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;	
SI	F44H2200470006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI;	5	2	1.1.3	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	A1) SUPERVISIONE PROFESSIONALE DI GRUPPO periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; A2) SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; A3) SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DI EQUIPE	A1) NO A2) NO A3) NO TARGET BENEFICIARI 77 periodo 1 trimestre 2023; IN CORSO		data convenzione 31/03/2026	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;	
SI	F14H2200470006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI; RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI;	5	2	1.1.4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	A1) SUPERVISIONE PROFESSIONALE DI GRUPPO periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; A2) SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE periodo dal 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; A3) SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA DI EQUIPE	A1) PREVISTO PER IL PERIODO da 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; A2) PREVISTO PER IL PERIODO da 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; A3) PREVISTO PER IL PERIODO da 1 trimestre 2023 al 4 trimestre 2025; TARGET BENEFICIARI 77 periodo 1 trimestre 2023;	A1) NO A2) NO A3) NO TARGET BENEFICIARI 77 periodo 1 trimestre 2023; IN CORSO	data convenzione 31/03/2026	Allo stato attuale, limitatamente alle informazioni inserite sulla piattaforma, non si evidenziano particolari criticità. Gli uffici scriventi si riservano di segnalare eventuali criticità che dovessero manifestarsi durante l'inserimento dei dati;	1) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/11/2022; 2) DETERMINA DI ACCERTAMENTO RISORSE PNRR LINEA INTERVENTO 1.1.4 N. 822 DEL 24/03/2023;

COMUNE DI TERNI\_aggiornamento n. 1

SOGGETTO ATTUATORI FNR (S/N)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DALL'UNIONE (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PRELIMINARE (S/N)	IMPORTO PRELIMINARE FINANZIATO (euro)	DA COMPLETARE IN CASO DI RISPOSTA AFFIRMATIVA NELLA COLONNA PRECEDENTE	MTC/CON ASSI/NTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRI FONDI AL 31/12/2022	AVVANTO AVANZO/NON AVANZO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISULTATO DEL TRAMITO (S/N)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA MGS	NOTE
SI	4412200170006	Attivazione e configurazione di n. 50 servizi digitali H2EApp ID	1	1	1.4.3	54.955,00€	0,00€	0,00€	NO					AVVANTO	INSEGNAMENTO CUP	31/09/2022	SI			
															CONTATTI/REALIZZAZIONE DEL FORNITORE	03/09/2023	SI			
															COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL Soggetto Attuatore SA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTT) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifiche di conformità tecnica e approvazione del DTE, documenti di erogazione del finanziamento del SA)	29/02/2024	SI	29/02/2024	n/a ( per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNET@DUE" )	
SI	4412200200006	Attivazione di n. 2 servizi di notifiche digitali integrazione con la piattaforma oristica digitale	1	1	1.4.5	69.000,00€	0,00€	0,00€	NO					AVVANTO	INSEGNAMENTO CUP	14/10/2022	SI			
															CONTATTI/REALIZZAZIONE DEL FORNITORE	31/09/2023	SI			
															COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL Soggetto Attuatore SA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTT) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifiche di conformità tecnica e approvazione del DTE, documenti di erogazione del finanziamento del SA)	27/12/2023	SI	27/12/2023	n/a ( per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNET@DUE" )	
SI	4412200300006	Realizzazione di interventi di miglioramento del sito web istituzionale e attivazione di n. 50 servizi digitali per il cittadino	1	1	1.4.1	513.320,00€	0,00€	0,00€	NO					AVVANTO	INSEGNAMENTO CUP	13/12/2022	SI			
															CONTATTI/REALIZZAZIONE DEL FORNITORE	31/09/2023	SI			
															COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL Soggetto Attuatore SA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTT) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifiche di conformità tecnica e approvazione del DTE, documenti di erogazione del finanziamento del SA)	24/09/2024	SI	24/09/2024	n/a ( per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNET@DUE" )	
SI	4412200050006	Implementazione del Piano di migrazione al cloud per n. 201 server	1	1	1.2	1.003.880,00€	0,00€	0,00€	NO					AVVANTO	INSEGNAMENTO CUP	21/02/2023	SI			
															CONTATTI/REALIZZAZIONE DEL FORNITORE	02/09/2024	SI			
															COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA IN SCRIBO INFORMATICO DI INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL Soggetto Attuatore SA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTT) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifiche di conformità tecnica e approvazione del DTE, documenti di erogazione del finanziamento del SA)	24/09/2025	SI	24/09/2025	n/a ( per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la Piattaforma "MAGNET@DUE" )	

OGGETTO ATTIVITÀ/FINIS (1/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURONE	COMPONENTE MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL FONDO (€)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (€)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (€)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (€)	PROGETTO PRESENTIVO (SI/NO)	MOVIMENTO PRESENTIVAMENTE FINANZIATO (€)	MOVIMENTO PRESENTIVAMENTE FINANZIATO (€)	IMPENGI ASSENTI AL 31/12/2022	IMPEGNI PRESENTIVI A VALERE SU ALTRI FONDI AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	INDICARE PER OGNI FASE PROCEDURALE PRESENTIVA DAL MOMENTO IN SUCCESSO, PER OGNI FASE PROCEDURALE PRESENTIVA DAL MOMENTO IN SUCCESSO	TERMINI ULTIMO PREVISTO	REPETIBILE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITÀ RELATIVE A BCG5	NFE
SI	F41F200076006	Attivazione e configurazione di n. 30 server digitali (server)	1	1.4.3	54.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					AVVIATO	INERIMENTO CUP	Indicare in successiva, per ogni fase procedurale prevista dal documento di programmazione	10/09/2022	SI		Indicare eventuali criticità riscontrate	
															CONTRATTUALIZZAZIONE DEL CONTRATTO		03/09/2023	SI			
															COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, percolata in cambio istruzione di informazioni tra Soggetto Attore (SA) e Dipartimento per la trasformazione digitale (DTG) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifica di conformità tecnica e assicurativa del DTG, domanda di erogazione del finanziamento del SA)		29/02/2024	SI		NO (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poli@2025")	
SI	F41F200090006	Attivazione di n. 2 server di middle ware e integrazione con la piattaforma nucleare digitale	1	1.4.5	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					AVVIATO	INERIMENTO CUP		14/02/2022	SI			
															CONTRATTUALIZZAZIONE DEL CONTRATTO		10/09/2023	SI			
															COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, percolata in cambio istruzione di informazioni tra Soggetto Attore (SA) e Dipartimento per la trasformazione digitale (DTG) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifica di conformità tecnica e assicurativa del DTG, domanda di erogazione del finanziamento del SA)		27/02/2023	SI		NO (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poli@2025")	
SI	F41F200087006	Realizzazione di interventi di manutenzione del sito web istituzionale e attivazione di n. 6 server digitali per il cloud	1	1.4.1	538.323,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					AVVIATO	INERIMENTO CUP		13/11/2022	SI			
															CONTRATTUALIZZAZIONE DEL CONTRATTO		10/09/2023	SI			
															COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, percolata in cambio istruzione di informazioni tra Soggetto Attore (SA) e Dipartimento per la trasformazione digitale (DTG) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifica di conformità tecnica e assicurativa del DTG, domanda di erogazione del finanziamento del SA)		24/09/2024	SI		NO (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poli@2025")	
SI	F41F200000006	Implementazione di un Piano di migrazione al cloud per n. 20 server	1	1.2	1.033.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					AVVIATO	INERIMENTO CUP		21/02/2023	SI			
															CONTRATTUALIZZAZIONE DEL CONTRATTO		02/02/2024	SI			
															COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, percolata in cambio istruzione di informazioni tra Soggetto Attore (SA) e Dipartimento per la trasformazione digitale (DTG) (dichiarazione di completamento delle attività del SA, verifica di conformità tecnica e assicurativa del DTG, domanda di erogazione del finanziamento del SA)		24/09/2025	SI		NO (per gli interventi relativi alla transizione digitale il portale di riferimento è la piattaforma "Poli@2025")	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DALL'PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSIANTI AL VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/SON AVVIATO	FASI PROCEDURALI		TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISERVO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE ATTIVITA' RELATIVE A B.C.G.S.	NOTE	
														la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	da compilare in successione, per riga, procedurale dell'intero intervento					
(SI/NO)	(codice unico progetto)								(SI/NO)	da compilare in successione, per riga, procedurale dell'intero intervento	colonnare il termine ultimo per ogni fase procedurale dell'intero intervento	da compilare in successione, per riga, procedurale dell'intero intervento		da compilare in successione, per riga, procedurale dell'intero intervento				da compilare in successione, per riga, procedurale dell'intero intervento		
SI	G78H2200050001	REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELLA FRAZIONE PETRIGNANO	M4	C1	1.1	84.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	20,00 (Fondi Amministrazione Comunale)	107.340,48	NO	840.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	107.340,48		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	16/1/2023 SI					
SI	G78H2200050001	REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELLA FRAZIONE CASTELNUOVO	M4	C1	1.1	110.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)		107.816,28	NO	1.100.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	107.816,28		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	16/1/2023 SI					
SI	G75F22000160006	REALIZZAZIONE ASILO NIDO NELLA FRAZIONE RIVOTIORO	M4	C1	1.1	130.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)		91.078,15	NO	1.300.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	91.078,15		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	16/1/2023 SI					
SI	G79H2200040006	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, IMPIANATICA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA "F.FERNACCHI" DI PETRIGNANO	M4	C1	1.3	84.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)		65.032,67	NO	840.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	65.032,67		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	23/12/2022 SI					
SI	G75F2200040006	REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"	M4	C1	1.2	66.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)		51.049,55	NO	660.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	51.049,55		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	21/4/2023 SI					
SI	G73H22000110001	NUOVO POLO UNICO PUGILATO	M5	C3	3.1	400.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	20,00 (Fondi Amministrazione Comunale)	308.919,30	NO	4.000.000,00 (Fondo Opere Indifferibili)	308.919,30		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	7/3/2023 SI					
SI	G75F22000310001	"PALAZZO VALEMANI" INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE	M5	C2	2.1	3.450.000,00		0	NO	3.450.000,00	0		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	30/10/2024 SI					
SI	G77H20000940004	RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO "PATRIGNO D'ITALIA" - L146/2018 messa a sicurezza edifici periferico centro storico - VALE PATRIGNO D'ITALIA - Secondo Stralcio SOTTOPASSO FERROVIARIO	M2	C4	2.2	330.000,00		22.696,70	SI	1.000.000,00	25.106,91		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	7/7/2022 SI					
SI	G72G19000650004	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI S. ANNA (D.M. 14.01.2020 - Annualità 2022)	M2	C4	2.2			109.533,04	SI	130.000,00	109.533,04		AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	21/07/2022 SI					
SI	G75F22000800001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO STORICO "PATRIGNO D'ITALIA" (Decreto Capo Dipartimento Ministero dell'Interno del 30.03.2020)	M2	C4	2.2			128.331,13	SI	130.000,00	128.331,13		AVVIATO	INTERVENTO ULTIMATO	30/08/2023 SI					
SI	G71F22003240006	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	M1	C1	1.4.1	87682	0	0,00	NO		0,00		AVVIATO	FASE DA ULTIMARE	30/09/2023 SI					
SI	G71F22003240006	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	M1	C1	1.4.5	59966	0	0,00	NO		0,00		AVVIATO	FASE DA ULTIMARE	30/09/2023 SI					
SI	G71F22001700006	MISURA 1.4.3 "ADDOZIONE APP IoT"	M1	C1	1.4.3	20384	0	0,00	NO		0,00		AVVIATO	FASE DA ULTIMARE	30/09/2023 SI					
SI	G71G22000800006	ANNUALITÀ AL CLOUD PER LE PA LOCALI	M1	C1	1.2	252118	0	0,00	NO		0,00		AVVIATO	FASE DA ULTIMARE	30/09/2023 SI					



SI	G71F2201850006	MISURA 1.4.3 "ADDOZIONE PIATTAFORMA PAGOPIA"	C1	1.4.3	30957	0	No	0,00				AVVIATO	IN FASE DI REALIZZAZIONE	FASE DA ULTIMARE ENTRO IL 09/11/2023	SI	9/11/2023	sistema regis alimentato in automatico come da bando	
SI	69122000090006	RESTRUTTURAZIONE DI DUE APPARTAMENTI PER AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NELLA ZONA SOCIALE N. 3	MS	1.2	715000	0	NO	0,00	0	0	0	AVVIATO	INTERVENTO ULTIMATO SU APPARTAMENTI 3° PIANO. IL PROGETTO NELLA TOTALITA' DA CONCLUDERE ENTRO IL 2° TRIMESTRE 2026	NO	giu-23		DIFFICOLTA' A REPERIRE GLI APPARTAMENTI E I BENEFICIARI (DIVISO PER ZONE SOCIALE) PER IL 2° TRIMESTRE 2026. I BENEFICIARI USCITI IN DATA 17/02/2023 AL QUALE HANNO PARTECIPATO AD OGGI 2 PERSONE)	



SI	CS1F22001720006	Adozione identità digitale	Mi - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo	Mi.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.4	14.000,00								NON AVVIATO	Fase Contattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE Fase integrazione e interventi complementari: DA INIZIARE	28/07/2023 23/05/2024	23/05/2024	ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026	Le integrazioni sono state da eseguite antecedentemente all'avviso integrazione CE ricompresa nei termini de l'Avviso, resta da contrattualizzare ed attuare gli interventi complementari previsti dall'avviso stesso.
SI	CS1F22001800006	Adozione piattaforma PagoPA	Mi - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo	Mi.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3	27.315,00								AVVIATO	Fase Contattualizzazione con il fornitore: CONCLUSA Fase Migrazione e attivazione dei servizi: IN ITINERE	20/03/2023 11/11/2023	11/11/2023	ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026	
SI	CS1F22001300006	Piattaforma notifiche digitali	Mi - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo	Mi.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.5	59.966,00								AVVIATO	Fase Contattualizzazione con il fornitore: IN ITINERE Fase Attivazione servizi: DA INIZIARE	31/05/2023 27/11/2023	27/11/2023	ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026	
SI	CS1F22001320006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Mi - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo	Mi.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.1	280.932,00								NON AVVIATO	Fase Contattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE Fase Attivazione e Conclusione attività: DA INIZIARE	30/09/2023 24/09/2024	24/09/2024	ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026	
SI	CS1F22001770006	Piattaforma digitale nazionale dati	Mi - Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo	Mi.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.3.1	30.515,00								NON AVVIATO	Fase Contattualizzazione con il fornitore: DA INIZIARE Fase integrazione e attivazione dei servizi: DA INIZIARE	19/07/2023 15/01/2024	15/01/2024	ATTIVITA' ESPLETATA IN AUTOMATICO DALLA PIATTAFORMA PDIDIGITALE2026	

SCHEDA AZIENDA PUBB.	CIP	SINTESA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURE	COMPONENTI	MISURA	BIRCHIO FINANZIATO DAL PSC (euro)	MISURE FINANZIATE DA ALTRI FONDI (euro)	MISURE FINANZIATE DA ALTRE FONTI (euro)	MISURE ASSISTENZIALI (euro)	PAGAMENTI DIRETTAMENTE AVUTE DA FONDI (euro)	PROGETTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROROGHE AVANZAMENTO	FASCE PROGETTUALI	TIRATURA ULTIMO PREVEDI	SOSTITUIBILI TRAMITE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIA	NOTE
5	613002003000	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO	5	2	2.1	360.000,00	30.000,00	NO	0	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	24/12/2022 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002003400	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO	5	2	2.2	275.000,00	0,00	NO	€ 49.124,41	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	09/09/2022 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002003500	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.3	2.06.000,00	370.000,00	NO	0	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	18/07/2022 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002003600	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.4	1.400.000,00	370.000,00	NO	0	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	12/06/2022 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002003700	MARCIAPADI SU CORRIDORIO CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO	5	2	2.5	310.000,00	15.000,00	NO	€ 13.792,21	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002003800	STIPULAZIONE PRONOME AL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO	5	2	2.6	330.000,00	0,00	NO	€ 32.740,50	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002003900	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO	5	2	2.7	250.000,00	60.000,00	NO	0	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	18/07/2022 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002004000	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.8	365.000,00	300.000,00	NO	€ 31.703,38	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002004100	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.9	310.000,00	30.000,00	NO	0	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002004200	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.2	280.000,00	0,00	SI	€ 28.400,54	353.343,30	353.343,30	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	31/12/2022		
5	613002004300	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.2	150.000,00	0,00	SI	30.990,71	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002004400	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	2.2	150.000,00	0,00	NO	€ 14.745,56	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	31/12/2022	Finanziato dal Ministero di Regia (circa € 12.500.000) e dalla Regione (circa € 130.000.000)	
5	613002004500	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	1.1	10.541.000,00	0,00	NO	€ 48.153,52	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002004600	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	1.3	540.000,00	0,00	NO	€ 0,00	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		
5	613002004700	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIULIANO, LOCALITÀ DI SAN GIULIANO, MUNICIPIO DI S. GIULIANO	5	2	1.1	1.148.000,00	0,00	NO	0	0	0	AVVANTO	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA CANTIERE COLLEGAMENTO AL PARCOLE FORTI VARE COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONE DECRETI DI INTERVENZIONE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLAUDO	03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023 03/01/2023	SI	30/06/2026		



SOGGETTO ATTUATO PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO D'AL/PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A ICGIS	NOTE
SI	D33D21001690001	Abbuttimento delle barriere architettoniche e ampliamento impianti di pubblica illuminazione	2	4	2.2	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	Impegno 566 28/06/2021 € 63.608,84 Impegno 837 20/09/2021 € 185,00 Impegno 519 11/06/2021 € 2.320,35 Impegno 520 11/06/2021 € 30,00 Impegno 565 28/06/2021 € 61.501,11 Impegno 571 01/07/2021 € 1.200,00 Impegno 736 19/08/2021 € 313,25 Impegno 330 24/04/2020 € 2.245,86	- €	129.142,36 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo</li> <li>• Affidamento lavori</li> <li>• Collaudo (certificato di regolare esecuzione)</li> </ul>	20/05/2021 10/06/2021 28/06/2021 06/11/2021	SI SI SI SI	31/12/2022	indicare la fase procedurale in cui si trova il progetto e il termine ultimo di completamento dell'intervento	
SI	D32D19000150001	Ampliamento della rete di pubblica illuminazione	2	4	2.2	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	Impegno 331 24/04/2020 € 30,00 Impegno 404 04/05/2020 € 82.582,90 Impegno 1307 18/05/2020 € 35.782,48 Impegno 1308 18/11/2020 € 1.485,00 Impegno 406 12/05/2021 € 5.390,06 Impegno 457 24/05/2021 € 2.480,00 Impegno 329 27/04/2021 € 45.681,52	- €	129.996,36 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo e det. a contrarre</li> <li>• Affidamento lavori</li> <li>• Collaudo (certificato di regolare esecuzione)</li> </ul>	23/03/2020 09/04/2020 29/04/2020 23/10/2020	SI SI SI SI	31/12/2021		
SI	D33H19000670001	Messa in sicurezza dal rischio idraulico- idrogeologico	2	4	2.2	1.060.585,69 €	- €	1.060.585,69 €	Impegno 995 20/10/2021 € 2.364,36 Impegno 1150 24/11/2021 € 30,00 Impegno 1133 19/11/2021 € 2.625,00 Impegno 1216 03/12/2021 € 17.666,60 Impegno 1491 21/14/09/2022 € 375,00 Impegno 1491 21/10/03/2022 € 1.408,84 Impegno 1491 13/22/12/2022 € 813,74 Impegno 1492 128/02/2022 € 2.600,00 Impegno 1492 21/10/03/2022 € 143.774,66 Impegno 128 11/10/03/2022 € 11.056,96	- €	70.151,32 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo</li> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Affidamento lavori</li> </ul>	09/09/2020 02/12/2021 07/02/2022 07/03/2022	SI SI SI SI	31/09/2026		
SI	D37H19001720001	Messa in sicurezza di viabilità comunali	2	4	2.2	620.000,00 €	- €	620.000,00 €	Impegno 128 2/11/03/2022 € 375,00 Impegno 128 3/16/03/2022 € 562.893,65 Impegno 128 5/27/09/2022 € 29.908,58 Impegno 128 4/11/05/2022 € 9.653,88 Impegno 128 6/17/10/2022 € 5.346,00	- €	619.234,07 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo e det. a contrarre</li> <li>• Affidamento lavori</li> <li>• Collaudo (certificato di regolare esecuzione)</li> </ul>	06/09/2019 16/02/2022 14/03/2022 13/12/2022	SI SI SI SI	31/09/2026		
SI	D33D21004670001	Abbuttimento delle barriere architettoniche	2	4	2.2	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	Impegno 764 1/01/09/2021 € 2.228,65 Impegno 764 2/17/09/2021 € 61.122,00 Impegno 764 3/17/09/2021 € 30,00 Impegno 1494 2/31/12/2021 € 60.479,19 Impegno 1495 2/22/12/2022 € 3.932,41	- €	125.759,12 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo</li> <li>• Affidamento lavori</li> <li>• Collaudo (certificato di regolare esecuzione)</li> </ul>	19/08/2021 31/08/2021 16/09/2021 24/03/2022	SI SI SI SI	31/12/2022		
SI	D31D2000460001	Ampliamento della rete di pubblica illuminazione	2	4	2.2	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	Impegno 145 1/24/03/2022 € 1.856,64 Impegno 145 2/24/02/2022 € 30,00 Impegno 145 3/20/04/2022 € 117.532,84	- €	119.419,48 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo</li> <li>• Affidamento lavori</li> <li>• Collaudo (certificato di regolare esecuzione)</li> </ul>	24/03/2022 21/02/2022 19/04/2022 29/11/2022	SI SI SI SI	31/12/2023		
SI	D37H21001430001	Intervento di rigenerazione urbana Intervento di efficientamento energetico presso edifici scolastici	5	2	2.1	2.300.000,00 €	- €	- €	Impegno 548 del 09/06/2022 € 83.190,90 Impegno 549 del 09/06/2022 € 30,00 Impegno 1070 del 11/10/2022 € 4.270,00 Impegno 1428 1/19/12/2022 € 524,00 Impegno 1428 2/19/12/2022 € 16,00	- €	37.997,38 € AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica</li> <li>• Approvazione progetto definitivo</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo</li> <li>• Affidamento lavori</li> <li>• Collaudo (certificato di regolare esecuzione)</li> </ul>	18/05/2021 14/12/2022 07/03/2023 13/03/2023 18/04/2023	SI SI SI SI SI	31/09/2026		
SI	D34D22003770006	Efficientamento Energetico mediante interventi sulla pubblica illuminazione	2	4	2.2	130.000,00 €	- €	- €		- €							
NO	D31J2000330006	Bonifica sito ex Clerissi in loc. San Mariano	2	4	3.4	400.000,00 €	- €	- €		- €							Il soggetto attuatore è la Regione Umbria
SI	D31F2002020006	Misura 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" L'obiettivo finale è quello di fornire ai Comuni le risorse necessarie affidare ciascuno di essi disponga di una media di 50 servizi PagePa	1	1	1.4.3	12747	- €	1405			AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	28-22 ENTRO 5 GIORNI DALLI SI	SI			ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVERO ENTRO IL 20/03/2023 SI
												CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE					IN CORSO DA COMPLETARE ENTRO IL 10/08/2023
												ESECUZIONE ATTIVITA'					DA COMPLETARE ENTRO IL 10/08/2023
												CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED BROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD					10/08/2023

SI	D31F22001010006	1	1	1.4.4	14000						NO	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	ENTRO 5 GIORNI DALLI SI sfe-22 SI			
													ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 28/07/2023 SI				
													CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	IN CORSO DA COMPLETARE ENTRO IL 27/12/2023			
													ESECUZIONE ATTIVITA'	IN CORSO			
													CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD	DA COMPLETARE ENTRO IL 27/12/2023	27/12/2023		
SI	D31C22001120006	1	1	1.2	252118						NO	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	ENTRO 5 GIORNI DALLI SI lug-22 SI			
													ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 01/09/2023	IN CORSO			
													CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE				
													ESECUZIONE ATTIVITA'	DA COMPLETARE ENTRO IL 21/02/2025			
													CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD	DA COMPLETARE ENTRO IL 21/02/2025	21/02/2025		
SI	D31F22004060006	1	1	1.4.1	280932						NO	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	ENTRO 5 GIORNI DALLI SI nov-22 SI			

SI	D31FZ200350006		1	1	1.4.5	59966	NO	35136	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA	nov-22 'SI	24/09/2024						
<p>Misura 1.4.5  <b>"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"</b>                      L'obiettivo prioritario è quello di garantire un aumento dei comuni in grado di fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. La misura finanzia l'adesione e il collegamento dell'Ente alla Piattaforma Notifiche Digitali e l'integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di notifica</p>																		
<p>ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 30/09/2023 IN CORSO</p>																		
<p>CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE</p>																		
<p>DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024</p>																		
<p>ESECUZIONE ATTIVITA'</p>																		
<p>DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024</p>																		
<p>CONCLUSIONE ATTIVITA'</p>																		
<p>DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024</p>																		
<p>VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD</p>																		





SI	D31C220010006	Misura 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPD CE". L'obiettivo previsto è quello di raggiungere un numero di cittadini italiani con identità digitali valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale; La misura mira all'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale ai servizi dell'Ente; in particolare prevede integrazione di CE ai servizi comunali che già prevedono l'accesso con SPD	1	1	1.4.4	14000					NO	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	set-22 SI ENTRO 5 GIORNI DALLI SI				
														ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 28/07/2023 SI				
														IN CORSO DA COMPLETARE ENTRO IL 27/12/2023 IN CORSO				
														CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD	27/12/2023			
SI	D31C22001120006	Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": L'obiettivo finale è quello di portare alla migrazione di 12.464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti Cloud certificati. L'investimento mira a sostenere la migrazione della Pubblica Amministrazione verso servizi cloud qualificati, per garantire adeguati standard di affidabilità. Nello specifico il progetto prevede la migrazione in sicurezza delle applicazioni in cloud di 14 servizi comunali	1	1	1.2	252118					NO	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	lug-22 SI ENTRO 5 GIORNI DALLI SI				
														ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO OVVERO ENTRO IL 01/09/2023 IN CORSO				
														DA COMPLETARE ENTRO IL 21/02/2025				
														CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD	21/02/2025			
SI	D31C2200160006	Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI": L'obiettivo previsto è quello di migliorare la qualità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. L'investimento mira a sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni	1	1	1.4.1	280932					NO	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA INSERIMENTO DEL CUP	nov-22 SI ENTRO 5 GIORNI DALLI SI				

SI	03112200550006	1	1	1,4,5	59966	NO	35136	AVVIATO	PRESENTAZIONE CANDIDATURA	nov-23 SI	24/09/2024	ENTRO 9 MESI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO O VERO ENTRO IL 30/09/2023 IN CORSO		
	Misura 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI": L'obiettivo previsto è quello di garantire un aumento dei comuni in grado di fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. La misura finanzia l'adesione e il collegamento dell'Ente alla Piattaforma Notifiche Digitali e l'integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di notifica								CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE ESECUZIONE ATTIVITA' CONCLUSIONE ATTIVITA' VERIFICHE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MITD	DA COMPLETARE ENTRO IL 24/09/2024				

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/IN AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REQUIS	NOTE	
(S/NO)	(codice unico progetto)							(S/NO)	da compilare in caso di riposta affermativa nella colonna precedente					Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare il termine ultimo per il quale si è proceduto alla realizzazione dell'intervento			Indicare eventuali criticità riscontrate		
SI	657H2300140006	Migrazione del CED della PA verso ambienti cloud	M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali"	352.652,00 €	0,00 €	no												
SI	657H2300180006	Creazione di API e loro registrazione in PDND	M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	167.748,00 €	0,00 €	no							24/09/24					
SI	657F23003910006	Aggiornamento sito istituzionale per servizi on line a misura di cittadini	M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.4 "E-sperienza del cittadino nel territorio"	328.160,00 €	0,00 €	no												
SI	657F23003920006	Integrazione con la Piattaforma di Notifica Digitale (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore legale in uso presso il Comune	M1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali"	59.966,00 €	0,00 €	no							27/11/23					
SI	658183000470004	Messa in sicurezza e stabilizzazione strada comunale di Uppello (Legge 145/2018 - Misura di sicurezza del territorio)	M2: Involuzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	159.978,59 €	0,00 €	si	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AGGIUDICAZIONE	22/12/2022	SI	27/11/2023	la piattaforma risulta di non facile utilizzo. Non è di immediata comprensione anche per l'uso di terminologie prettamente contabili e non tecniche, che non agevolano l'inserimento dei relativi dati. Pluralità di piattaforme e sistemi di controllo che non utilizzano terminologie univoche per l'inserimento degli stessi dati.	Colonna G: è stato inserito la misura Investimento; Colonna I: inserito importo finanziamento complessivo dell'assegnazione delle somme per fondo opere affidabili assegnate nel 2023; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 139 della legge 145 del 30.12.2018.	
SI	658183000490004	Stadio Biscione lavori di efficientamento degli impianti, degli spogliatoi e dei locali dell'agriturata (Legge 160/2019 - Decreto crescita)	M2: Involuzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	36.609,78 €	0,00 €	si	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AGGIUDICAZIONE	15/09/2022	SI	31/12/2023	la piattaforma risulta di non facile utilizzo. Non è di immediata comprensione anche per l'uso di terminologie prettamente contabili e non tecniche, che non agevolano l'inserimento dei relativi dati. Pluralità di piattaforme e sistemi di controllo che non utilizzano terminologie univoche per l'inserimento degli stessi dati.	Colonna G: è stato inserito la misura Investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 139 della legge 145 del 30.12.2018.	
SI	658F23000900006	Edificio di proprietà comunale sito presso l'area dell'ex foro barocco: messa in sicurezza e ripristino piano barocco (Legge 160/2019 - Decreto crescita)	M2: Involuzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	83.550,00 €	0,00 €	si	83.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AGGIUDICAZIONE	15/09/2022	SI	31/12/2023	la piattaforma risulta di non facile utilizzo. Non è di immediata comprensione anche per l'uso di terminologie prettamente contabili e non tecniche, che non agevolano l'inserimento dei relativi dati. Pluralità di piattaforme e sistemi di controllo che non utilizzano terminologie univoche per l'inserimento degli stessi dati.	Colonna G: è stato inserito la misura Investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 139 della legge 145 del 30.12.2018.	
SI	658F23000900006	Edificio di proprietà comunale sito presso l'area dell'ex foro barocco: messa in sicurezza e ripristino piano barocco (Legge 160/2019 - Decreto crescita)	M2: Involuzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	41.140,30 €	0,00 €	si	42.000,00 €	41.140,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AGGIUDICAZIONE	15/09/2022	SI	31/12/2023	la piattaforma risulta di non facile utilizzo. Non è di immediata comprensione anche per l'uso di terminologie prettamente contabili e non tecniche, che non agevolano l'inserimento dei relativi dati. Pluralità di piattaforme e sistemi di controllo che non utilizzano terminologie univoche per l'inserimento degli stessi dati.	Colonna G: è stato inserito la misura Investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 139 della legge 145 del 30.12.2018.	
SI	658F23002020006	Asilo nido Raffaele Senio - demolizione e ricostruzione dell'edificio	M6: Istruzione e ricerca	C1: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	994.400,00 €	0,00 €	no												
SI	658F23002020006	Asilo nido Raffaele Senio - demolizione e ricostruzione dell'edificio	M6: Istruzione e ricerca	C1: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	1.026.080,00 €	0,00 €	si	932.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
SI	658F23002020006	Asilo nido Raffaele Senio - demolizione e ricostruzione dell'edificio	M6: Istruzione e ricerca	C1: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	903.930,70 €	0,00 €	si	820.937,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
SI	658F23003950006	Progetto parte del Parco dell'Aeroporto- Parco degli animali	M5: Inclusione e Gestione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	1.099.890,00 €	0,00 €	si	999.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
SI	658F2300460001	Parco fiume Toppio	M5: Inclusione e Gestione	C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	1.089.000,00 €	0,00 €	si	990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							

SOGGETTO ATTUATORE	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU RISORSE AL TRE ALRE AVVIATO/NON AVVIATO	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RISGS	NOTE
(S/NO)	(codice unico progetto)																
SI	6602201676001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	1.070.410,00 €	0,00 €	973.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 21/06/2021 2) 11/06/2023 3) 10/06/2023 4) 30/07/2023 5) 30/07/2023 6) 30/09/2025 7) 30/09/2025	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	30/09/2026	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	6602201673001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	1.092.300,00 €	0,00 €	993.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		
SI	6602201655001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	880.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	661821003650001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	958.100,00 €	0,00 €	871.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	661821003670001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	804.550,00 €	0,00 €	731.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	661821003680001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	1.094.500,00 €	0,00 €	995.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	66C72001090001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	1.2.1: rigenerazione urbana	533.500,00 €	0,00 €	485.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	644H2000230001	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Sotto-componente I: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	211.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	644H2000220006	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Sotto-componente I: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;
SI	644H2000210005	M5: Inclusionione e Gestione	C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Sotto-componente I: Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	719.997,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale in cui si trova il progetto al termine ultimo di conclusione previsto	1) 10/07/2023 2) 30/07/2023 3) 30/09/2024 4) 31/09/2026	Indicare il termine per la realizzazione dell'intervento	31/09/2026		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna I: inserita la descrizione delle attività; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 160 del 27.12.2019;

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI SU RISORSE AL VALORE SU ALRE AVVIATO/NON AVVIATO 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RISGS	NOTE
(SI/NO)																		
SI	C44H22000220006	Cluster 2: intervento di realizzazione nuovo museo MAC di Colfiorito e palestra scuola media dentice - Foligno (PG) Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità MS: inclusione e Gestione	MIS: inclusione e Gestione	C2: infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore. Sotto componente 1: Servizi sociali disabilità e marginalità sociale	1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	329.989,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	A1 - 31.3.2026 A2 - 31.3.2026	A1-SI A2-SI	31.3.2026	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	C65F21000930001	Intervento messa in sicurezza copertura Palazzo delle Logge - Corso Cavour - Foligno (PG) M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	25.777,81 €	0,00 €	26.100,00 €	25.777,80 €	21.129,35 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/03/2023	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento Colonna I: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C65F21000930001	Intervento messa in sicurezza Copertura Palazzo delle Logge - Corso Cavour - Foligno (PG) M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	91.742,14 €	0,00 €	93.300,00 €	91.742,14 €	75.769,96 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/03/2023	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento Colonna I: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C65F21000930001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	93.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/12/2021	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C69H02000250001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DELLA GIOIELLI SITO IN VIA PIETRANTONI. M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/12/2021	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C65F21000920001	Lavori di risanamento delle murature al "cur" sito in via Oberdan e sede dell'Area Diritti di Cittadinanza M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	47.792,57 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/03/2022	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C65F21000920001	Intervento di messa in sicurezza copertura Scuola materna ed elementare di Colfiorito M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	37.449,62 €	0,00 €	38.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/12/2021	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C65F21000920001	Edificio comunale sede dell'Area diritti di cittadinanza via de' monasteri intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza impianto di riscaldamento M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	6.619,78 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/03/2023	SI	31/12/2022		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C66I2000390001	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54 M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONCLUSO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/03/2022	SI	31/12/2021		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C66I2000390001	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVALIERI N. 84 M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	39.700,00 €	0,00 €	39.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONCLUSO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	15/09/2020	SI	31/12/2021		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;
SI	C66I2000390001	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36 M2: evoluzione verde e transizione ecologica	M2: evoluzione verde e transizione ecologica	C4: tutela del territorio e della risorsa idrica	1.2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	44.800,00 €	0,00 €	44.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONCLUSO	Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione previsto	31/03/2022	SI	31/12/2021		Colonna G: è stato inserita la misura investimento; Colonna M: è stato inserito il finanziamento iniziale di cui all'art. 1 comma 29 della legge 150 del 27.12.2019;

SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DALL'INC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPNGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU VALERE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU VALERE SU AL TRE RESORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISERVO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE	
SI	GBR2200480006	TRASFERIMENTO MIDO FINANZIARIO "SERVIZIO" TRAMITE LA FONDAZIONE DI UNA PORZIONE DEL PULC.D.I.S. area	Missione 4	Componente 1	Investimento 1.1 "Piano per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"	830.000,00	613.000,00	0	0	0	0	PROGETTO AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	20/06/2023	SI	30/06/2026			
SI	GBR2000360006	AGGIORNAMENTO SIKAS ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ONELLI - II STRALCIO	Missione 4	Componente 1	Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche"	1.291.405,76	271.103,34	1.036.043,49 €				PROGETTO AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	31/05/2023	SI	30/06/2024		LA RENDICONTAZIONE E' STATA AVVIATA	
SI	GBR2000360005	ADGIUGNAMENTO SIKAS ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADOLE	Missione 4	Componente 1	Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche"	1.326.000,00	513.312,90	700.000,00 €				PROGETTO AVVIATO	GARA LAVORI	31/05/2023	SI	30/06/2026		DA CARICARE IL PROGETTO SU REGIS	
SI	GBR2201480001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL MATTatoio COMUNALE	Missione 2	Componente 4	Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	113.000,00	-	113.000,00											Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema Regis
SI	GBR2201470001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CASALINO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIELLA TASSA	Missione 2	Componente 4	Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	510.000,00	0	51.000,00											Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema Regis
SI	GBR2200050001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO COMUNALE	Missione 2	Componente 4	Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	86.700,00	-	86.700,00											Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema Regis
SI	GBR2200050001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO COMUNALE	Missione 2	Componente 4	Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	130.000,00	-	130.000,00											Il progetto PNRR è non attivo, pertanto i lavori relativi sono già conclusi e collaudati. Si procederà comunque alla rendicontazione sul sistema Regis
SI	GBR2200050001	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E EFFICIENTAMENTO TERMICO PRESSO IL CENTRO SERVIZI SANTO SPIRITO	Missione 2	Componente 4	Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	110.000,00	150.000,00	0		71.765,70		PROGETTO AVVIATO	COLLAUDATO	20/12/2022	SI	31/12/2023			Il CUP non risulta presente sul sistema Regis e non è pertanto possibile procedere alla rendicontazione
SI	GBR2200140005	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA 40 MARTIRI (TARGET MC.15400) MEDIANTE RIFACIMENTO PAVIMENTO E SOSTITUZIONE DEL MARMI BITUMINOSO CON PIETRA ARENARIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Missione 5	Componente 2	2.1 Rigenerazione Urbana	4.850.000,00	-	0				AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	30/07/2023	SI	31/03/2023			Il CUP non risulta presente sul sistema Regis e non è pertanto possibile procedere alla rendicontazione
SI	GBR2200140006	SOTTONO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Missione 5	Componente 2	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	211.500,00	-	-				PROGETTO AVVIATO	COSTITUZIONE EQUIPE - FORMAZIONE - ATTIVAZIONE DISPOSITIVI	PRIMO TRIMESTRE 2026	SI	PRIMO TRIMESTRE 2026			l'attività di rendicontazione non è ancora iniziata
SI	GBR2200040006	PERCORSO DI LUDICAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA'	Missione 5	Componente 2	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	715.000,00	-	-				PROGETTO AVVIATO	COSTITUZIONE EQUIPE - PREDISPOSIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI - ATTIVAZIONE PERCORSO LUDICO - REPERIMENTAZIONE ATTIVITA' LAVORO/FORMAZIONE E SFRUTTAMENTO COMPETENZE	QUARTO TRIMESTRE 2025	SI	QUARTO TRIMESTRE 2025			l'attività di rendicontazione sul sistema Regis non risulta
SI	GBR2200170006	APP. ID - SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE	1	4	MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP ID"	36.600,00	-	-				AVVIATO	AFFIDAMENTO EFFETTUATO, E' STATA AVVIATA LA FASE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	30/10/2023	SI	30/10/2023			Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis
SI	GBR2200170006	PIAGOTA "Scuola e Cittadinanza Digitale"	1	4	MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGODA"	72.840,00	-	-				AVVIATO	AFFIDAMENTO EFFETTUATO	31/10/2023	SI	30/10/2023			Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis
SI	GBR2200110006	Abilitazione al Cloud per le PA	1	2	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	252.118,00	-	-				NON AVVIATO			SI	01/06/2023			Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis
SI	GBR2200315006	Piattaforma notifiche digitali	1	4	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	59.866,00	-	-				AVVIATO	AFFIDAMENTO EFFETTUATO	29/06/2023	SI	29/06/2023			Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis
SI	GBR2200430006	Piattaforma Obiettivi Nazionali DMI	1	3	MISURA 1.4 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DMI"	30.515,00	-	-				NON AVVIATO			SI	29/06/2023			Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis

SI	G3122003B0006	Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici	1	4	MIGLIAIA DI ESPERIENZA DEL CITTADINO PUBBLICI	280.932,00	-	-	NO										30/09/2023	30/09/2023			Il progetto non è rendicontabile sul sistema Regis	La data fine è il termine ultimo per la presentazione del progetto (conoscenza presentata in sede di richiesta di ammissione a finanziamento in cui si prevedeva approvazione del progetto entro il 30/09/2022)
SI	G3122003I0006	Installazione ecobase informatica per la raccolta differenziata dei rifiuti	2	1	MOCCIA 1.1.1 Linea di intervento A "Miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani"	587.300,00													01/01/2024	01/01/2024	SI		Il progetto non è ancora rendicontabile sul sistema Regis	



SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTESI A DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPIEGNO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPIEGNO FINANZIATO DAL INC (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPICHI ASSUNTALI 31/12/2022	PAGAMENTI DIVERSI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DIVERSI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022	INSCRIZIONE AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO da compilare in base procedurale	RESPIETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA RGIS	NOTE
SI	J67H20001790001	Messa in sicurezza di alcune Viali della comunale di Piazze	M2	C4	12.2	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 14/10/2018 annualità 2021
SI	J63H10000400001	Adeguamento semaforico nodi	M2	C4	12.2	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 14/10/2018 annualità 2021 - scorrimento produttoria
SI	J63C100000100001	Interventi di manutenzione e delle infrastrutture a rete di Piazze Mazzini.	M2	C4	12.2	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 14/10/2018 annualità 2021 - scorrimento produttoria
SI	J61F20000300001	Efficientamento energetico Caviglioglio della Valle	M2	C4	12.2	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 16/02/2019 annualità 2020
SI	J61J20000200000	Interventi di manutenzione e delle infrastrutture a rete di Piazze Mazzini.	M2	C4	12.2	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 16/02/2019 annualità 2021
SI	J61D20001900006	Interventi di efficientamento energetico e delle infrastrutture a rete di Piazze Mazzini.	M2	C4	12.2	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 16/02/2019 annualità 2021
SI	J61D20001900006	Interventi di efficientamento energetico e delle infrastrutture a rete di Piazze Mazzini.	M2	C4	12.2	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Legge 16/02/2019 annualità 2021
SI	J61B20001590006	Realizzazione nuovo sistema di illuminazione pubblica di via Mazzini	M4	C1	11.2	301.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	D.M. Ministero In. Infrastr. n. 158 del 7/06/2022
SI	J64E21000630001	Regolazione urbana ex Tabacchisco Petroliferi di	M5	C2	12.1	5.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SI	J65B2000470006	Realizzazione e manutenzione di impianto sportivo in loc. Carrolio delle Terme.	M5	C3	11.1.1	770.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOGGETTO ATTUATORE PSNR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURONE	COMPONENTE	MISURA	MONTO FINANZIATO DAL PSNR (euro)	MONTO FINANZIATO DA ALTRE FONDI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE (SI/NO)	INVOCE PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI PERSENTI A VALERE SU RESERVA AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI PERSENTI A VALERE SU ALTRE RESERVE AL 31/12/2022	FINGIUSTO AVVIATO/ NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	REPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	#512200980006	Adozione piattaforma PAGOPA (APRILE 2022)	1.4.3	1	1.4.3	23.390,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	31/01/2023	SI	25/09/2023	REGIS NON PREVISTO	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento
SI	#512200490006	Adozione piattaforma PAGOPA (SETTEMBRE 2022)	1.4.3	1	1.4.3	24.533,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	REALIZZATO (VEDI NOTE)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	11/09/2023		08/09/2024	REGIS NON PREVISTO	SERVIZI ATTUATI IN PRECEDENZA A PAGAMENTI PERSENTI A VALERE SU ALTRE FONDI
SI	#512200100006	Adozione APP IO	1.4.3	1	1.4.3	17.350,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	AVVIATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	08/02/2023	SI	02/10/2023	REGIS NON PREVISTO	
SI	#512200940006	Adozione identità digitale SPID e CE	1.4.4	1	1.4.4	14.000,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	DA AVVIARE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	28/07/2023		23/09/2024	REGIS NON PREVISTO	DA UNA VERIFICA EFFETTUATA CON IL DIPARTIMENTO LA MISURA AL MOMENTO NON E' FINANZIABILE. AVVIATE PRATICHE DI RECESSO DA COMPLETARE
SI	#5122000490006	Abilitazioni ai cloud per le PA locali	1.2	1	1.2	121.992,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	DA AVVIARE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	03/06/2023		26/09/2024	REGIS NON PREVISTO	
SI	#512200830006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - REND	1.3.1	1	1.3.1	20.344,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	DA AVVIARE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	19/07/2023		15/02/2024	REGIS NON PREVISTO	
SI	#512200470006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.4.1	1	1.4.1	155.234,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	DA AVVIARE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	16/05/2023	NO	10/09/2024	REGIS NON PREVISTO	VERBA RICHIESTO POSTICOR PER L'AFFIDAMENTO
SI	#512200420006	Piattaforma Notifiche Digitali - PNO	1.4.5	1	1.4.5	32.889,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	DA AVVIARE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	31/05/2023		27/11/2023	REGIS NON PREVISTO	
NO	#913000450006	Reti di servizi di facilitazione digitale	1.7.2	1	1.7.2	127.695,00 €	- €	NO	- €	- €	- €	- €	DA AVVIARE	DNE ALL'AVVISO NON COMPETITIVO DELLA REGIONE LU	08/05/2023	SI	31/12/2026	REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO	L'ENTE E' SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFILE DELLA ZONA SOCIALE 4
													DA AVVIARE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	30/06/2023		31/12/2026	REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO	L'ENTE E' SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFILE DELLA ZONA SOCIALE 4
													DA AVVIARE	531 CITTADINI UNICI FORMATI (TARGET T1) - 796 SERVIZI EROGATI (TARGET T2) IBERITI ALL'ANNO	31/12/2023		31/12/2026	REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO	L'ENTE E' SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFILE DELLA ZONA SOCIALE 4
													DA AVVIARE	743 CITTADINI UNICI FORMATI (TARGET T1) - 1.115 SERVIZI EROGATI (TARGET T2) IBERITI ALL'ANNO 2024	31/12/2024		31/12/2026	REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO	L'ENTE E' SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFILE DELLA ZONA SOCIALE 4
													DA AVVIARE	849 CITTADINI UNICI FORMATI (TARGET T1) - 1.274 SERVIZI EROGATI (TARGET T2) IBERITI ALL'ANNO 2024	31/12/2025		31/12/2026	REGIS PREVISTO NON ANCORA AVVIATO	L'ENTE E' SOGGETTO SUB-ATTUATORE CAPOFILE DELLA ZONA SOCIALE 4



SI	B31B21009750001	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO VARIBUITA DI PRG COLLEGAMENTO TRA LAVIA TUDERTE E LA VIA CARTONESE	5	2	2.1	1.100.000,00 €	0	0	0	NO	0	54529,94	0	0	AVVIATO				27/04/2022 SI	31/03/2026
SI	B31B21009600001	RECLUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMUNALI PER SERVIZI CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN LIBERATO, COMPLESSO SPORTIVO SAN PAOLO	5	2	2.1	800.000,00 €	0	0	0	NO	0	0	0	0	AVVIATO				27/04/2022 SI	31/03/2026
SI	B31B21009710001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI CINGI COMUNALI	5	2	2.1	500.000,00 €	0	0	0	NO	0	0	0	0	AVVIATO				27/04/2022 SI	31/03/2026
SI	B31B21009700001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE PIAZZA GABRIARDI	5	2	2.1	500.000,00 €	0	0	0	NO	0	0	0	0	AVVIATO				27/04/2022 SI	31/03/2026
SI	B34J20040600001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE	1	3	1.3	300.000,00 €	0	120000	0	NO	0	377.086,71 €	0	0	AVVIATO				15/09/2022 SI	30/09/2024
SI	B35C2001500006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	4	2.2	90.000,00 €	0	0	0	SI	90000	8349,4	0	0	AVVIATO				15/09/2022 SI	31/12/2023
SI	B31B21009600001	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAME	4	1	3.3	803.000,00 €	0	0	0	NO	0	0	0	0	AVVIATO				31/12/2023	
SI	B31H19000600001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA LAQUER	4	1	3.3	330.000,00 €	0	0	0	NO	0	279521,86	150069,14	0	AVVIATO				23/06/2021 SI	30/06/2026
SI	B35E2001110006	NUOVA MENSA SCOLASTICA	4	1	1.2	607.200,00 €	0	0	0	NO	0	0	0	0	AVVIATO				30/04/2026	

SOGETTO ATTUATORE PNRR (S/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE (S/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	IMPENZI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R.G.S	NOTE
indicare per ogni fase procedurale la successione per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma indicare il termine ultimo di conclusione previsto da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente indicare per ogni fase procedurale la successione per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma																					
SI	144E21002090001	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER LE POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA PRESSO IL FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA IN ORVIEIO SCALO E MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO DEL VERDE PUBBLICO LIMITROFO	5	2	2.1	4.846.736,00	0,00	0,00	NO	16.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AVVIATO	PITE (PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA)	06/03/2023	SI	31/03/2026	COLONNA T - Impieghi 2022 con esigibilità 2022	
SI	124H2100250006	Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente i diversi ambiti di azione coinvolti attorno ai bisogni dei bambini che vivono in famiglie negligenti, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bambini, prima valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con parallela progettazione.	5	2	1.1.1 - rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà;	211.500,00	0,00	0,00	SI	31.250 euro (P.I.P.P.1.10) - 31.250 euro (P.I.P.P.1.9)		0,00	0,00	0,00	AVVIATO	Pre-implementazione / Implementazione / Post-implementazione	Pre-implementazione: 1° trimestre 2025 / Implementazione: 1° trimestre 2026 / Post-implementazione: 1° trimestre 2026	1° trimestre 2026	Comune di Orvieto Capofila Zona Sociale nr. 13	SI	
SI	142J21000340001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE IN ORVIEIO (TR) LOCALITA' LA SVOILTA.	2	4	INV.2.2	0,00	0,00	0,00	SI	130000	80.728,47	96.327,81	80.728,47	0,00	CONCLUSO	PROGETTAZIONE	24-ago-20	SI	24-ago-20	Trattasi di cd. "piccole opere" i cui contributi agli investimenti, previsti dall'art.1, c.29 e ss. della Legge n.160/2019, sono confluiti nella Missione 2 Componente 4 Inv.2.2 affidata al Ministero dell'Interno. L'importo del finanziamento annualità 2020 di euro 130.000,00 è stato attribuito con Decreto MIT 14 gennaio 2020 ed è stato erogato per l'intero importo di 130.000,00 (reversali n.r. 3489-3499 del 04/11/2020 e n. 3562-3563-3564 del 31/12/2020). L'importo IVA sui lavori è da versare e costituisce un costo per l'Ente.	
SI	14102100080001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE ESISTENTI DELLE CENTRALI TERMICHE CON NUOVI GENERATORI DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA L. BARZINI E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. SIGNORELLI, IN ORVIEIO (TR), PIAZZA MARCONI.	2	4	INV.2.2	0,00	0,00	0,00	SI	130.000,00	79.365,77	96.692,26	79.365,77	0,00	CONCLUSO	PROGETTAZIONE	11-set-21	SI	13-ago-21	Trattasi di cd. "piccole opere" i cui contributi agli investimenti, previsti dall'art.1, c.29 e ss. della Legge n.160/2019, sono confluiti nella Missione 2 Componente 4 Inv.2.2 affidata al Ministero dell'Interno. Il contributo annualità 2021 per complessivi euro 260.000 è stato concesso con assegnazione in prima istanza con Decreto MIT 14 gennaio 2020 ed è stato destinato al progetto identificato con il CUP 14102100080001, la seconda, quale contributo aggiuntivo, di euro 130.000 è avvenuta con Decreto MIT 11 novembre 2020. Per quest'ultimo ulteriore finanziamento non vi è alcun progetto né CUP come segnalato nella Scheda Progetto del Comune di Orvieto inviata con Pec ns. prot. n. 3057 del 25/01/2023 al supporto RT5 Perugia per il PNRR in sede di ricognizione PNRR Umbria piccole opere. L'rogazione del contributo è avvenuta per euro 130.000,00 reversali di incasso n.4212 del 15/07/2023 e l'importo IVA sui lavori è da versare e costituisce un costo per l'Ente -contabile.	
SI	14912000010006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA COLORI IN LOCALITA' SFERRACAVALLU, VIA TEVERE, ORVIEIO (TR).	4	1	INV.3.3	2.300.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE LAVORI AGGIUDICAZIONE LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE LAVORI COLLAUDO LAVORI	31-mar-23 15-set-23 30-nov-23 31-mar-26 30-giu-26	SI	31-mar-26		
SI	144H21000390001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DEL GRUPPO TERMICO DEL PALAZZO DEL POPOLO	2	4	1.2.2	€ 130.000,00	NO	NO	SI	€ 130.000,00	€ 129.905,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI FINE LAVORI/COLLAUDO	23.08.2022 15.09.2022 31.12.2022	SI	31.12.2022	L'intervento è stato erroneamente attribuito al Comune di Orvieto, è stato richiesto intervento di assistenza, problema ancora non risolto.	
SI	143I21000800001	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO MANCINELLI IN ORVIEIO	1	3	1	€ 383.000,00	NO	000,00 (Comune di Orvieto)	NO	€ 450.115,26	0,00	€ 14.560,00 oltre IVA	0,00	0,00	SI	ETAZIONE LIVELLO FATTIBILITA' TECNICO ECON PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI FINE LAVORI/COLLAUDO	18.03.2022 30.11.2022 30.12.2022 31.12.2023	SI	31.12.2023	Difficoltà acquisite in le credenziali per accedere al sistema di gestione del 2023 e non ancora attribuite. Questo impone al RUP di accelerare al sistema con il proprio agente e non poter incaricare di supporto e assistenza le attività di caricamento dei dati.	
SI	144021000800006	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PALAZZO NIGRONI DEL CENTRO STORICO E DEL PALAZZO DESTINATO A REGOLI UFFICI GIUDIZIARI	2	4	1.2.2	€ 130.000,00	NO	NO	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI FINE LAVORI/COLLAUDO	31.07.2023 15.09.2023 31.12.2023	SI	31.12.2023		
SI	141F21002400006	Adozione app ID - Comuni (Aprile 2022)	1	1	1.4.3	5.488,00			NO						NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE	02/05/2023	NO	26/01/2024		

SI	I41F2002400006	Adozione app IO - Comuni (Aprile 2022)	1	1	1.4.3	5.488,00														26/01/2024
SI	I41F2002400006	Adozione app IO - Comuni (Aprile 2022)	1	1	1.4.3	5.488,00														26/01/2024
SI	I41C2001270006	Abilitazione ai Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)	1	1	1.2	121.992,00														04/12/2024
SI	I41C2001270006	Abilitazione ai Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)	1	1	1.2	121.992,00														04/12/2024
SI	I41F2003560006	Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni (Settembre 2022)	1	1	1.4.5	32.589,00														27/11/2023
SI	I41F2003560006	Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni (Settembre 2022)	1	1	1.4.5	32.589,00														27/11/2023
SI	I41F2002360006	Adozione piattaforma pagoPA - Comuni (Aprile 2022)	1	1	1.4.3	9.427,00														31/01/2024
SI	I41F2002360006	Adozione piattaforma pagoPA - Comuni (Aprile 2022)	1	1	1.4.3	9.427,00														31/01/2024
SI	I41F2003330006	Esperienza del cittadino - Comuni (Settembre 2022)	1	1	1.4.1	155.234,00														24/09/2024
SI	I41F2003330006	Esperienza del cittadino - Comuni (Settembre 2022)	1	1	1.4.1	155.234,00														24/09/2024

COMUNE DI SPOLETO

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PSNR (S/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PSNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PRESENTENTE (S/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU RISORSE PSNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESISTITO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	B31F22003610006	Piattaforma Notifiche Digitali	1	1	1.4.5	59.966,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	31/05/2023	SI	27/11/2023		
SI	B31F22027220006	Adozione API/ID	1	1	1.4.3	36.400,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	08/09/2023	SI	30/01/2024		
SI	B31C22001640006	Adozione ZONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI	1	1	1.2	176.002,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	11/12/2023	SI	03/06/2025		
SI	B31F23000990006	Adozione PaginePA	1	1	1.4.3	52.800,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	30/09/2023	SI	26/06/2024		
SI	B31F22004480006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	1.4.1	286.932,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	30/09/2023	SI	24/09/2024		
SI	B31F22002730006	SPID CIE	1	1	1.4.4	14.000,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	29/12/2023	SI	20/09/2024		
SI	B31F22027280006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	1	1	1.3.1	30.515,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	19/07/2023	SI	15/01/2024		
NO	B3943000440006	RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	1	1	1.7.2	115.614,00 €			SI	250.000,00 €		0	0	NON AVVIATO	Struttura tecnica amministrativa volta a verificare la completezza, adeguatezza e conformità della documentazione prodotta in fase di presentazione del progetto.	20/05/2023	SI	31/12/2025		

COMUNE DI SPOLETO n.1

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PSNR (S/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PSNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE (S/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU RISORSE PSNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO per ogni fase procedurale	RESITTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	833F22003610006	Piattaforma Notifiche Digitali	1	1	1.4.5	59.966,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	31/05/2023	SI	27/11/2023		
SI	833F2202720006	Adozione API/ID	1	1	1.4.3	36.400,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	08/09/2023	SI	30/01/2024		
SI	833C22001640006	Adozione ONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI	1	1	1.2	176.002,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	11/12/2023	SI	03/06/2025		
SI	833F23000900006	Adozione PaperPA	1	1	1.4.3	52.800,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	30/09/2023	SI	26/06/2024		
SI	833F22004480006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	1.4.1	286.932,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	30/09/2023	SI	24/09/2024		
SI	833F22002700006	SPID CIE	1	1	1.4.4	14.000,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	29/12/2023	SI	20/09/2024		
SI	833F22027280006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	1	1	1.3.1	30.515,00 €			NO			0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON FORNITORE	19/07/2023	SI	15/01/2024		
NO	839430004400006	RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	1	1	1.7.2	115.614,00 €			SI	250.000,00 €		0	0	NON AVVIATO	Struttura tecnica amministrativa volta a verificare la completezza, adeguatezza e conformità della documentazione prodotta in fase di presentazione del progetto	20/05/2023	SI	31/12/2025		



COMUNE DI SPOLETO n. 2

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SOGGETTO A TUTTO/DEI PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MBLURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESSIONE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPICHI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEBITI A VALERE SU SO ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PRELUSO	RISPETTO DEI TERMINI (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
(S/NO)	(codice unico progetto)	<p>Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione del complesso monumentale di San Nicola, quale hub multifunzionale di carattere culturale e sociale; in particolare si vuole realizzare un centro polifunzionale di tipo "città in miniatura" con negozi, spettacoli (teatrali, cinematografici, multimediali ecc.), mostre, ristoranti, ecc. Un'ulteriore finalità del progetto è la valorizzazione della ricchezza del sistema turistico del territorio; a tal fine si ripete di rilevante importanza affiancare all'attività già svolta nel territorio "Città in Miniatura" (Città museo) e quella rappresentata dal Festival dei Due Comuni, la realizzazione di un centro polifunzionale del tipo "città in miniatura".</p> <p>La presente, porta beneficio riferiti alla missione 8, in quanto il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle strutture ricettive, la promozione del territorio, la qualificazione del personale e la commissione alle dotazioni strumentali disponibili e alla reversibilità degli arrondamenti; per questo motivo il progetto ha come obiettivo la riserva alla ricerca e all'applicazione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Analoga finalità del progetto è la realizzazione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate coerenti con la transizione digitale e di promozione del territorio, in quanto il progetto ha come obiettivo la promozione del territorio e la realizzazione del centro.</p>	8		82,2	€ 2.500.000,00			(S/NO)	da compilare in caso di risposta alternativa nella colonna precedente			NON AVVIATO	IL COMPENSO DELLA SALA DATTAGGIATA CON L'APPROVAZIONE DELL'ESECUTIVO DEL PROGETTO	36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO (ORDINANZA MINISTERIALE N. 27/04/2021)			indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento	indicare eventuali città di riferimento

COMUNE DI SPOLETO n. 3

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SOGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURA	COMPONENTE	MESIONE	IMPORTE FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTE FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTE FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PERSISTENTE	IMPORTE PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPRESI ASSINTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU PNRR AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU PNC AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R-GES	NOTE
SI	B33021018070001	Interventi di generazione urbana di spazi pubblici aperti nelle frazioni di Egge San Giacomo e Poeta	A3.1	3	5	0,00	954.787,50	0,00	NO	da verificare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	35.481,33		31.836,34		Avvato	Indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare il termine ultimo procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	Indicare eventuali criticità riscontrate	Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC
SI	B33021018070001	Interventi di generazione urbana di spazi pubblici aperti nelle frazioni di Egge San Giacomo	A3.1	3	5	0,00	810.597,50	0,00	NO		31.349,88		28.122,25		Avvato	Adempimento della Progettazione Affidazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori	31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 28/09/2023	SI SI SI -	31/03/2026		Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC

COMUNE DI SPOLETO n. 4

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONDI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R-GIS	NOTE
(SI/NO)	(codice unico progettato)								(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione per procedurale il termine ultimo di conclusione previsto dal cronoprogramma	da compilare in successione per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento		
SI	B31D2000100001	Intervento di efficientamento energetico con relamping della scuola primaria Le Pianciari	2	4	2.2.	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 45.375,73	Avvisto	Concluso		SI	31/02/2021	CUP non associato al RIUP	Economie € 25.433,37
SI	B38B2000022001	Messa in sicurezza mediante il rifacimento della copertura della scuola primaria Le Corone tempo pieno	2	4	2.2.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 39.956,75	Avvisto	Concluso	26/02/2021	SI	26/02/2021		Economie € 1.252,76
SI	B39J21013210001	Intervento di efficientamento energetico dell'impianto condizionamento Teatro Carlo Melisso	2	4	2.2.	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 79.247,19	Avvisto	Concluso	31/12/2022	SI	28/06/2022		Economie € 48.318,43
SI	B39J21013220001	Intervento di efficientamento energetico dell'impianto termico e dei corpi illuminanti del nido-infanzia San Giacomo e Iniziativa Moro	2	4	2.2.	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 4.354,80	Avvisto	Concluso	31/12/2022	SI	15/12/2022		
SI	B34H22001320006	Intervento di efficientamento energetico Palazzo Mauri - Palazzetto Sillani (foto A)	2	4	2.2.	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	NO		€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Avvisto	avvio lavori fine lavori	15/09/2022 31/12/2023	SI	31/12/2023		
SI	B39J22000220006	Requalificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza, anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della palestra scolastica situata all'interno di San Martino in Trignano	4	1	1.3	€ 576.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Avvisto	prerogative esecutive affidamento lavori avvio lavori fine lavori Collaudo lavori	31/08/2023 31/12/2023 31/03/2023 31/03/2026 30/06/2026				richiesta pre-assegnazione ulteriore 10% pari ad € 97.600,00
SI	B33J22000920005	Efficientamento energetico teatro Nuovo Menotti, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	1	3	1	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	NO		€ 1.096.519,78	€ 0,00	€ 31.504,15	Avvisto	avvio lavori fine lavori	31/12/2022 31/09/2024	SI	31/09/2024		I Pagamenti disposti a valere su altre risorse al 31/12/22" sono al netto dell'IVA
SI	B33D21002760001	Rigenerazione urbana dell'area dello stadio nel centro storico di Spoleto con l'adeguamento impiantistico, il recupero e la riqualificazione dell'edificata area verde denominata parco Chico Mendes e del cortile di Palazzo Collicola	5	2	1	5.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO		€ 106.411,49	€ 0,00	€ 0,00	Avvisto	Pregettazione Stipula del contratto (appalto integrato) Fine lavori	04/11/2022 30/07/2023 31/03/2026	SI	31/03/2026		In data 16/06/2022 con nota al Prefetto di Spoleto, il Comune di Spoleto ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'intervento di riprogettazione presentato ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 108 del 2016. In data 16/06/2022 con nota al Prefetto di Spoleto, il Comune di Spoleto ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'intervento di riprogettazione presentato ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 108 del 2016.
SI	B33H20000540005	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Sordani via Visso	4	1	3.3	€ 4.873.104,04	€ 0,00	€ 26.895,96 (copi suddivisi: - € 74.939,20 MIUR D.M. 369/2018 - € 51.956,76 fondi comunali)	NO		€ 150.100,67	€ 23.985,40	€ 0,00	Avvisto	Ante PNRR - progetto di fattibilità tecnico economica Ante PNRR - progetto definitivo PNRR - progetto esecutivo PNRR - aggiudicazione lavori PNRR - avvio lavori PNRR - fine lavori PNRR - collaudo	07/07/2020 24/11/2022 26/06/2023 15/09/2023 30/11/2023 31/03/2026 30/06/2026	SI	30/06/2026	Non è possibile ad oggi procedere con l'implementazione dati in quanto il risultato in stato di attuazione da parte di REGIS è stato aperto il ticket per assistenza	Si fa presente che il progetto è stato avviato nel 2018 con CUP B33H20000540005 che riconosce solo il finanziamento per l'intervento è stato candidato al bando PNRR acquisendo un CUP B33H20000540005 per tale motivo le attività procedenti a valere sul progetto sono attribuite al primo CUP, sentito il

SOGGETTO ATTUATORE FNER (S/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL FNER (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (S/NO)	INVENTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	da compilare in caso di risposta alternativa nella colonna precedente	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI RESOSSI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI RESOSSI A VALERE SU PNC AL 31/12/2022	PAGAMENTI RESOSSI A VALERE SULLE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	da compilare in successione per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	REPETITO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGS	NOTE
SI	8330201806001	Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici aperti nelle frazioni di Arzano, Bazzano e Foreta	5	3	A3.1	0,00	954.787,50	0,00	NO	€ 35.483,33		€ 31.886,34	Avviato	Avviato	Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori	31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 31/04/2024	SI SI SI ..	31/03/2026				Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC	
SI	8330201807001	Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici aperti nelle frazioni di Eggi e San Giacomo	5	3	A3.1	0,00	830.587,50	0,00	NO	€ 31.349,88		€ 28.122,25	Avviato	Avviato	Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori	31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 28/08/2023	SI SI SI ..	31/03/2026				Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC	
SI	8330201808001	Interventi di rigenerazione urbana di spazi pubblici aperti nella frazione di Montelupo	5	3	A3.1	0,00	698.625,00	0,00	NO	€ 42.787,06		€ 42.787,05	Avviato	Avviato	Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori Conclusione lavori	31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 27/09/2023	SI SI SI ..	31/03/2026				Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC	
SI	8330201809001	Interventi di ricerca in sicurezza di strade comunali in aree periferiche/frazioni	5	3	A3.4	0,00	814.200,00	0,00	NO	€ 2.864,10		€ 2.863,69	Avviato	Avviato	Affidamento della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Avvio dei lavori (separato integrato) Conclusione lavori	31/01/2022 31/12/2022 31/03/2023 21/03/2024	SI SI SI ..	31/03/2026				Sono state aggiunte due colonne relative ai pagamenti effettuati a valere sulle risorse PNC	

COMUNE DI TODI

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SOCIETÀ ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEPOSITI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITÀ RELATIVE A R&G	NOTE	
(SI/NO)	(codice unico progetto)								da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	31/12/2022	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	(SI/NO)							indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate
SI	J47H1900152005	SISTEMAZIONE STRADA CIRCOLETTO	M2	C4	I2.2	310.000,00		76.970,23	310.000,00	76.970,23	189.129,51		AVVIATO	ESECUZIONE DEI LAVORI	ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE	SI	31/12/2025			
SI	J47H1900152005	SISTEMAZIONE STRADA CIRCOLETTO	M2	C4	I2.2	270.050,00		10.592,23		10.592,23			AVVIATO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE	SI	31/12/2025			
SI	J47H1900152005	SISTEMAZIONE STRADA TORREGGENTE	M2	C4	I2.2	534.600,00		2011,93		2011,93			AVVIATO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE	SI	30/03/2026			
SI	J47H1900152005	SISTEMAZIONE STRADA FIORE	M2	C4	I2.2	574.200,00		1450,16		1450,16			AVVIATO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE	SI	30/05/2026			
SI	J47H1900154005	SISTEMAZIONE STRADA ASPROLI PORCHIANO	M2	C4	I2.2	1.030.150,00		17.480,88		17.480,88			AVVIATO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI	ENTRO 16 MESI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE	SI	30/05/2026			RICHIESTA SISTEMAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO
SI	J47E2000240001	MISURE IN SICUREZZA NIDO DELL'AQUILA	M2	C4	I2.2	90.000,00		80405,71	90.000,00	80405,71	72.312,13		AVVIATO	CONCLUSO E RENDICONTATO	SI	31/12/2024				VEDASI DETERMINAZIONE N. 41-2023
SI	J47F2000480001	SISTEMAZIONE STRADA CASEMACE SAN DAMIANO	M2	C4	I2.2	180.000,00		39000,00	180.000,00	39000,00	146.733,09		AVVIATO	CONCLUSO E RENDICONTATO	SI	31/12/2024				VEDASI DETERMINAZIONE N. 41-2023
SI	J47E2000660006	PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA CIMITERO VECCHIO	M2	C4	I2.2	90.000,00		30		30			AVVIATO	ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE	SI	31/12/2023				

COMUNE DI TODI

SI	J4472000840006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - L.STRALCIO	M2	C4													90.000,00			NO								0	0	0	0	0	NON AVVIATO				31/12/2024	NON ANCORA PROFILATI, NON COSTANTE NUMEROSE RICHIESTE
SI	J4472000850006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI- L.STRALCIO	M2	C4													90.000,00			NO								0	0	0	0	NON AVVIATO				31/12/2025	NON ANCORA PROFILATI, NON COSTANTE NUMEROSE RICHIESTE	
SI	J4307100311001	MOBILITY SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE URBANA	M5	C2													5.394.125,08	3.952,00		NO						30/07/2023	SI					AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEL LAVORI		31/05/2026			
SI	J45E72000500006	REALIZZAZIONE MENSÀ SCUOLA COCCHI	M2	C4													712.800,00			NO						30/08/2023	SI					AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEL LAVORI		30/06/2026			
SI	J45E72000500006	REALIZZAZIONE ASILO NIDO POLO SCUOLASTICO PONTIERO	M4	C1													1.243.000,00			NO						30/06/2023	SI					AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEL LAVORI		30/06/2026			
SI	J45E72000500006	REALIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA POLO SCUOLASTICO PONTIERO	M4	C1													1.826.000,00			NO						30/06/2023	SI					AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEL LAVORI		30/06/2026			
SI	J470720013200006	Mitigazione rischio Idrogeologico S.C. Cino	M2	C4													60.000,00			NO																30/03/2026		

COMUNE DI TODI

Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

SI	141F2200310006		C4	I2.1.B	50.000,00										0	NON AVVIATO			30/03/2026		Relativamente a questa linea progettuale di finanziamento si è avuta una data di 07/02/2023 con la quale il Comune ha emesso un'ordinanza di legge n. 1/2023 (MEPA n. 3580006) alla data di 07/02/2023. L'ordinanza di legge n. 1/2023 (MEPA n. 3580006) alla data di 07/02/2023, ha autorizzato il Comune a perfezionare gli atti amministrativi di affidamento della fornitura all'operatore economico individuato.
SI	141F2009500006		M1	I.4.1	158.234,00										0	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE		10/05/2024		In data 17/03/2023 è stata correttamente trasmessa a Padigiale la comunicazione di affidamento della fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il trasporto rifiuti (fornitura alla sigla -5 Comuni - Aprile 2022 - In data 23/03/2023 è stata inviata a Padigiale una nuova candidatura, ammessa, per la quale siamo in attesa dell'assegnazione del finanziamento.
SI	141C22008340006		C1	I.2.1	121.992,00										0	NON AVVIATO	AGGIUDICAZIONE		03/06/2024		
SI	141F2002320006		C1	I.4.3	0,00										0	NON AVVIATO					
SI	141F2002310006		M1	I.4.3	12.005,00										0	AVVIATO	AFIDAMENTO		30/09/2023		
SI	141F22001300006		C1	I.4.4	14.000,00										0	NON AVVIATO					
SI	141F22004420006		C1	I.4.5	32.959,00							0,00			0	AVVIATO	AFIDAMENTO		02/10/2023		
SI	151F22008520006		C3	I1.3.1	20.344,00										0	NON AVVIATO					

SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAI PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTI E	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE	
SI	1811800060001	Ristrutturazione della Scuola Primaria Niccone con interventi di adeguamento sismico	4	1	3.3	400.000,00	0,00	400.000,00	SI	800.000,00	727.104,75	284.210,24	0,00	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	30/07/2023	SI	30/10/2023	Mancanza di un modello di rendicontazione	Sull'importo finanziario del MIUR di € 400 mila e per trasferito nei fondi PNRR, dopo la gara per l'affidamento dei lavori è stato accertato un contributo di € 287.104,75 in quanto le economie di gara di € 112.895,25 sono emerse nella disponibilità del Ministero	
SI	1881200005006	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di Verna	4	1	3.3	1.320.000,00	0,00	0,00	NO	0	55.976,47	0,00	0,00	AVVIATO	approvazione progetto ESECUTIVO	30/05/2023	SI	30/06/2026			
SI	1831200009001	Abbatimento barriere architettoniche Piazza Mazzini e Via Vittorio Veneto	2	4	2.2	90.000,00	0,00	8.786,74	SI	98.786,74	90.000,00	8.000,00	8.000,00	si	Lavori collaudati in corso rendicontazione su Regis	30/09/2023	si	31/03/2026	Machinostà sistema Regis	maggiore importo finanziato con fondi di bilancio comunale	
SI	184H200074001	Torrente Rio Via Morandi Opere di Sistemazione delle sponde e ripulitura alveo	2	4	2.2	100.000,00	0,00	0,00	SI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	si	Lavori terminati - Collaudo in corso	31/07/2023	si	31/03/2026	Machinostà sistema Regis		
SI	1841200008006	Efficientamento energetico piscina comunale coperta - Anno 2022	2	4	2.2	90.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	90.000,00	0,00	8.096,27	AVVIATO	ULTIMAZIONE LAVORI Collaudo lavori tramite certificato di regolare esecuzione	03/04/2023 28/04/2023	SI	31/12/2023	Machinostà sistema Regis	In fase di rendicontazione l'intera opera su REGIS	
SI	1818100031001	Abbatimento barriere architettoniche e mobilità sostenibile - Anno 2021 - Mancipadi Frattioni	2	4	2.2	180.000,00	0,00	0,00	SI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	CONCLUSO	certificato regolare esecuzione	29/11/2022	SI	30/06/2024		In fase di rendicontazione l'intera opera su REGIS	
SI	1861200079001	Efficientamento energetico della scuola primaria Garibaldi - 1° lotto - 1° stralco - Isolamento sottotetto	2	4	2.2	136.176,96	0,00	0,00	NO	0,00	136.177,00	0,00	30,00	AVVIATO	ESECUZIONE DEI LAVORI e COLLAUDO	31/12/2023	SI	31/12/2024			
SI	189E190003001	Adeguamento sismico della scuola di infanzia di Montecatelli nel Comune di Umbertide	2	4	2.2	363.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	363.000,00	0,00	11.424,38	AVVIATO	ESECUZIONE DEI LAVORI e COLLAUDO	30/09/2023	SI	30/06/2024			
SI	189E190003001	Adeguamento sismico della scuola di infanzia di Calciaro nel Comune di Umbertide	2	4	2.2	594.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	594.000,00	0,00	16.433,40	AVVIATO	ESECUZIONE DEI LAVORI e COLLAUDO	31/12/2024	SI	30/06/2026			
SI	187H2000137001	Manutenzione straordinaria e adeguamento del Cavalcavia in via Madonna del Moro	2	4	2.2	1.100.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	100.000,00	0,00	58.780,02	si	Lavori terminati - Collaudo in corso	31/07/2023	si	31/03/2026	Machinostà sistema Regis		
SI	184H200073001	Consolidamento scarpate sede strada della frazione comunale di Saretto, Pan del Cerro e delle Rose	2	4	2.2	132.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	132.000,00	0,00	15.192,75	AVVIATO	contratto da sottoscrivere	30/06/2023	si	31/03/2026	Machinostà sistema Regis	Importo inizialmente concesso € 120.000,00	
SI	18181200240001	Realizzazione di percorso ciclo pedonale sponda destra fiume Tevere collegamento Molta Casanova con la loc. Abbazia di Montecorona	5	2	2.1	700.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	13.820,77	0,00	0,00	AVVIATO	Progettazione definitiva Progettazione esecutiva	30/06/2023 30/07/2023	SI	30/06/2026	/	L'accordo siglato con il M.I. prevede l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze collegate al sisma di marzo 2023 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; 3) il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinnegoziazione dei tempi senza influire il risultato finale.	
															Progettazione definitiva	30/06/2023	SI			L'accordo siglato con il M.I. prevede l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze collegate al sisma di marzo 2023 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; 3) il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinnegoziazione dei tempi senza influire il risultato finale.	
															Esecuzione dei lavori	30/06/2026	NO vedere nota			L'accordo siglato con il M.I. prevede l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze collegate al sisma di marzo 2023 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; 3) il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinnegoziazione dei tempi senza influire il risultato finale.	
															Progettazione definitiva	30/06/2023	SI			L'accordo siglato con il M.I. prevede l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze collegate al sisma di marzo 2023 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza; 3) il procedimento richiede pareri ambientali e variante urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinnegoziazione dei tempi senza influire il risultato finale.	



SI	181821002390001	Realizzazione di passerella ciclo pedonale sul fiume Tevere in bc. Moia Casanova e raccordo c/c biva del Tevere sponda sinistra	5	2	2.1	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	54.891,62	30,00	0,00	AVVIATO	Progettazione esecutiva	30/07/2023	SI	30/06/2026	/	Compilato tale passaggio: 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze connesse al marzo 2023 per il completamento delle opere di urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale; L'accordo siglato con il M.I. prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede partecipazione, approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze connesse al marzo 2023 per il completamento delle opere di urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale. Al momento è già stato consegnato il progetto definitivo dell'opera	
SI	181821002380001	Riqualificazione urbana mediante la ristrutturazione di Piazza Mazzini e delle altre piazze del centro storico	5	2	2.1	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	26.951,51	30,00	0,00	AVVIATO	Progettazione esecutiva	30/07/2023	SI	30/06/2026	/	Compilato tale passaggio: 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze connesse al marzo 2023 per il completamento delle opere di urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale. Al momento è già stato consegnato il progetto definitivo dell'opera	
SI	187H2100280001	Ritutturazione centro socio culturale San Francesco	5	2	2.1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	35.604,15	30,00	0,00	AVVIATO	Progettazione esecutiva	30/07/2023	SI	30/06/2026	/	L'accordo siglato con il M.I. prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Allo stato attuale è già stato approvato il progetto definitivo. Si è in attesa del Parere della Soprintendenza per approvare il progetto esecutivo ed avviare la gara dei lavori.	
SI	182C21000330001	Miglioramento sismico Museo Santa Croce in Piazza San Francesco	5	2	2.1	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	27.312,36	30,00	0,00	AVVIATO	Progettazione esecutiva	30/07/2023	SI	30/06/2026	/	L'accordo siglato con il M.I. prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 30/07/2023. Non è possibile rispettare tale scadenza per vari motivi: 1) procedura complessa che richiede approvazione dell'organo politico e le elezioni amministrative hanno complicato tale passaggio; 2) per due mesi le strutture tecniche del Comune (RUP e collaboratori) sono state bloccate per urgenze connesse al marzo 2023 per il completamento delle opere di urbanistica. Il RUP ritiene comunque di recuperare tale ritardo nella fase esecutiva in quanto i tempi per portare a compimento l'opera sono più che sufficienti. Lo stesso accordo con il M.I. prevede una rinegoziazione dei tempi senza iniziare il risultato finale. Al momento è in fase di elaborazione il progetto definitivo per gli ultimi dettagli legati alla decisione sullo spostamento della "pala del Signorelli" di valore inestimabile che deve essere	
SI	181F22003290006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	M1	C1	1.1.1	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0	0	0	0	DA AVVIARE contrattualizzazione servizi al fornitore	Affidamento dei servizi al fornitore entro il 30 settembre 2023	Termine delle attività il 24 settembre 2023	NO				
SI	181C22001360006	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comuni	M1	C1	1.2	115.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0	0	0	0	DA AVVIARE contrattualizzazione servizi al fornitore	Affidamento servizi al fornitore entro il 11 settembre 2023	Termine delle attività entro 4 dicembre e 2024	NO				

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	(S/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (S/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R&GIS	NOTE
											da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI		G36I2000240001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA AMELIA - annualità 2020	2		4.12.2	90.000	0	0	SI	90.000	73.153,74	64.500,33		concluso		15/09/2020	SI			progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2020)
																inizio lavori	non previsto termine ultimo				
																conclusione progetto	15/02/2021				
SI		G39I2013690001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA AMELIA - annualità 2021	2		4.12.2	180.000	0	0	SI	180.000	162.510,46	146.739,33		concluso		15/09/2021	SI			progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2021)
																inizio lavori	non previsto termine ultimo				
																conclusione progetto	26/04/2022				
SI		G34O22001680001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA AMELIA - annualità 2022	2		4.12.2	90.000	0	0	SI	90.000	90.000,00			avviato		15/09/2022	SI			progetto non nativo PNRR - SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA
																inizio lavori	non previsto termine ultimo				
																conclusione progetto	18/04/2023				
SI		G32F2000100005	MITIGAZ. RISCHIO IDROG. PIAZZA DEL DUOMO	2		4.12.1.b	130.000	0	50.000	NO		18.582,31			avviato		30/03/2023				progetto non nativo PNRR - SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA
																progettazione definitiva ed esecutiva	30/09/2023				
																inizio lavori	30/04/2024				
																fine lavori	30/12/2024				
SI		G37H20001370001	SIST. MOVIM. FRANOSO STRADA CECANIBIBIO	2		4.12.2	162.000	0	0	NO					non avviato		non previsto termine ultimo				progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.145/2018 art.1 comma 139 DM 23/02/2021
SI		G37H20001380001	SIST. MOVIM. FRANOSO STRADA CIMIT. MONTEC.	2		4.12.2	140.800		0	NO					non avviato		non previsto termine ultimo				progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.145/2018 art.1 comma 139 DM 23/02/2021
SI		G34O22005400006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE AMELIA	2		4.12.2	90.000		0	NO	90.000				non avviato		15/09/2023				progetto non nativo PNRR - SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA
																inizio lavori	non previsto termine ultimo				
																fine lavori					

SI	G31D2200540006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE	2	4	12.2	90.000	90.000	0	no	0	no	90.000	non avviato	inizio lavori	15/09/2024	non previsto termine ultimo	PROGETTO NON VISIBILE SU REGIS - APERTI DIVERSI TICKET PER ASSISTENZA	progetto non nativo PNRR - deriva dai finanziamenti L.160/2019 (annualità 2024)
SI	G31B2200640006	RICOSTRUZIONE SCUOLA G. MAMELI	2	3	11.1	2.504.824,25		0	no				avviato	affidamento lavori	30/09/2023	31/12/2025		
SI	G31F2200070006	Adozione Appio	1	1	1.4.3	4.459	2229,5	0	no				0	contrattualizzazione	15.2.2023	15.10.2023	piattaforma padigitale - nessuna criticità	
SI	G31C2300010006	"Abilitazione ai cloud per le PA Locali"	1	1		121.992		0	no				0	contrattualizzazione	8.12.2023	25.02.2025	piattaforma padigitale - nessuna criticità	
SI	G31F2200530006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	1	1	1.4.1	155.234,00	85.400,00	0	no				0	contrattualizzazione	26.05.2023	16.4.2024	piattaforma padigitale - nessuna criticità	
SI	G31F2200484006	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1	1	1.4	48.849		0	no				non avviato	contrattualizzazione	11.09.2023	08.05.2024	piattaforma padigitale - nessuna criticità	
SI	G31F2200314006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	1.4	32.589,00		0	no				avviato	contrattualizzazione	3.10.2023		piattaforma padigitale - nessuna criticità	
SI	G51F2200815006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	1	1		20.344,00		0	no				non avviato	contrattualizzazione	19.07.2023	15-01.2024		





SCGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTI EMEN TE FINANZIATO (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERESU RISOSE PNRR AL NETTIVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A ALTRE RISOSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA RCGS	NOTE
SI	F15E22000170006	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN GUALDO CATTANEO	4	1	1.1	€ 792.000,00 (€ 720.000,00 + € 72.000,00 FON)	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	Aggiudicazione lavori	31/05/2023	SI	31/12/2025		
SI	F18E22000100006	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	4	1	1.2	€ 462.000,00 (€ 420.000,00 + € 42.000,00 FON)	0	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	Aggiudicazione lavori	31/08/2023	SI	30/06/2026		
SI	F19E20000280004	SCUOLA MEDIA DI SAN TEREZIANO VIA DELLE SCUOLE	2	4	2.2	€ 220.000,00 (€ 200.000,00 + € 20.000,00 FON)	0	0	SI	€ 200.000,00	0	0	NON AVVIATO	Aggiudicazione lavori	31/12/2023	SI	31/12/2025		
SI	F13H19000940001	PROGETTO IN ESSERE EDILIZIA SCOLASTICA	4	1	3.3	€ 3.000.000,00	0	€ 1.800.000,00 (MUTUO CDP)	SI	€ 3.000.000,00	LIQ. 447/2021 € 8.605,80 LIQ. 444/2021 € 4.990,00	LIQ. 389 DEL 25/07/2022 € 600,00 LIQ. 118 DEL 03/02/2022 € 512,40 LIQ. 332 DEL 22/06/2022 € 3.120,00	AVVIATO	Avvio dei Lavori	30/11/2023	SI	30/06/2026		
SI	F19D2000410001	STRADE COMUNALI DI VIE VARIE; STRADE COMUNALI DCP 14 GENNAIO 2020 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI	2	4	2.2	€ 70.000,00	0	0	SI	€ 70.000,00	LIQ. 411/2020 € 2.100,00 LIQ. 436/2021 € 48.069,78 LIQ. 446/2021 € 3.663,25 LIQ. 106/2022 € 4.796,29	LIQ. 331/2022 € 504.600,03 LIQ. 296/2022 € 4.725,00	AVVIATO	Collaudi (Det. 436 del 05/10/2021)	05/10/2021	SI	05/10/2021 (Determina n. 436 del 05/10/2021 approvazione stato finale e CRE)		
SI	F13D21005490001	ZONA INDUSTRIALE DI FONTE CUPA*VIA DI FONTE CUPA*LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE	2	4	2.2	€ 70.000,00	0	0	SI	€ 70.000,00	LIQ. 331/2022 € 5.764,50 LIQ. 316/2021 IMP. 404/2021 € 57.796,32 LIQ. 316/2021 IMP. 405/2021 € 1.106,02	LIQ. 474/2022 € 60.626,06 LIQ. 658/2022 € 1.130,42 LIQ. 368/2022 € 29.390,17	AVVIATO	Collaudi (Det. 331 del 22/06/2022)	22/06/2022	SI	22/06/2022 (Determina n. 331 del 22/06/2022 approvazione stato finale e CRE)		
SI	F17H18003590004	STRADE VALLE COLFRUMOLO E CATINO*VIA VA	2	4	2.2	€ 250.000,00	0	0	SI	€ 250.000,00	DET. 370/2021 IMP. 486/2021 € 94.955,38 DET. 370/2021 IMP. 487/2021 € 1.587,41 DET. 572/2022 IMP. 684/2022 € 20.890,18 DET. 572/2022 IMP. 685/2022 € 16.669,25 DET. 475/2022 IMP. 558/2022 € 1.175,54 DET. 369/2021 IMP. 480/2021 € 74.431,06 DET. 369/2021 IMP. 481/2021 € 1.587,41 DET. 492/2022 IMP. 590/2022 € 38.703,77	0	AVVIATO	Avvio dei Lavori	31/12/2023	SI	31/12/2023		

COMUNE DI GUALDO TADINO

Comuni con popolazione tra i 5 mila e 15 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESOSSI PNRR AL METODO AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESOSSI PNRR AL METODO AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESOSSI AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPIFFO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITÀ RELATIVE A RECSI	NOTE
SI	I21E2200010006	lavori realizzazione nuovo asilo nido di Crocchetto	4	1	1.1	1.300.000,00€	0	0	0	0	0	AVVIATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI IN CONSO	31/05/2023	SI	30/06/2026		
SI	I21E2200000006	lavori di realizzazione nuova palestra di Crocchetto	4	1	1.3	556.000,00€	0	0	0	0	0	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CONSO	31/08/2023	SI	30/06/2026		
SI	I25F2200010006	lavori di realizzazione nuova palestra di Curtire	4	1	1.3	1.058.660,00€	0	0	0	0	0	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CONSO	31/08/2023	SI	30/06/2026		
SI	I2K2200017001	STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E PER LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI	2	4	2.2	90.000,00€	0	0	90000	0	0	AVVIATO	esecuzione dei lavori	25/07/2023	SI	31/12/2023		
SI	I24E2000680005	FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO VIA CENTRO	2	4	2.2	250.000,00€	0	0	250000	0	0	AVVIATO	esecuzione dei lavori	30/07/2023	SI	31/12/2023		
SI	I21F2200305006	Il progetto nazionale è quello di creare una piattaforma sulla quale i Comuni caricano le notifiche a carico di cittadini e imprese ed è la stessa piattaforma, con il risultato che si stanno definendo, a cui si stanno affidando i servizi, che vengono offerti ai cittadini che ricercano in tempi brevi le notifiche e per i Comuni che risparmiando tempo nella notifica che arriverà a quasi tutti i cittadini tramite questa piattaforma	Missione 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Misura 1.4.5 "Recupero Digital" - Comuni (Settembre 2022) -	0	0	0	0	0	0	avviro	Contrattualizzazione entro il 03/04/2023 data conclusione attività entro il 12/09/2023	Contrattualizzazione entro il 03/04/2023 data conclusione attività entro il 12/09/2023	Contrattualizzazione entro il 03/04/2023 data conclusione attività entro il 12/09/2023	12/09/23	La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà	
SI	I21F2200373006	Si tratta del rifacimento integrale del sito del comune, che deve essere rifatto secondo la modalità dell'Agid, comprensivo dell'attivazione di quattro servizi online Per il cittadino si tratta di avere nuove funzioni nella parte della presentazione delle pratiche in Comune	Missione 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	€ 32.589,00	0	0	0	0	0	avviro	Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 24/02/2024	Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 24/02/2024	Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 24/02/2024	24/02/24	La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà	
SI	I21F2200428006	Verranno incrementati ulteriori 40 tipologie di pagamenti tramite PagoPA, che sta entrando sempre più nell'uso giornaliero del cittadino. Una condotta anche per il Comune per quanto riguarda gli adempimenti di ricezione e ricondizione dei pagamenti di base	Missione 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Misura 1.4.3 "Pagopa - COMUNI (LUGLIO 2022)"	€ 35.137,00	0	0	0	0	0	avviro	Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 20/09/2023	Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 20/09/2023	Contrattualizzazione entro il 24/02/2023 data conclusione attività entro il 20/09/2023	20/09/23	La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà	
SI	I21C22001540006	Migrazione delle procedure in Cloud SaaS con miglioramento della fruibilità e maggiore sicurezza informatica. Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi	Missione 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)"	€ 121.992,00	0	0	0	0	0	avviro	Contrattualizzazione entro il 4/12/2023 data conclusione attività entro il 06/06/2024	Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 06/06/2024	Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 06/06/2024	06/06/24	La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà	
SI	I21F22004530006	Si tratta dell'implementazione dei servizi disponibili sull'app. Chi ha attivo questa app riceveva ulteriori avvisi circa le pratiche con il Comune.	Missione 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Misura 1.4.3 "APP IO - Comuni (Settembre 2022)"	€ 11.662,00	0	0	0	0	0	avviro	Contrattualizzazione entro il 15/09/2023 data conclusione attività entro il 23/12/2023	Contrattualizzazione entro il 15/09/2023 data conclusione attività entro il 23/12/2023	Contrattualizzazione entro il 15/09/2023 data conclusione attività entro il 23/12/2023	23/12/23	La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà	
SI	I51F22007210006	L'obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del "once-only", cioè l'inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio.	Missione 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Misura 1.3 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)"	€ 23.344,00	0	0	0	0	0	non avviato	Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 15/01/2024	Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 15/01/2024	Contrattualizzazione entro il 19/07/2023 data conclusione attività entro il 15/01/2024	15/01/24	La piattaforma ministeriale PA digitale 2026 gestisce in automatico il popolamento del RECS e quindi non si sono riscontrate difficoltà	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURAZIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	BIPRESI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPECTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGCS	NOTE
SI	55422004660001	Interventi sulla scuola primaria in loc. Soccorso	2	4	2.2	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	vedi note	vedi note	Opera ULTIMATA	Avvio lavori	15/09/2020	SI	20/10/2021	Rendicontazione in RGCS CONCLUSA	L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	55422004240005	Messa in sicurezza plesso scolastico di Soccorso. Opere di completamento	2	4	2.2	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	vedi note	vedi note	Opera ULTIMATA	Avvio lavori	15/09/2021	SI	05/05/2021	Rendicontazione in RGCS CONCLUSA	L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	554220042970005	Messa in sicurezza impianto sportivo di Agello	2	4	2.2	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	vedi note	vedi note	Opera ULTIMATA	Avvio lavori	15/09/2021	SI	03/10/2022	Rendicontazione in RGCS CONCLUSA	L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	5542200120001	Interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale	2	4	2.2	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	vedi note	vedi note	AVVIATA	Avvio lavori	15/09/2022	SI	-	Rendicontazione in RGCS IN CORSO	L'avanzamento dell'opera è regolarmente monitorata nell'applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	55422000970004	Messa in sicurezza strada del Casellaro	2	4	2.2	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	vedi note	vedi note	AVVIATA	Avvio lavori	08/06/2022	SI	-	Rendicontazione in RGCS IN CORSO	L'avanzamento dell'opera è regolarmente monitorata nell'applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	5542200470001	Interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale	2	4	2.2	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	-	-	NON AVVIATA	Avvio lavori	15/09/2023	-	-	Rendicontazione in RGCS NON AVVIATA	L'opera non è ancora presente in RGCS
SI	54422001380006	Miglioramento sismico ampliamento ed efficientamento energetico Asilo Nido di Magione	4	1	1.1	1.426.551,00	1.426.551,00	0	1.426.551,00	-	-	AVVIATA	Aggiudicazione Avvio lavori Collaudi Conclusioni	15/09/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/03/2024	-	30/06/2026	Rendicontazione in RGCS NON AVVIATA	L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	5542200670002	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria di San Feliciano	4	1	3.3	1.030.500,00	1.030.500,00	0	1.030.500,00	-	-	AVVIATA	Avvio lavori Collaudi Conclusioni	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2024	-	30/06/2026	Rendicontazione in RGCS AVVIATA	L'opera è stata regolarmente rendicontata nel applicativo RGCS nel quale sono presenti tutti i dati contabili
SI	55414800260001	Lavori di adeguamento sismico plesso scolastico di Villa Soccorso	4	1	3.3	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00	-	-	NON AVVIATA	Aggiudicazione Avvio lavori Collaudi Conclusioni	15/09/2023 30/11/2023 31/03/2024 30/06/2026	-	30/06/2026	Rendicontazione in RGCS NON AVVIATA	L'opera non è ancora presente in RGCS
SI	55422004670006	Adozione PagoPA e AppIO	1	1	1.4.3	8.232,00	8.232,00	0	8.232,00	0	0	Concluso	completamento dell'attività	180 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 400 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	13/09/2023	Non soggetto a RGCS	/
SI	55422004520006	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	1	1	1.2	121.992,00	121.992,00	0	121.992,00	0	0	Da avviare	completamento dell'attività	180 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 400 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	04/12/2024	Non soggetto a RGCS	/
SI	5542200460006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1	1	1.4.1	155.234,00	155.234,00	0	155.234,00	0	0	Da avviare	completamento dell'attività	270 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 360 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	24/09/2024	Non soggetto a RGCS	/
SI	55422003630006	Digitalizzazione degli avvisi pubblici	1	1	1.4.5	32.589,00	32.589,00	0	32.589,00	0	0	Avviato	completamento dell'attività	90 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 180 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	25/09/2023	Non soggetto a RGCS	/
SI	55422005740006	Adozione identità digitale	1	1	1.4.4	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	300,00	0	Avviato	completamento dell'attività	360 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 300 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	31/10/2024	Non soggetto a RGCS	/
SI	55422004570006	Adozione PagoPA e AppIO	1	1	1.4.3	16.283,00	16.283,00	0	16.283,00	0	0	Da avviare	completamento dell'attività	180 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 240 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	15/05/2024	Non soggetto a RGCS	/
SI	55422008660006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi	1	1	1.3.1	20.344,00	20.344,00	0	20.344,00	0	0	Da avviare	completamento dell'attività	90 gg. dalla notifica PEC del finanziamento 180 gg. dalla data di contabilizzazione del fornitore	SI	15/01/2024	Non soggetto a RGCS	/



SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CLUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE ALTRIE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINO ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	C97H20001600001	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale Corigliano-Bivio Guido	L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2020			€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	SI	€ 70.000,00	€ 67.658,14	€ 55.435,81	€ 0,00	AVVIATO e TERMINATO	I LAVORI SONO STATI AFFIDATI IN DATA 15/09/2020 E SONO TERMINATI IN DATA 17/07/2021			17/07/2021	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	1) Colonna E: importo finanziato dalla L. 160/2019 anno 2020 e poi confluito nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno L. 160/2019 anno 2020 e poi confluiti nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 160/2019 anno 2020; 4) Colonna O e F: L'anticipazione indicata è stata ricevuta a valere sui fondi della L. 160/2019 anno 2020; 5) COLONNE T e U: gli impegni sono stati assunti sui fondi della L. 160/2019. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di riconducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i tecnici collegati al PNRR. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO di RICONDUCEBILITA'. 6) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi a valere sulla L. 160/2019 anno 2020;
SI	C99J21024400001	Lavori di efficientamento energetico Palazzo Comunale, scuola Media F. Meluzio ed impiantistica sportiva	L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2021			€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	SI	€ 140.000,00	€ 136.981,65	€ 111.871,73	€ 0,00	AVVIATO e TERMINATO	I LAVORI SONO STATI CONSEGNAATI IN DATA 14/10/2021 E SONO TERMINATI IN DATA 04/02/2022			04/02/2022	1) Il progetto è presente in RegIS, ma nella sezione "Procedura aggiudicazione" riporta in automatico senza possibilità di correzione "Importo aggiudicato € 44.469,00 in luogo di € 108.781,31". Ho fatto la comunicazione alla mail pur.support@rs.perng@me.gov.it con pecn. 1077 del 25/01/2023 e mi è stato risposto "Speriamo che a breve sarà possibile anche all'Ente approvare le modifiche di tali sezioni". Alla data del 11/05/2023 non è possibile effettuare tale modifica. 2) Siamo in attesa di predisporre l'atto di riconducibilità dei lavori alle dichiarazioni e agli obblighi da sottoscrivere per i fondi PNRR, essendo questa un'opera finanziata inizialmente con fondi a valere sulla L. 160/2019. Nella riunione tenutasi in data 04/05 u.s. presso la Prefettura ci è stata data indicazione che a breve uscirà una Circolare del MEF ed allegato lo schema di atto di riconducibilità.	
SI	C54H22000620001	Lavori di efficientamento energetico c.t. Moro di San Francesco e Teatro Comunale	L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2022			€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	SI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	AVVIATO	I LAVORI SONO STATI CONSEGNAATI IN DATA 15/09/2022 E DOVEVAVO FINIRE IN DATA 13/04/2023. SONO STATI SOSPESI IN DATA 13/04/2023 PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA (LAVORI AGGIUNTIVI)			30/06/2023	1) Il progetto non è presente "Anagrafica progetti" in RegIS. Ho fatto la comunicazione alla mail pur.support@rs.perng@me.gov.it con pecn. 1077 del 25/01/2023 e mi è stata inviata di nuovo la scheda di ricognizione "2) Siamo in attesa di predisporre l'atto di riconducibilità dei lavori alle dichiarazioni e agli obblighi da sottoscrivere per i fondi PNRR, essendo questa un'opera finanziata inizialmente con fondi a valere sulla L. 160/2019. Nella riunione tenutasi in data 04/05 u.s. presso la Prefettura ci è stata data indicazione che a breve uscirà una Circolare del MEF ed allegato lo schema di atto di riconducibilità.		
SI	C59F23000110006	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico della scuola elementare B. Buozzi finalizzati all'efficientamento energetico	L. 160/2019 art. commi 29-37 anno 2023 e 2024			€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	NO	€ 140.000,00	NESSUN IMPEGNO	NESSUN PAGAMENTO	NON AVVIATO	DOVRA' ESSERE MONITORATO IN REGIS					1) COLONNA E: IMPORTO FINANZIATO DALLA L. 160/2019 anno 2022 e poi confluito nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno L. 160/2019 anno 2021 e poi confluiti nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 160/2019 anno 2022; 4) Colonna O e F: L'anticipazione indicata è stata ricevuta a valere sui fondi della L. 160/2019 anno 2022; 5) COLONNE T e U: E' stata impegnata la somma totale di € 70.000,00 ed assunti i subimpegni con i creditori individuali per € 61.396,58. Escludono economie pari a € 8.603,42 su cui stiamo lavorando per finalizzare i lavori in variante. Alla riunione del 04/05 u.s. presso la Prefettura ci è stato dato che per utilizzare i fondi PNRR dobbiamo sottoscrivere i CUP. Gli impegni sono stati assunti sui fondi della L. 160/2019. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di riconducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO di RICONDUCEBILITA'. 6) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi a valere sulla L. 160/2019 anno 2021.	

SI	C59119000220002	Lavori di miglioramento della sicurezza e della funzionalità della strada comunale di Camiano nel tratto compreso tra il Ponte dell'Occhio e la chiesa di S. Anna	D.M. 08/11/2021 L.145/2018 Scorrimento Graduatoria	1	1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	€ 1.083.075,40	€ 605.600,00	€ 0,00	€ 605.600,00	SI	€ 605.600,00	€ 605.600,00	€ 13.000,00	€ 0,00	AVVIATO	LAVORI SONO STATI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 60 DEL 10/03/2023. SIAMO IN ATTESA CHE LA DITTA COMPLETILA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASTIPULA DEL CONTRATTO	AVVIATO	€ 0,00	AVVIATO	1) STIPULA CONTRATTO: entro i primi dieci giorni di giugno; 2) NOMINA D.L. e COLLAUDATORE: entro il 30/03/2023 3) CONSEGNA LAVORI e INIZIO: entro il 30 giugno; 3) FINE LAVORI: 210 gg dalla consegna lavori	1) Intervento è presente in ReGIS in quanto il progetto "Lavori di miglioramento della funzionalità della strada comunale di Camiano nel tratto compreso tra il Ponte dell'Occhio e la chiesa di S. Anna" è stato inserito al finanziamento L.145/2018 per l'importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 art. 139; 4) Colonna N: Importo precedentemente finanziato con fondi PNRR. Dobbiamo verificare se gli impegni sono stati assunti sui fondi PNRR. Dobbiamo verificare la ricorrenza delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR per la classificazione in bilancio. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO DI RICONDUCEBILITA'; 5) COLONNE V e W: i pagamenti sono stati effettuati sui fondi PNRR;
SI	C57H00001600001	Lavori di sistemazione della strada comunale che collega Cortignano alla S.P. Gianno dell'Umbria	D.M. 08/11/2021 L.145/2018 Scorrimento Graduatoria	1	1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	€ 1.083.075,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 984.614,00 (con imputazione per € 804.614,00 anno 2022 e per € 180.000,00 anno 2023) + € 98.461,40 anno 2023	SI	€ 984.614,00 (con imputazione per € 804.614,00 anno 2022 e per € 180.000,00 anno 2023) + € 98.461,40 anno 2023	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	LAVORI SONO STATI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 37 DEL 07/02/2023. IL CONTRATTO REE. N. 3513 IN DATA 12/04/2023. I LAVORI SONO STATI CONSEGNA TI IN DATA 18/04/2023. Autorizzazione subappalto determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 123 del 10/05/2023.	AVVIATO	€ 0,00	AVVIATO	1) Colonna I: importo finanziato dalla L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 2) Colonna K: importo precedentemente finanziato con fondi L. 145/2018 comma 139 e poi confluente con decreto 8 Novembre 2021 nel PNRR; 3) Colonna M: Importo precedentemente finanziato con fondi L.145/2019 art. 139 (€ 984.614,00) ed ulteriore somma di € 98.461,40 preassegnata con DPCM 28/07/2022 ; 4) COLONNE T e U: gli impegni sono stati assunti sui fondi PNRR. Dobbiamo provveder alla redazione di un atto di riconducibilità delle somme e del rispetto delle dichiarazioni obbligatorie per i fondi del PNRR per la classificazione in bilancio. Abbiamo partecipato alla riunione del 04/05/2023 presso la Prefettura di Perugia ed i tecnici collegati dal Ministero ci hanno detto che a breve uscirà una Circolare del MEF con indicazioni per la redazione di questo ATTO DI RICONDUCEBILITA';		
SI	C59E22000100006	Lavori di costruzione mensa scolastica presso il polo scolastico del Capoluogo F. Melanzio e B. Buozzi		4	1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	€ 216.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.920,00	NO	€ 0,00	€ 216.920,00	€ 0,00	AVVIATA FASE DI RICARICO PROGETTAZIONE	1) ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO/SECUTIVO; 2) ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA PROGETTO; 3) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO; 4) INDIZIONE GARA; 5) AFFIDAMENTO LAVORI	AVVIATA FASE DI RICARICO PROGETTAZIONE	€ 0,00	AVVIATA FASE DI RICARICO PROGETTAZIONE	1) 20/06/2023 2) 30 GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DEL PROGETTO 3) 35 GIORNI DALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA 4) DUE GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO 5) 31/08/2023	TUTTA L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E DI MONITORAGGIO E' DA AVVIARE LA PROGETTAZIONE	
SI	C59E22000090006	Lavori di costruzione mensa scolastica presso la scuola Adele Costa Gnocchi di Madonna della Stella		4	1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	€ 433.664,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 443.664,00	NO	€ 0,00	€ 443.664,00	€ 0,00	AVVIATA FASE DI INCARICO PROGETTAZIONE	1) ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO; 2) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3) INDIZIONE GARA 4) AFFIDAMENTO LAVORI	AVVIATA FASE DI INCARICO PROGETTAZIONE	€ 0,00	AVVIATA FASE DI INCARICO PROGETTAZIONE	1) 26/06/2023 2) 28/06/2023 3) 30/06/2023 4) 31/08/2023	TUTTA L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E DI MONITORAGGIO E' DA AVVIARE	

COMUNE DI PANICALE

Comuni con popolazione tra 15 mila e 15 mila abitanti

SOGGETTO ATTIVITA' PNRR	CLUP	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO (NON AVVIATO)	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	F742000200001	SCUOLA PRIMARIA DI PANICALE VIALE S. GIUSEPPE C/4 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO, ANTINFURTO E ANTISISMICO	2	C4	2.2	20000	0	0	NO	23340,23		23340,23	AVVIATO	CONSEGNA LAVORI	ENTRO 15-06-2023	SI	31/12/2023		
SI	F7112000200001	PONTE DI CIRIBETO STRADA COMUNALE DI SANTONOVA PRESSO LA SICUREZZA DEL PONTE DI CIRIBETO STRADALE	2	C4	2.2	35000	0	0	NO	26287,8		26287,8	AVVIATO	INIZIO LAVORI	14-11-2023	SI	31/12/2023		
SI	F7112000200001	OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E ANTINFURTO COMUNITARI IN VIA NENNINIA	2	C4	2.2	55000	0	0	NO	38889,03	27091,82	38889,03	AVVIATO	CONSEGNA LAVORI	ENTRO 31-07-2023	SI	ENTRO 31-12-2025		
SI	F7112000200001	OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E ANTINFURTO COMUNITARI IN VIA NENNINIA	2	C4	2.2	30000	0	0	NO	16.275,00		16.275,00	NON AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO	ENTRO 15-06-2023	SI	ENTRO 31-12-2025		
SI	F7112000200001	VIA CAPPONI MESSA IN SICUREZZA VIA CAPPONI PRESSO LA SICUREZZA DELLA TUTELA DELLA VIBRILTA' PERSONALE E IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA	2	C4	2.2	30000	0	0	NO				NON AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO	ENTRO 15-06-2023	SI	ENTRO 31-12-2025		
SI	F7122000200006	Lavori di rifacimento completo del manto stradale e sigillato di finanziamento con la misura di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 nella Missione 2, rubriche work e manutenzione ecologica. Componente C4-tracce del territorio e della ricerca d'area. Investimento 2.2. Approvazione del progetto dell'intervento	2	C4	2.2	70000	0	0	NO	61435,4		61435,4	AVVIATO	CONSEGNA LAVORI	ENTRO 15-09-2022	SI	ENTRO 31-12-2023	NEL PORTALE REGIS RISULTA VALORE INFERIORE A 70000 € CONCESSI: E' STATO PIU' VOLTE SEGNALATO MA RISULTA ANCORA VALORE ERRATO	
SI	F7112000200001	OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E ANTINFURTO COMUNITARI IN VIA NENNINIA	2	C4	2.2	140000	0	0	NO	138374,95	73065,48	138374,95	AVVIATO	CONSEGNA LAVORI	ENTRO 30-06-2023	SI	FINE LAVORI ENTRO 31/12/2022	Attrezzazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere	
SI	F7412000200001	OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E ANTINFURTO COMUNITARI IN VIA NENNINIA	2	C4	2.2	70000	0	0	NO	56105,88	44935,44	56105,88	AVVIATO	LAVORI GIA' ESEGUITI E CONFLUITI IN PNRR (ANNUALITA' 2020 LEGGE 160/2019)	FINE LAVORI 05/05/2021	SI	FINE LAVORI ENTRO 31/12/2021	Attrezzazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere	
SI	F7112000200006	*Adozione app 10*	1	1	1.4	1372			NO				AVVIATO	CONCLUSIONE ATTIVITA'	13/10/2023	SI	13/10/2023		
SI	F7112000200006	*Abilitazione al Covid per le PA Locali*	1	1	1.2	121.992			NO				DA AVVIARE	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	04/12/2023	SI	25/02/2025		
SI	F7112000400006	Adozione PagaPA	1	1	1.4	5142			NO				DA AVVIARE	CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	19/07/2023	SI	15/03/2024		
SI	F7112004000006	*PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI*	1	1	1.4	32.889			NO				DA AVVIARE	STATO DI	31/05/2023	SI	27/11/2023		

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Comuni con popolazione tra i 5 mila e 15 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R&GS	NOTE	
SI	82G19000250001	Rifacimento copertura ex scuola materna per futura installazione impianto Fv	2	4	2.2	70000	0	0	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	70000	57377,65	0	AVVIATO	CONCLUSO	15/12/2020	SI	15/12/2020	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	rinnato da incasare 3500

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SINO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU AL TRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU AL TRE RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SINO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	B59J2101E270001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE		2	4.2.2	180.000,00	180.000,00	180.000,00	167.694,65	86.412,41 più IVA per 19.712,79	0,00	AVVIATO	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	31.12.2022	SI	31.12.2022		ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI CON DIVERSE MODALITA'
SI	B59J22001430002	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIA SELCILIAMA		4	1.3.3	2.912.313,31	- €	0 NO			0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE	15.07.2023	SI	30.06.2026		ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI CON DIVERSE MODALITA'
SI	B57H19003070004	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SAN GIUSTINO - CA' DI SAN GIUSTINO - OSANNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA		2	4.2.2	121.956,00	121.956,00	121.956,00	28.386,58	4197,20 più IVA per 929,39, 2,45 più IVA per euro 3.653,94	0,00	AVVIATO	ESECUZIONE	30/09/2023	SI	31/12/2023		ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI CON DIVERSE MODALITA'
SI	B57H20001420003	SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MEZZATORRE SAN GIUSTINO		2	4.2.2	155.000,00	155.000,00	65.000,00 SI	12.319,21	11.364,03	0,00	AVVIATO	ESECUZIONE	31/05/2023	SI	30/07/2023		ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI CON DIVERSE MODALITA'
SI	B55E22000210006	ASILO NIDO COMUNALE - PROGETTO "ASILO NIDO "IL CUCCIOLINO"		4	1.1.1	2.400.000,00	- €	0 NO	0,00	0,00	0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE	15/06/2023	SI	30/06/2026		1 - ESTREMA DIFFICOLTA' NELLA RENDICONTAZIONE A NUMEROSI SOGGETTI DIVERSI CON DIVERSE MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE (NORMA)
SI	B51F22002790006	abolizione piattaforma Notifiche Digitali		1	1.4.5	€ 32.589,00						AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 90 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento 180 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore 300 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore	SI	31/05/2023		
SI	B51G22001100006	migrazione al cloud dei servizi digitali di		1	1.1.2	€ 121.992,00						NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento 240 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore 360 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore	SI	03/06/2023		
SI	B51F22002460006	abolizione piattaforma pagPA		1	1.4.3	€ 14.569,00						NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento 360 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore	SI	05/06/2023		
SI	B51F22001890006	estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID.CE		1	1.4.4	€ 14.000,00						NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento 270 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore	SI	28/07/2023		
SI	B51F22003480006	miglioramento dell'esperienza d'uso dei sito e dei servizi digitali per il cittadino - citizen experience		1	1.4.1	€ 51.654,00						NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammisibilità della domanda 180 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento 360 giorni dalla data di notifica PEC del finanziamento del fornitore	SI	30/09/2023		

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	D21F22002750004	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - (PNID) TERRITORIO COMUNALE "NOTIFICHE - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA"	1	1	1.4.5	32.589,00	0,00	0,00	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente			NON AVVIATO	DA AVVIARE	31/05/2023		31/12/2023	non prevista	I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico RegIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.
SI	D21F22003040000	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	1	1	1.4.1	155.234,00	0,00	0,00	NO				NON AVVIATO	DA AVVIARE	30/09/2023		30/06/2024	non prevista	I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico RegIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.
SI	D21C22001360000	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE/TERRITORI O COMUNALE* N. 12 SERVIZI DA MIGRARE	1	1	1.2	121.992,00	0,00	0,00	NO				NON AVVIATO	DA AVVIARE	11/09/2023		30/06/2024	non prevista	I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico RegIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.
SI	D21I19000550001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CASITAN LORETO E GIUGLIARA ANNO 2020	M2	C4	2.2	70.000,00	0,00	0,00	SI	70.000,00	23.910,15 €		CONCLUSO	CONCLUSO 21/09/2020 CON APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE				DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI	
SI	D21I21012070001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO 1 ANNO 2021	M2	C4	2.2	70.000,00	0,00	0,00	SI	35.000,00	43.735,89 €		CONCLUSO	CONCLUSO 28/02/2022 CON APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE				DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI	
SI	D21I21012070001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO 2 ANNO 2021	M2	C4	2.2	70.000,00	0,00	0,00	SI	35.000,00	27706,6		CONCLUSO	CONCLUSO 02/05/2022 CON APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE				DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI	
SI	D21H22001020000	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022	M2	C4	2.2	70.000,00	0,00	0,00	SI	0,00			AVVIATO	FINE LAVORI 03/01/2023	03/01/2023	SI	03/01/2023	DIFFICOLTA' NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE - ATTO DI RICONDUCEBILITA' POPOLAMENTO REGIS DIFFICOLTOSO SENZA SPECIFICHE NEI MANUALI	
SI	D22E22000930004	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	M2	C4	2.2	70.000,00	0,00	0,00	NO				NON AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 15/07/2023	15/07/2023		15/07/2023		
SI	D22E22000940004	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024	M2	C4	2.2	70.000,00	0,00	0,00	NO				NON AVVIATO	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	30/03/2024		30/03/2024		

SOGGETTO A FONDI PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PREVISIONALE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTIALI 31/12/2022	VALORI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	VALORI SU RISORSE PNRR SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO O NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPIFFITO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITÀ RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	B64H22001120006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO	2	4.2.2	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00	69.317,33	0	0	AVVIATO	INIZIO LAVORI ENTRO IL 15/09/2022	31/12/2023	SI	31/12/2023	DIFFICOLTÀ IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA	ORGANIZZAZIONE FINANZIAMENTO L. 160/2019 (ANNO 2021) CON LUTO IN PNRR
SI	B63D21006250001	CIMITERO DI TREVÌ	2	4.2.2	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00 €	134.878,81	0	134.878,81	AVVIATO	INIZIO LAVORI ENTRO IL 31/12/2021	11/11/2022	SI	31/12/2023	DIFFICOLTÀ IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA	ORGANIZZAZIONE FINANZIAMENTO L. 160/2019 (ANNO 2021) CON LUTO IN PNRR-2022
SI	B66H22000370006	PIANO PER ASI NIDO SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA	4	1.1.1	325.000,00	0	0	0	0,00 €	0	0	0	AVVIATO - FIRMATO ACCORDO DI CONCESSIONE	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI entro e non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del piano così come modificato dal D.L. n. 51 del 10/05/2023				LA SCADENZA ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ERA FISSATA AL 31/05/2023	
SI	B65119001880001	SCUOLA BORGOGARIBOLDI	2	4.2.2	40.820,00	0	40.820,00	0	70.000,00 €	40.820	0	40.820	AVVIATO	INIZIO LAVORI ENTRO IL 15/11/2020	04/01/2021	SI	31/12/2023	DIFFICOLTÀ IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA	FINANZIAMENTO UNITARIO SUDDIVISO IN DUE INTERVENTI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER L'ANNO 2020 CON LUTO IN PNRR
SI	B66E19001930001	SCUOLA BORGOGARIBOLDI	2	4.2.2	29.180,00	0	29.180,00	0	29.180	29.180	0	29.180	AVVIATO					DIFFICOLTÀ IMPUTAZIONE DATI INTERNO PIATTAFORMA	FINANZIAMENTO UNITARIO SUDDIVISO IN DUE INTERVENTI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER L'ANNO 2020 CON LUTO IN PNRR
SI	B65C22001560006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	1. INVESTIMENTO 1.2	121.992,00	0	0	0	0	0	0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	04/12/2023 25/02/2023		25/02/2025	NON SOGGETTO	NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026
SI	B65F2200350006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	3. INVESTIMENTO 1.4	37.589,00	0	0	0	0	0	0	0	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	31/05/2023 27/09/2023	SI	27/09/2023	NON SOGGETTO	NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026
SI	B65F22003660006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1. INVESTIMENTO 1.4	155.234,00	0	0	0	0	0	0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	30/09/2023 24/09/2024		24/09/2024	NON SOGGETTO	NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026
SI	B51F2200500006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	1	3. INVESTIMENTO 1.3	20.344,00	0	0	0	0	0	0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	01/06/2023 27/11/2023		27/11/2023	NON SOGGETTO	NON SOGGETTI A REGIS IN QUANTO BANDI PER LA DIGITALIZZAZIONE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTI E FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPIETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RCGS	NOTE
SI	697H2000040006	STRADA COMUNALE CIMARORCA-MACERINO	M2	C4	I2.2	694.734,10 €	- €	- €	SI	€ 577.031,00	TOTALE IMPEGNI € 577.031,00	- €	AVVIATO	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 60 del 12/05/2022; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 836 del 18/11/2022; Contratto di appalto: 15/05/2023 - Reg. n. 3000/2023 Esecuzione dei lavori: 120 giorni dal verbale di consegna dei lavori	31/12/2023	da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale	31/12/2023	In fase di inserimento	Progetto di importo complessivo originario di € 577.031,00 incrementato di € 57.703,00 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. 28.02.2022
SI	698I21000450001	EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA DANTE ALIGHIERI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SOSTITUZIONE INESSI* STRADALE (2021)	M2	C4	I2.2	99.205,19 €	- €	- €	SI	€ 99.205,19	TOTALE IMPEGNI € 99.205,19	- €	AVVIATO	Approvazione del progetto; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 683 del 15/09/2021; Contratto di appalto stipulato mediante trattativa diretta su MEPA n. 1831352 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori	31/12/2023	da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale	31/12/2023	In fase di inserimento	
SI	695G20000960001	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALASPORT (2020)	M2	C4	I2.2	38.740,07 €	- €	- €	SI	€ 38.740,07	TOTALE IMPEGNI € 38.740,07	- €	AVVIATO	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 104 del 20/08/2020; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 648 del 14/09/2020; Contratto di appalto stipulato MEPA trattativa n. 1399766 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori	INTERVENTO TERMINATO IL 14/09/2020			In fase di inserimento	
SI	691B20000000004	STRADA DEL COLLE STRADA DEL COLLE*ADEGUAMENTO SEDE STRADALE	M2	C4	I2.2	110.000 €	- €	- €	SI	€ 121.000,00	TOTALE IMPEGNI € 121.000,00	- €	AVVIATO	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 169 del 24/11/2022; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 865 del 07/12/2022; Contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata registrata al Reg. n. 11 del 12 Aprile 2023 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori	31/12/2023	da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale	31/12/2023	In fase di inserimento	Progetto di importo complessivo originario di € 110.000,00 incrementato di € 11.000,00 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. 28.02.2022
SI	695E2000040006	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	M4	C1	I1.1	1.676.079,30 €	- €	- €	NO	€ 1.523.708,45	- €	- €	AVVIATO	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 50 del 13/04/2023; in fase di gara di appalto.	31/12/2026		31/12/2026	In fase di inserimento	Progetto di importo complessivo originario di € 1.523.708,45 incrementato di € 152.370,84 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M.
SI	694D2001660006	ART. 1, COMMI 29 37, LEGGE 27 DICEMBRE 2022, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTAGGIO FOTOVOLTAICO (2022)	M2	C4	I2.2	50.000,00 €	- €	- €	SI	€ 50.000,00	TOTALE IMPEGNI € 50.000,00	- €	AVVIATO	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 130 del 14/09/2022; Determina affidamento lavori; Determinazione Responsabile LL.PP. N. 628 del 15/09/2022; Contratto di appalto stipulato mediante trattativa diretta su MEPA n. 3190364 Esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori	31/12/2023	da compilare in fase di successione per ogni fase procedurale	31/12/2023	In fase di inserimento	
SI	691E15000240001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	M4	C1	I3.3	360.000,00 €	- €	- €	SI	- €	- €	- €	NON AVVIATO	PROGETTO NON AVVIATO	PROGETTO NON AVVIATO				
SI	691C23000400006	Investimento I.2 "abilitazione ai cloud per le PA locali"	M1	C1	I1.2	77.897,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	NON AVVIATO	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa	25/02/2025				
SI	691F22000440006	Misura I.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	M1	C1	I1.4	79.932,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	AVVIATO	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa	07/11/2023				
SI	691F22004010006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale	M1	C1	I1.4	14.000,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	NON AVVIATO	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa	31/10/2024				
SI	691F22003850006	Piattaforma notifiche digitali	M1	C1	I1.4	23.147,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	AVVIATO	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico e candidatura ammessa	23/09/2023				



SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTI	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DESODDITI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	REFERITO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	E10119000780001	lavori messa in sicurezza strade e strutture comunali	2	4	2.2	294.500,00 €	0	0	SI	250.000,00 €	1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90	63.281,39 €	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	mag-23	SI	lug-23	progetto inserito in REGIS	
SI	E14E21000140001	lavori riconversione ex scuole in spazi polifunzionali per le famiglie	4	1	1.1	679.250,00 €	0	32.500	NO		1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90		AVVIATO	INIZIO LAVORI	mag-23	SI	mar-24	progetto inserito in REGIS	
SI	E16C21000000006	lavori restauro e valorizzazione giardino villa cavenla selva	1	3	2.3	2.340.000,00 €	0	0	NO		1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90		AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	mag-23	SI	mar-24	progetto inserito in REGIS	
SI	E15F21000940001	lavori messa in sicurezza cimitero comunale capoluogo del Tubo	4	2	2.2	50.000,00 €	0	0	SI	50.000,00 €	1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90	40.355,88 €	CONCLUSO	RINE LAVORI	ott-21	ott-21	progetto inserito in REGIS		
SI	E15F21000940001	lavori manutenzione straordinaria via Marcone e area artigianale	2	4	2.2	50.000,00 €	0	0	SI	50.000,00 €	1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90	6.044,10 €	CONCLUSO	RINE LAVORI	nov-21	nov-21	progetto inserito in REGIS		
SI	E15F21001220001	lavori messa in sicurezza via del Paggetto	2	4	2.2	50.000,00 €	0	0	SI	50.000,00 €	1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90	7.570,57 €	CONCLUSO	RINE LAVORI	nov-22	nov-22	progetto inserito in REGIS		
SI	E19H19000650001	lavori adeguamento e messa in sicurezza impianti sportivi polivalenti spogliatoi	2	4	2.2	50.000,00 €	0	0	SI	50.000,00 €	1) Progettazione tecnico-progettuale messa in sicurezza di strade e strutture comunali in via S. Maria Maddalena e adiacenze, alla c.c. provincia di termi per interventi di messa in sicurezza di strade e strutture del comune di allerona. € 1.238,75 3) Affidamento lavori: € 64.814,90	45.882,26 €	CONCLUSO	RINE LAVORI	set-20	SI	set-20	progetto inserito in REGIS	
SI	E11C21001490006	ABILITAZIONE CLOUD PER LA PA	1	1	1.1	47.247,00 €				0			NON AVVIATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	31/12/2023	SI	31/12/2023		
SI		RAFFORZAMENTO DELL'APPLICAZIONE IO	1	1	1.4.3	4.617,00 €							NON AVVIATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	31/12/2023	SI	31/12/2023		

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE	
SI	F21F2200630006	ADDIZIONE AMPD	1.14.3	7.776,00 €			NO			PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA'	01/06/2023		240 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE			
SI	F21F2200240006	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID-CE	1.14.4	14.000,00 €			NO			PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA'	29/12/2023		300 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE			
SI	F21F2200110006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOZZI	1.1.2	47.427,00 €			NO			PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA'	11/09/2023		450 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE			
SI	F21F2200640006	ADDIZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1.1.4.3	16.994,00 €			NO			PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE COMPLETAMENTO ATTIVITA'	05/06/2023		240 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE			
SI	F23I1300060001	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. "NUOVI PROGETTI"	4	469.269,68 €		0	NO			PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	AVVIATO PROGETTAZIONE	entro maggio 2023 aggiudicazione e affidamento entro luglio 2023 progettazione e affidamento entro novembre 2023 lavori entro febbraio 2024 esecuzione lavori entro maggio 2025 fine lavori entro luglio 2025 rendicontazione	SI	30 luglio 2025		REGIS AGGIORNATO		
SI	F23I1900090001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2020_ porzione di illuminazione via Bevilacqua SF D'Assisi_ Campo Piva/lastrone Via Renzini ANNUALITA' 2020	4	50.000,00 €			SI	50.000,00 €	EURO 47.908,04	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	CONCLUSO	COMPLETATO NEL 2021	COMPLETATO NEL 2021	SI	06/04/2021		E' IN CORSO LA FASE DI COMPIUZIONE IN REGIS	
SI	F23I2106710001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2021	4	100.000,00 €			SI	100.000,00 €	EURO 95.926,92	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	CONCLUSO	COMPLETATO NEL 2022	COMPLETATO NEL 2022	SI	27/06/2022		E' IN CORSO LA FASE DI COMPIUZIONE IN REGIS	
SI	F23C2200090006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO ALVIANO CAPOLUOGO.	3	2.205.046,28 €			NO			PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	AVVIATO PROGETTAZIONE - A	alla data del 19 aprile 2023 avvia progettazione definitiva ed esecutiva alla data del 31 luglio 2023 approvazione del progetto all'incirca entro fine settembre 2023 aggiudicazione dei lavori alla data del 31 marzo 2026 ultimazione dei lavori consegnati ed avviati	SI	30-giu-26	31 marzo 2026		REGIS AGGIORNATO	
SI	F24H22000790006	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2022, CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER PICCOLI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 29 DELLA L.190/2019, INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO	4	25.000,00 €			NO		22.125,96	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	CONCLUSO	COMPLETATO NEL 2023	COMPLETATO IL 31 marzo 2023	SI			REGIS IN CORSO DI AGGIORNAMENTO	
SI	F25F22000930006	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNUALITA' 2022, CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER PICCOLI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 29 DELLA L.190/2019, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI V.C. PAOLICCHI.	4	25.000,00 €			NO		17.250,52	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	CONCLUSO	COMPLETATO NEL 2023	COMPLETATO IL 30 aprile 2023	SI			REGIS IN CORSO DI AGGIORNAMENTO	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRI RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RAGS	NOTE
SI	4692101309000	Lavori di riqualificazione di spazi pubblici con creazione di fontane e sicurezza di spazi pubblici in via Marconi	5	3	A3.1	-	1.200.000,00 €	-	NO	€ 51.665,12	€ 1.200.000,00 €	€ 51.665,12	AVVIATO	Affidamento progettazione	31/12/2021	SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021)			Integrazioni in corso per il finanziamento di € 1.200.000,00 per maggiori costi dei materiali - Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 11/11/2022
SI	4630210032000	Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi comunali - II stralcio	5	3	A3.3	-	1.500.000,00 €	-	NO	94.098,04 €	1.500.000,00 €	94.098,04 €	AVVIATO	Affidamento progettazione	31/12/2021	SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021)			Integrazioni in corso per il finanziamento di € 1.500.000,00 per maggiori costi dei materiali - Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 11/11/2022
SI	4652100320000	Lavori di miglioramento della qualità viaria della strada di Buonacquisto	5	4	A4.5	-	205.000,00 €	-	NO	12.578,80 €	205.000,00 €	12.578,80 €	AVVIATO	Affidamento progettazione	31/12/2021	SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021)			Integrazioni in corso per il finanziamento di € 205.000,00 per maggiori costi dei materiali - Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 11/11/2022
SI	4652100320000	Lavori di miglioramento della qualità viaria della strada di San Francesco	5	4	A4.5	-	200.000,00 €	-	NO	12.377,04 €	200.000,00 €	12.377,04 €	AVVIATO	Affidamento progettazione	31/12/2021	SI (Avviate procedure di affidamento 30/12/2021)			Integrazioni in corso per il finanziamento di € 200.000,00 per maggiori costi dei materiali - Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 11/11/2022
SI	4630210032000	Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di parte della pubblica illuminazione	2	C4	B.2	-	50.000,00 €	-	NO	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	AVVIATO	Progettazione esecutiva	09/09/2020	SI (Approvazione esecutivo 09/09/2020)			Integrazioni in corso per il finanziamento di € 50.000,00 per maggiori costi dei materiali - Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 11/11/2022
SI	4682100138000	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici comunali - II stralcio del campo da calcio nuova Pia Arrone - I stralcio funzionale	2	C4	B.2	-	100.000,00 €	-	NO	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	AVVIATO	Progettazione esecutiva	11/08/2021	SI (Approvazione esecutivo 18/08/2021)			Integrazioni in corso per il finanziamento di € 100.000,00 per maggiori costi dei materiali - Comunicazione del Commissario Straordinario Sima 2016 n. 11/11/2022
SI	4612200400000	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	1	1	1.4.1	79.922,00 €	- €	- €	NO	79.922,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE	15/02/2023	SI		Integrazioni in corso per il finanziamento di € 13.800,00 oltre IVA e Iribato fino alla conclusione e certificazione del contratto.	
SI	4612200282000	PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI	1	1	1.4.5	23.147,00 €	- €	1.797,02 €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE	16/11/2023	SI		Integrazioni in corso per il finanziamento di € 23.147,00 oltre IVA e Iribato fino alla conclusione e certificazione del contratto.	
SI	4612200385000	ADDIZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1	1	1.4.3	6.070,00 €	- €	- €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE	19/07/2023				
SI	4612200120000	ABILITAZIONE AL COVID PER LE PALLUCOLI	1	1	1.2	77.897,00 €	- €	- €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE	11/09/2023				
SI	4612200427000	SPID CIE	1	1	1.4.4	14.000,00 €	- €	- €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE	28/03/2024				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'	22/01/2025				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	31/05/2023	SI			
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	31/05/2023				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	09/10/2023				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	19/07/2023				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	15/03/2024				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	04/12/2024				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	28/03/2024				
														CONCLUSIONE ATTIVITA'					
														CONTRATTUALIZZAZIONE	22/01/2025				

STATUS ATTUATORE PNRR	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PERSISTENTE (SI/NO)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI RESOPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISI Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	REPETTO DEL TERMINE (SI/NO) da compilare in successione per ogni fase procedurale	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	1592106590001	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA MONSERRATO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I CORPI LUMINANTI	2	4.2.2	25.829,00	0	0	0	NO	22.858,69	0	PROGETTO AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2023	SI	03/12/2021		VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 50.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 1592106590006
SI	154621002140001	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DI S. PIETRO	2	4.2.2	77.385,00	0	0	0	NO	77.385	0	PROGETTO AVVIATO	IN CORSO	31/12/2023		31/12/2023		VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 50.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 154621002140006
SI	157H0001370001	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - STRADA DI SANTIUGENA, STRADA DEI POGGI	2	4.2.2	22.360,00	0	0	0	NO	21.483,99	0	PROGETTO AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2021	SI	22/01/2021		VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 25.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 157H0001370006
SI	1592000330001	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA.	2	4.2.2	27.440,00	0	0	0	NO	26.065,57	0	PROGETTO AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2021	SI	20/09/2021		VEDI RIGA SEGUENTE. COME RIGA SOPRA. TRATTASI DI INTERVENTO FINANZIATO CON LO STESSO CONTRIBUTO. ESSENDO UN PNRR NON NATIVO NON E' STATO POSSIBILE ADEGUARE A POSTERIORI SU PU'CAPITOLI L'IMPORTO DELL'ANTICIPO TOTALE DI 25.000 EURO SI RIFERISCE ANCHE ALLA RIGA 1592000330006
SI	154D200310006	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - IMPLEMENTAZIONI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE COMPLETAMENTO	2	4.2.2	50000	0	0	0	NO	0	0	PROGETTO NON AVVIATO		31/12/2024		31/12/2024		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	154H2000860006	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - PNRR - COMPLETAMENTO	2	4.2.2	50000	0	0	0	NO	0	0	PROGETTO NON AVVIATO		31/12/2025		31/12/2025		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	151C2001660006	1.2 - Abilitazione al Cloud	1	1.1.2	47427	0	0	0	NO	0	0	NON AVVIATO	DA AVVIARE	04/12/2023		04/12/2023		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	151F2004710006	1.3.1 - PDND - Comuni	1	1.1.3	30172	0	0	0	NO	0	0	NON AVVIATO	DA AVVIARE	02/06/2023		31/12/2023		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	151F2004860006	1.4.1 - app IO	1	1.1.4	1944	0	0	0	NO	0	0	AVVIATO	IN CORSO DI AFFIDAMENTO	10/07/2023		31/12/2023		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	151F2004070006	1.4.4 - SPID CIE	1	1.1.4	14000	0	0	0	NO	0	0	AVVIATO	IN CORSO DI AFFIDAMENTO	05/01/2024		30/06/2024		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	151F2004650006	1.4.3 - pagPA	1	1.1.4	9712	0	0	0	NO	0	0	AVVIATO	IN CORSO DI AFFIDAMENTO	19/07/2023		31/12/2023		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO
SI	151F2003840006	1.4.1 - E-governance del Cittadino	1	1.1.4	79922	0	0	0	NO	0	0	NON AVVIATO	DA AVVIARE	03/07/2023		31/12/2023		FINANZIAMENTO PADIGIALE 2026 ACCORDATO E DECRETO PUBBLICATO

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MESIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESISTITO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R.G.S	NOTE
(S/NO)	(codice unico progetto)								(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per riga, le fasi procedurali previste dal cronoprogramma	procedurale il termine ultimo di scadenza per ogni procedura	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo di realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	05F21001890001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASPALTATURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE TOSCOLANO-PARAGNANO BASSO	M2	C4	D.2	100.000,00 €	0	0	SI	0	€ 100.000,00	€ 98.458,26	€ 0	AVVIATO	CONCLUSA	10/12/2021	SI	30/12/2021		
SI	059D2000150001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE COMPLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI	M2	C5	D.2	50.000,00 €	0	0	SI	0	€ 50.000,00	€ 49.610,74	€ 0	AVVIATO	CONCLUSA	22/04/2022	SI	22/04/2022		
SI	05F22000970001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASPALTATURA DI UN TRATTO DEL TRATTO PNRR DEL RISPONDI DROGODILOGICO CHE INTERESSA LA STRADA	M2	C6	D.2	50.000,00 €	0	0	SI	0	€ 50.000,00	€ 46.109,87	€ 0	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	30/06/2023	SI	30/06/2023		
SI	07H22001570002	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIFORNIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICI	M2	C7	D.1.B	136.530,33 €	0	0	NO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	NON AVVIATO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	30/11/2023	SI	31/12/2026		
SI	05F22000580006	ESPERIENZA DEL CITTA'ANO NEI SERVIZI PUBBLICI	M1	C1	11.4.1	79.922,00 €	0	0	NO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	AVVIATO	FASE ESECUTIVA	21/11/2023	SI	21/11/2023		
SI	05L22000370006	ABILITAZIONE AL CLONDI PELLE PA LOCALI COMUNI	M1	C1	11.2	47.437,00 €	0	0	NO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	NON AVVIATO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	03/06/2023	SI	26/08/2024		

SOCIETA' ATTUALE DEL PNRR	CLUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNSC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTALI 31/12/2022	RICAMBI RESPOSTI A VALERE SU RESIDUI PNRR AL 31/12/2022	FASCI MINUTI PRESENTI A VALERE SU LIBRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESISTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RCGS	NOTE
SI	B6520200090005	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	4	2.2A	50.000,00 €	0	45.500,00 €	SI	50.000,00	Impegno n.626/2020 Impegno n. 219/2021 Impegno n. 218/2021 per un totale di € 50.000,00	50.000,00 €		AVVIATO/CONCLUSO	FASI CONCLUSE		SI			Totale di progetti non nativi PNRR
SI	B6521000650001	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E MANODORINA IN RAGIONE DEL PIU' IN FASE DI SPESA DELLA STRADA	2	4	2.2B	100.000,00 €	0	0,00 €	SI	100.000,00	Impegno n.217/2022 per un totale di € 100.000,00	90.239,65 €		AVVIATO/CONCLUSO	FASI CONCLUSE					Totale di progetti non nativi PNRR
SI	B652200030006	NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DEL PLESSO DI BASCHI	4	1	1.2	900.000,00 €	0	192.660,00 €	NO	0	Impegno 222/2023 da PV per un totale di € 101.504,00	0		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	31/09/2023 30/11/2023 31/12/2023 30/09/2026	SI			
SI	B671200320006	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN UN TRATTO STRADALE AL KM 4+500 - STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE	2	4	2.1	130.000,00 €	0	4.700,00 €	NO	0		0		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	30/09/2024 30/09/2024 31/07/2024 31/07/2024	SI			
SI	B671200150005	NUOVA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLE FAMIGLIE DI BASCHI	4	1	1.1	239.700,00 €	0	377.300,00 €	NO	0	Impegno con determina n. 299 del 23/12/2022 per un totale di € 99.821,20	0		AVVIATO	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVIO DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI COLLAUDO DEI LAVORI	20/09/2023 30/11/2023 31/12/2023 30/09/2026	SI			
SI	B671200140006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA ITALIA IN FRAZIONE CIVITELLA DEL LAGO	2	4	2.2B	50.000,00 €	0	0,00 €	NO	0	Impegno n. 367/2022 Impegno n. 236/2023 PV 1.079.2024 per un totale di € 50.000,00	0		AVVIATO	IN FASE DI COLLAUDO		SI			
SI	B672003100006	MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI"	1	1	1.4.5.	23.147,70 €			NO					AVVIATO	APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE INTEGRAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	03/01/2023 31/05/2023 27/11/2023	SI			
SI	B672003800006	MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	1	1	1.4.1.	79.922,00 €			NO					NON AVVIATO	APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE CONCLUSIONE ATTIVITA'	03/01/2023 03/01/2023 28/03/2024	SI			
SI	B672000000006	MISURA 1.2. "ABITUZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	1	1	1.2	77.897,00 €			NO					NON AVVIATO	APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE CONCLUSIONE ATTIVITA'	08/03/2023 04/12/2023 25/02/2025	SI			
SI	B512006880006	MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND)"	1	1	1.3.1	10.172,00 €			NO					NON AVVIATO	APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTUAZIONE FORNITORE CONCLUSIONE ATTIVITA'	21/03/2023 19/07/2023 15/09/2024	SI			

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unko progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTE ENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGS	NOTE
SI	F94H2000060001	LEGG. 150/2019 art. 1 DM 34/01/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. FINANZIATO CON LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019. LOTTO 1: COPERTURA E PENSILINE DEL BLOCCO DI LOCULI LOTTO 1973. PRESSO IL CIVICO	2	4	M2C4.2.2	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SI	50.000,00 €	47.941,42 €	43.970,64 €	0,00 €	AVVIATO	INCARICO PROFESSIONALE LOTTO 1	DETERMINAZIONE N. 185 DEL 20/07/2020	SI			Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni
SI	F93I2100540001	LEGG. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 e DM 11/11/2020 - LEGGE 160 DEL 27/12/2019 COME MODIFICATA CON D.L. 104/2020. LOTTO 1: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE. LOTTO 2: LAVORI	2	4	M2C4.2.2	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SI	100.000,00 €	94.735,05 €	86.941,84 €	0,00 €	AVVIATO	INCARICO PROFESSIONALE LOTTO 1	DETERMINAZIONE N. 231 DEL 10/08/2021	SI			Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni
SI	F93C2000410006	LEGG. 160/2019 art. 1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI LAMPADINE CON LAMPADINE A LED SU TUTTE LE SCUOLE E SEDI COMUNALI. CONTRIBUTI PER LA RESILIENZA. LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ART. 1, COMMI 29 E 55. (L. N. 160/2019) ART. 1, COMMI 139 E 55. (L. N. 145/2018) ANNUALITA' 2022.	2	4	M2C4.2.2	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SI	50.000,00 €	49.288,50 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	DETERMINAZIONE N. 235 DEL 17/08/2022	DETERMINAZIONE N. 235 DEL 17/08/2022	SI			Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni
SI	F93F2200062008	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1.b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PIANO PER "NUOVI PROGETTI" - Mitigazione del rischio idrogeologico e ripianazione danni del Comune di Bettona.	2	4	2.1.b	300.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	GIUGNO 2023 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OTTOBRE 2023 - AFFIDAMENTO LAVORI					Sistema complesso e macchinoso di rendicontazione e mancanza di personale soprattutto per i piccoli Comuni

		NOVEMBRE 2023 - AGGIUDICAZIONE LAVORI																
		GENNAIO 2024 - INIZIO LAVORI																
		GIUGNO 2025 - FINE LAVORI																



PROGETTO ATTIVATORE FNER	CLUP	SN TIETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL FNER (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	INVENTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	ESITO DEL ITER (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R.GES	NOTE
SI	817190082001	Lavori di messa in sicurezza varie strade dissestate	2	4	2.2	990.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 351 del 13/09/2022 - € 6.630,99 Impegno n. 353 del 13/09/2022 - € 18.909,24 Impegno n. 388 del 28/09/2022 - € 999.719,78 Totale € 725.260,01	€ 3.078,45 su impegno n. 351 del 13/09/2022 € 9.299,63 su impegno n. 353 del 13/09/2022 € 998.300,00 su impegno n. 388 del 28/09/2022 Totale € 1.112.78,08 (IVA esclusa)	Nessuno	Avviato	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	SI	22/05/2023	Inerito, in attesa di erogazione del 2° acconto	Indicare eventuali criticità riscontrate
SI	815E22000100006	Realizzazione della mensa presso il plesso scolastico di Cantalupo	4	1	1.2	180.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 567 del 22/12/2022 - € 8.775,02	Nessuno	Nessuno	Avviato	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori Collaudo dei lavori	Aggiudicazione dei lavori - 31/08/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusione dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 30/06/2024	SI	30/06/2024	Non ancora inserito	
SI	813623000000006	Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Cantalupo	4	1	3.3	1.700.000,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Avviato	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusione dei lavori Collaudo dei lavori	Aggiudicazione dei lavori - 15/09/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusione dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 31/05/2024	SI	31/03/2024	Non ancora inserito	
SI	816E22000238001	Intervento di messa in sicurezza del magazzino comunale in Via Roma	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 282 del 04/09/2020 - € 4.576,00 Impegno n. 315 del 17/09/2020 - € 63.560,33 Impegno n. 320 del 17/09/2020 - € 1.227,33 Impegno n. 317 del 17/09/2020 - € 865,05 Totale € 68.568,76	€ 4.576,00 su impegno n. 282 del 04/09/2020 € 63.065,71 su impegno n. 315 del 17/09/2020 € 865,05 su impegno n. 317 del 17/09/2020 Totale € 68.506,76	Nessuno	Avviato	Intervento concluso	Intervento concluso	SI	Intervento concluso	Non ancora inserito	
SI	817H21000950001	Intervento di messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in messa in sicurezza del plesso funzionale al livello sferico Via del Pentile e Via Sant'Anna	2	4	2.2	140.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 208 del 16/04/2021 - € 7.686,00 Impegno n. 252 del 20/07/2021 - € 126.264,36 Impegno n. 253 del 20/07/2021 - € 3.000,00 Impegno n. 254 del 20/07/2021 - € 3.000,00 Impegno n. 209 del 15/04/2022 - € 3.659,40 Totale € 140.000,00	€ 126.264,36 su impegno n. 252 del 20/07/2021 € 1.227,33 su impegno n. 254 del 20/07/2021 € 3.059,40 su impegno n. 253 del 20/07/2021 € 3.000,00 su impegno n. 252 del 20/07/2021 Totale € 131.151,09	Nessuno	Avviato	Intervento concluso	Intervento concluso	SI	Intervento concluso	Inerito, in attesa di erogazione del 2° acconto	
SI	816H22000540001	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio di proprietà comunale adiacente al Chostro di San Domenico, ex albergo	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 292 del 09/08/2022 - € 6.815,24 Impegno n. 352 del 13/09/2022 - € 62.325,25 Totale € 69.340,49	Nessuno	Nessuno	Avviato	Conclusione e collaudo dei lavori	Conclusione e collaudo dei lavori - 31/12/2023	SI	31/12/2023	Non ancora inserito	
SI	81E222048480006	Intervento di efficientamento energetico edificio ex Orlate	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Conclusione e collaudo dei lavori	Conclusione e collaudo dei lavori - 31/12/2024	SI	31/12/2024	Non ancora inserito	
SI	81E222048490006	Intervento di efficientamento energetico impianti sportivi e Via Flaminia	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Conclusione e collaudo dei lavori	Conclusione e collaudo dei lavori - 31/12/2025	SI	31/12/2025	Non ancora inserito	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTI	IMPEGNO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PACIFICI IMPEGNI VALERE SU ALTRI FONDI AL 31/12/2022	RISCHIO AVVIATO/ NON AVVIATO	FASE PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RIEPIETO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ALTRI SOGGETTI CONVICI II	ATTIVITA' RELATIVA A BGCS	NOTE
SI	B17H19001820001	Lavori di messa in sicurezza varie strade disastrate	2	4	2.2	990.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 351 del 13/09/2022 - € 6.630,99 Impegno n. 353 del 13/09/2022 - € 38.909,24 Impegno n. 355 del 13/09/2022 - € 69.713,78 Totale € 115.253,99	Nessuno	Avviato	Esecuzione lavori	Conclusioni lavori prevista 22/05/2023	SI	22/05/2023	Nessuno	Inverto, in attesa di erogazione del 2° acconto	
SI	B1E220010006	Realizzazione della mensa presso il plesso scolastico di Carrilupo	4	1	1.2	180.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 507 del 22/12/2022 - € 8.775,02	Nessuno	Avviato	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni dei lavori Collaudo dei lavori	Aggiudicazione dei lavori - 31/08/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusioni dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 30/09/2024	SI	30/06/2026	Nessuno	Non ancora invertito	
SI	B1E220000006	Intervento di adeguamento tecnico ed efficientamento energetico del distretto scolastico di Carrilupo	4	1	3.3	1.700.000,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Avviato	Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni dei lavori Collaudo dei lavori	Aggiudicazione dei lavori - 15/09/2023 Avvio dei lavori - 30/11/2023 Conclusioni dei lavori - 31/12/2023 Collaudo dei lavori - 31/03/2026	SI	31/03/2026	Nessuno	Non ancora invertito	
SI	B1E22000029001	Intervento di messa in sicurezza del magazzino comunale in Via Roma	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 282 del 04/09/2020 - € 4.576,00 Impegno n. 313 del 13/09/2022 - € 63.005,05 Impegno n. 315 del 17/09/2020 - € 33.000,00 Impegno n. 317 del 17/09/2020 - € 9.301,16 Totale € 106.882,21	Nessuno	Avviato	Intervento concluso	Intervento concluso	SI	Intervento concluso	Nessuno	Non ancora invertito	
SI	B17H21000950001	Intervento di messa in sicurezza e dello sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobilità del primo stralcio funzionale all'anello viario Via dei Petrioli e Via Sirtufiana	2	4	2.2	140.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 292 del 20/07/2021 - € 126.206,36 Impegno n. 293 del 20/07/2021 - € 13.000,00 Impegno n. 294 del 20/07/2021 - € 3.600,00 Impegno n. 295 del 15/06/2022 - € 3.659,40 Totale € 146.465,76	Nessuno	Avviato	Intervento concluso	Intervento concluso	SI	Intervento concluso	Nessuno	Inverto, in attesa di erogazione del 2° acconto	
SI	B1E22000540001	Intervento di efficientamento energetico dell'edificio di proprietà comunale adiacente al Chostro di San Domenico, ex albergo	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Impegno n. 292 del 09/08/2022 - € 6.815,24 Impegno n. 352 del 13/09/2022 - € 62.525,25 Totale € 69.340,49	Nessuno	Avviato	Conclusioni e collaudo dei lavori	Conclusioni e collaudo dei lavori - 31/12/2023	SI	31/12/2023	Nessuno	Non ancora invertito	
SI	B1E22004840006	Intervento di efficientamento energetico	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Conclusioni e collaudo dei lavori	Conclusioni e collaudo dei lavori - 31/12/2024	SI	31/12/2024	Nessuno	Non ancora invertito	
SI	B1E22004900006	Intervento di efficientamento energetico	2	4	2.2	70.000,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Conclusioni e collaudo dei lavori	Conclusioni e collaudo dei lavori - 31/12/2024	SI	31/12/2024	Nessuno	Non ancora invertito	
SI	B1E22003700001	Migrazione al Cloud dei servizi digitali	1	1	1.4	77.827,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Indizione della migrazione dei ser	Indizione della migrazione dei ser - 25/02/2025	SI	25/02/2025	Nessuno	/	
SI	B1E22003700001	Estensione al Cloud dei servizi digitali	1	1	1.4	77.827,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Indizione della migrazione dei ser	Indizione della migrazione dei ser - 27/11/2023	SI	27/11/2023	Nessuno	/	
SI	B1E22003660006	Pista Borneo North Sea Digital	1	1	1.4	23.147,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Indizione della migrazione dei ser	Indizione della migrazione dei ser - 28/03/2024	SI	28/03/2024	Nessuno	/	
SI	B1E22003230006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito	1	1	1.4	79.922,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Indizione della migrazione dei ser	Indizione della migrazione dei ser - 27/11/2023	SI	27/11/2023	Nessuno	/	
SI	B5E22005050006	Integrazione di dati forma Digitale Nazionale	1	1	1.3.1	10.172,00 €	/	/	NO	/	Nessuno	Nessuno	Non avviato	Indizione della migrazione dei ser	Indizione della migrazione dei ser - 27/11/2023	SI	27/11/2023	Nessuno	/	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SVIETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTE FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTE FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTE FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTIVI 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI AVANTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI AVVIZIATI AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPOSTE DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITÀ RELATIVE A R.G.S	NOTE
SI	J71F200370006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Missione 1	Componente 1	Misura 1.4.1	78.922,00 €	0,00 €	0,00 €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente				PROGETTO NON AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 31/07/23 - 31/07/23</li> <li>FASE 2: 31/09/23 - 31/09/23</li> <li>FASE 3: 30/09/23 - 31/07/23</li> <li>FASE 4: 31/07/23 - 31/07/23</li> <li>FASE 5: 31/07/23 - 28/03/24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 3: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 4: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 5: DA VERIFICARE</li> </ul>	28/03/2024	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	
SI	J71C2001430006	Passaggio al cloud nei servizi pubblici	Missione 1	Componente 1	Misura 1.2	47.477,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO NON AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 14/02/2022 - 14/02/2023</li> <li>FASE 2: 14/02/2023 - 14/07/2023</li> <li>FASE 3: 14/07/2023 - 14/07/2023</li> <li>FASE 4: 14/01/2023 - 14/06/2024</li> <li>FASE 5: 14/06/2024 - 14/09/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 3: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 4: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 5: DA VERIFICARE</li> </ul>	04/12/2024		
SI	J71F200270006	Sviluppo app-vo	Missione 1	Componente 1	Misura 1.4.3	6.561,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO NON AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 02/11/2022 - 02/12/2023</li> <li>FASE 2: 02/12/2023 - 02/04/2023</li> <li>FASE 3: 02/04/2023 - 02/07/2023</li> <li>FASE 4: 02/07/2023 - 02/11/2023</li> <li>FASE 5: 02/11/2024 - 15/01/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 4: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 5: DA VERIFICARE</li> </ul>	26/01/2024		
SI	J51F2004310006	Adozione piattaforma digitale dei dati	Missione 1	Componente 1	Misura 1.3.1	30.172,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO NON AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 30/01/2023 - 01/03/2023</li> <li>FASE 2: 01/03/2023 - 01/04/2023</li> <li>FASE 3: 01/04/2023 - 01/06/2023</li> <li>FASE 4: 01/06/2023 - 01/10/2023</li> <li>FASE 5: 01/10/2023 - 01/11/2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 4: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 5: DA VERIFICARE</li> </ul>	27/11/2023		
SI	J71F2000080006	Implementazione Pagaipa	Missione 1	Componente 1	Misura 1.4.3	36.389,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO NON AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 15/02/2023 - 15/04/2023</li> <li>FASE 2: 15/04/2023 - 15/06/2023</li> <li>FASE 3: 15/06/2023 - 15/10/2023</li> <li>FASE 4: 15/10/2023 - 15/02/2023</li> <li>FASE 5: 15/02/2023 - 15/04/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 4: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 5: DA VERIFICARE</li> </ul>	08/05/2024		
SI	J71F200270006	Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici - SPID E CIE	Missione 2	Componente 2	Misura 1.4.4	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO NON AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 03/01/2023 - 03/02/2023</li> <li>FASE 2: 03/02/2023 - 03/04/2023</li> <li>FASE 3: 03/04/2023 - 03/07/2023</li> <li>FASE 4: 03/07/2023 - 03/10/2023</li> <li>FASE 5: 03/10/2023 - 07/11/2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 4: DA VERIFICARE</li> <li>FASE 5: DA VERIFICARE</li> </ul>	20/09/2024	DA DEFINIRE	L'Ente sta ancora nelle fasi iniziali del processo e deve predisporre il progetto e cronoprogramma
SI	J71E2000160001	Opere in ambito cultura	Missione 1	Componente 3	Misura 1.2	237.000,00 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO AVVIATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACCERTAMENTI CONTABILI DELLE RISORSE CREAZIONE DEI TEMPI DI</li> <li>FASE 2: ANALISI DI MERCATO E CREAZIONI/COMPONTO CAPITOLATO TECNICO</li> <li>FASE 3: PREPOSIZIONE DI GARANZIAMENTO DIRETTO (CON QUADRO ECONOMICO) E CONTATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE</li> <li>FASE 4: INIZIO DELL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON PREPOSIZIONE DI SCHEMI DI PROGETTO DA CONFRONTARE CON IL CONCORRENZIALI E TEST FINALI DEI SERVIZI</li> <li>FASE 5: CONCLUSIONE DI PROCESSO CON ATTIVITÀ DI BACK-END (PAGAMENTO DEI FORNITORI E REINDICONTAZIONE CONCLUSIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 02/07/2020 - 25/08/2020</li> <li>FASE 2: 25/08/2020 - 30/09/2020</li> <li>FASE 3: 30/09/2020 - 30/09/2020</li> <li>FASE 4: 10/09/2020 - 30/12/2020</li> <li>FASE 5: 02/11/2021 - 04/11/2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: SI</li> <li>FASE 4: SI</li> <li>FASE 5: SI</li> </ul>	CONCLUSO	RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE	
SI	J7212000070001	Progetto non nativo PNRR - Efficiamento energetico 2020	Missione 2	Componente 4	Misura 2.2	45.889,53 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO CONCLUSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: PROGETTAZIONE E ESECUTIVA</li> <li>FASE 2: AGGIUDICAZIONE</li> <li>FASE 3: SELEZIONE LAVORI</li> <li>FASE 4: SELEZIONE LAVORI</li> <li>FASE 5: COLLAUDO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 13/07/2021 06/09/2021</li> <li>FASE 2: 09/09/2021 09/09/2021</li> <li>FASE 3: 22/11/2021 22/11/2021</li> <li>FASE 4: 10/09/2021 10/09/2021</li> <li>FASE 5: 19/12/2022 13/12/2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: SI</li> <li>FASE 4: SI</li> <li>FASE 5: SI</li> </ul>	CONCLUSO	RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE	
SI	J7921005950001	Progetto non nativo PNRR - Efficiamento energetico 2021	Missione 2	Componente 4	Misura 2.2	97.894,64 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO CONCLUSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: PROGETTAZIONE E ESECUTIVA</li> <li>FASE 2: AGGIUDICAZIONE</li> <li>FASE 3: SELEZIONE LAVORI</li> <li>FASE 4: SELEZIONE LAVORI</li> <li>FASE 5: COLLAUDO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 01/09/2023 16/11/2023</li> <li>FASE 2: 01/09/2023 16/11/2023</li> <li>FASE 3: 01/09/2023 16/11/2023</li> <li>FASE 4: 22/11/2023 22/11/2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: SI</li> <li>FASE 4: SI</li> <li>FASE 5: SI</li> </ul>	CONCLUSO	RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE	
SI	J72E2000280006	Progetto non nativo PNRR - Efficiamento energetico 2022	Missione 2	Componente 4	Misura 2.2	49.371,85 €	0,00 €	0,00 €	NO					PROGETTO CONCLUSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: PROGETTAZIONE E ESECUTIVA</li> <li>FASE 2: AGGIUDICAZIONE</li> <li>FASE 3: SELEZIONE LAVORI</li> <li>FASE 4: SELEZIONE LAVORI</li> <li>FASE 5: COLLAUDO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: 01/09/2023 16/11/2023</li> <li>FASE 2: 01/09/2023 16/11/2023</li> <li>FASE 3: 01/09/2023 16/11/2023</li> <li>FASE 4: 22/11/2023 22/11/2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASE 1: SI</li> <li>FASE 2: SI</li> <li>FASE 3: SI</li> <li>FASE 4: SI</li> <li>FASE 5: SI</li> </ul>	CONCLUSO	RENDICONTATO IN BODPE REGS IN FASE DI ULTIMAZIONE	

SCOGITTO ATTIVITA' PNR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNR	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (€000)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (€000)	PROGETTO PRESENTISTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (€000)	VALORI SU RISORSE PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
NO	131021001740001	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "A. SPOLITINI" IN VIA SAN DONATO.	LEGGE 160 DEL 27/12/2019, COME MODIFICATA CON D.L. 104/2020.			- €	- €	100.000,00 €	SI	100.000,00 €	64.481,59 €	86.995,08 €	PROGETTO AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Determinazione del P.S.T. n. 212 del 19/07/2021 Delibera G.C. n. 68 del 21/07/2021 Determinazione del P.S.T. n. 272 del 09/08/2021 Verbale D.L. del 17/08/2021 Verbale D.L. del 26/08/2022	SI	31/12/2022	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	
NO	131022000160006	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TECNOLOGIA (LED) E RISPARMIO ENERGETICO	Decreto-Legge 30.04.2019, n. 34 (D.L. Crescita)			- €	- €	50.000,00 €	SI	50.000,00 €	7.688,03 €	- €	PROGETTO AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Determinazione del P.S.T. n. 235 del 20/07/2022 Delibera G.C. n. 10 del 08/08/2022 Determinazione del P.S.T. n. 272 del 09/08/2021 Verbale D.L. del 14/09/2022	SI	31/12/2023		
SI	13422000190006	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DI INFANZIA E NIDO COSTITUENTE UN POLO DI INFANZIA	4	1	1.1	1.720.000,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	PROGETTO AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Determinazione del P.S.T. n. 130 del 28/03/2023 e 166 del 26/04/2023 Delibera G.C. n. - Determinazione del P.S.T. n. - Verbale D.L. del - Verbale D.L. del -	SI	30/06/2026		
SI	13422000150006	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANNA FRANK"	4	1	1.2	510.000,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	PROGETTO AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Determinazione del P.S.T. n. - Delibera G.C. n. - Determinazione del P.S.T. n. - Verbale D.L. del - Verbale D.L. del -	SI	30/06/2026		
SI	13422000150006	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO COMUNALE E TESORIERI	1	3	1.3	124.000,00 €	- €	31.000,00 €	NO	- €	- €	- €	PROGETTO AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Determinazione del P.S.T. n. 64 del 18/04/2023 e 76 del 10/05/2023 Delibera G.C. n. - Determinazione del P.S.T. n. - Verbale D.L. del - Verbale D.L. del -	SI	31/09/2024		

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CLP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro) <small>da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente</small>	IMPREGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE ALTRIE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI <small>indicare in successione per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma</small>	TERMINI ULTIMO PREVISTO <small>procedurale il termine ultimo di successione per ogni fase procedurale</small>	RESPECTO DEL TERMINE (SI/NO) <small>da compilare in successione per ogni fase procedurale</small>	DATA FINALE <small>indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento</small>	ATTIVITA' RELATIVE A B.C.G.S.	NOTE
SI	C49J2104600001	Via Roma: pavimentazione e realizzazione della commissione pedonale con viale Santa Rita	-	PNC sub-misura A3.1	-	€ 1.357.261,10	-	NO	112.094,89 €	50.320,08 €	-	PROGETTO AVVIATO	1) Affidamento incarico di progettazione 2) Approvazione della progettazione 3) Pubblicazione dei bandi di gara per l'esecuzione dei lavori 4) Avvio dell'esecuzione dei lavori	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	31/03/2026	-	-	-	
SI	C47H21008130001	Miglioramento accessibilità e sicurezza idrogeologica Via della Trinità 6a	-	PNC sub-misura A4.5	-	€ 445.319,30	-	NO	32.553,54 €	21.356,46 €	-	PROGETTO AVVIATO	1) Affidamento incarico di progettazione 2) Approvazione della progettazione 3) Pubblicazione dei bandi di gara per l'esecuzione dei lavori 4) Avvio dell'esecuzione dei lavori	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	31/03/2026	-	-	-	
SI	C41B21008400001	Crovia di S. Rita 2° Stralcio - itinerario tra turismo e devozione	-	PNC sub-misura A3.3	-	€ 2.643.167,77	-	NO	182.789,27 €	113.560,66 €	-	PROGETTO AVVIATO	1) Affidamento incarico di progettazione 2) Approvazione della progettazione 3) Pubblicazione dei bandi di gara per l'esecuzione dei lavori 4) Avvio dell'esecuzione dei lavori	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	31/03/2026	-	-	-	

SOGGETTO ATTUATORE PNR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISBURSATI SU ALTRE RISERVE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPONIBILI A VALERE SU PNR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
(SI/NO)									(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per ogni fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	da compilare in successione per ogni fase procedurale			
SI	ES6020000020001	PNRR MIS.2- RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMP. C4- RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO INDUSTRIALE INKST 2.2- INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (L. 160/2019, annualità 2020). INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO E MISURA IN SICUREZZA APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA DEL POZZO	2	4	2.2	50.000,00	0	0	SI	0	IMP. N.217 DEL 25/08/2020 € 5.983,36 IMP. N.243 DEL 10/09/2020 € 38.820,83 IMP. N.469 DEL 31/12/2021 € 1.143,53 IMP. N. 414 DEL 30/12/2020 € 4.072,28	€ 2.500,00 MANDATO N.1317 DEL 11/11/2022; € 5.023,36 MAND. N.139 DEL 09/02/2021; € 1.039,57 MAND. N.183 DEL 23/02/2021; € 12.600,00 MAND. N.134 DEL 23/02/2021; € 191,66 MAND. N.185 DEL 23/02/2021	1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3. AFFIDAMENTO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. 31/08/2020 2. 05/09/2020 3. 15/09/2020 4. 15/09/2021 5. 31/12/2021	1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. SI	31/12/2021				
SI	ES7421003070001	L.160/2019, Legge di Bilancio 2020, annualità 2021. Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla mobilità, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale-viale Martiri della Resistenza	2	4	2.2	110.000,00	0	3.227,15 (COMUNE)	SI	0	IMP. N.213 DEL 27/07/2021 € 2.574,00 IMP. N.321 DEL 02/11/2021 € 30,00 IMP. N.262 DEL 16/09/2021 € 24.090,84 IMP. N.279 DEL 31/12/2021 € 7.566,42 IMP. N.300 DEL 11/10/2022 € 3.036,88	€ 30,00 MAND. N.128 DEL 02/11/2021 € 2.574,00 MAND. N.265 DEL 28/02/2022 € 21.900,76 MAND. N.291 DEL 09/03/2022 € 17.816,51 MAND. N. 1288 DEL 12/10/2022 € 25.228,55 MAND. N.1289 DEL 12/10/2022	1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3. AFFIDAMENTO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. 25/07/2021 2. 15/09/2021 3. 15/09/2021 4. 31/03/2023 5. 31/12/2023	1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. NO (DA FARE)	31/03/2023				
SI	ES3E2200040006	PNRR MIS.2- RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMP. C4- TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INKST 2.2- INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (L. 160/2019). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE LOCALITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE: ZONA INDUSTRIALE E FIAZZ. BRUNA	2	4	2.2	50.000,00	0	0	NO	0	IMP. N.241 DEL 23/08/2022 € 3.202,50 IMP. N.296 DEL 05/10/2022 € 44.239,86 IMP. N.297 DEL 05/10/2022 € 2.567,64	€ 20.834,12 MAND. N.1504 DEL 29/11/2022	1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 3. AFFIDAMENTO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. 25/08/2022 2. 10/09/2022 3. 15/09/2022 4. 31/12/2023 5. 31/12/2023	1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. NO (DA FARE)	31/12/2023				Ancora non erogato il contributo nonostante l'implementazione dei dati in piattaforma
SI	ES5E22000210006	"REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN VIALE DEI MARTIRI DELLA RESISTENZA". PROGRAMMA DI INVESTIMENTI A VALERE SUL PNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1	4	1	1.1	704.467,53	0	0	NO	0				PROGETTO AVVIATO	1. AGGIUDICAZIONE LAVORI 2. AVVIO LAVORI 3. CONCLUSIONE LAVORI 4. COLAUDO	1. AGGIUDICAZIONE LAVORI ENTRO IL 31/05/2023 2. AVVIO LAVORI ENTRO IL 30/11/2023 3. CONCLUSIONE LAVORI ENTRO IL 31/12/2025 4. COLAUDO ENTRO IL 30/06/2026	in corso - da fare			
SI	ES5E2200050006	PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 "Realizzazione di una mensa scolastica a servizio della scuola primaria presso il plesso scolastico G. Parenti".	4	1	1.2	457.013,70	0	0	NO	0				PROGETTO AVVIATO	1. AGGIUDICAZIONE LAVORI 2. AVVIO LAVORI 3. CONCLUSIONE LAVORI 4. COLAUDO	1. AGGIUDICAZIONE LAVORI ENTRO IL 31/08/2023 2. AVVIO LAVORI ENTRO IL 30/11/2023 3. CONCLUSIONE LAVORI ENTRO IL 31/12/2025 4. COLAUDO ENTRO IL 30/06/2026	in corso - da fare			

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MBURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTIALI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	91F18000300001	lavori adeguamento sismico scuole dell'infanzia	4	1	3.3	479.498,11	0	0	SI	435.908,00 €	1) Indizione gara e autorizzazione a contrarre alla C.U.C. per lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico scuola dell'infanzia: € 1.734,00 2) Incarico tecnico per direzione lavori contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico della scuola dell'infanzia: € 45.678,32			AVVIATO	INIZIO LAVORI	mar-23	SI	dic-24	progetto inserito in REGIS	
SI	95E22000010006	lavori di realizzazione nuovo edificio da destinare ad asilo nido	4	1	1.1	919.600,00	0	0	NO					NON AVVIATO	AFIDAMENTO LAVORI	giu-23	SI	dic-24	progetto inserito in REGIS	
SI	95F14000590001	lavori di consolidamento centro abitato di Viceno	2	4	2.1b	1.046.100,00	0	0	NO					NON AVVIATO	AFIDAMENTO LAVORI	giu-23	SI	dic-24	progetto inserito in REGIS	
SI	9220009410001	efficientamento energetico palazzo comunale secondo piano	2	4	2.2	20.000,00	0	0	SI	20.000,00	1) Approvazione progetto esecutivo: 13.956,16 2) Affidamento servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di efficientamento energetico del palazzo comunale sala consiliare archivio in Castel Viscardo Piazza IV Novembre: 1.439,92 3) Affidamento servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di efficientamento energetico del palazzo comunale sala consiliare archivio in Castel Viscardo Piazza IV Novembre: 4.603,92	17.354,51 €		CONCLUSO	FINE LAVORI	ott-20	SI	ott-20	progetto inserito in REGIS	
SI	1944Z200070001	efficientamento energetico pubblica illuminazione capoluogo e pianlungo	2	4	2.2	50.000,00	0	0	SI	50.000,00	1) Incarico tecnico per progettazione, d.l. e coordinatore della sicurezza in tutte le fasi dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e patrimonio comunale del capoluogo e della frazione pianlungo oltre variata distribuzione det.136/2022: € 5.488,90 2) Affidamento per lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione aree del capoluogo e della frazione pianlungo oltre variata distribuzione di spesa det. n. 136/2022: € 27.872,59 3) Affidamento per lavori di fornitura e posa in opera arredo stradale area verde pubblico in pianlungo: € 16.638,51 4) Liquidazione incentivo al rup per lavori di illuminazione in castel viscardo capoluogo e della frazione pianlungo: € 70,18 5) Liquidazione incentivo al rup per lavori di efficientamento energetico con intervento sulla pubblica illuminazione in castel viscardo capoluogo e della frazione pianlungo: € 5,97 6) Liquidazione incentivo al rup per lavori di efficientamento energetico con intervento sulla pubblica illuminazione in castel viscardo capoluogo e della frazione pianlungo: € 5,97	44.195,72 €		CONCLUSO	FINE LAVORI	ago-22	SI	ago-22	progetto inserito in REGIS	
SI	95F21000800001	sistemazione area esterna piscina comunale	2	4	2.2	50.000,00	0	0	SI	50.000,00	1) Affidamento tecnico, tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza per messa in opera di opere di sistemazione area esterna piscina comunale ed edificio pubblico in castel viscardo capoluogo al geom. Materazzi Baffarelle: € 4.469,99 2) Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dell'area della piscina comunale alla ditta Edil.BI. di Milani Danilo: € 4.334,78 3) Affidamento lavori urgenti alla ditta Edil.BI. di Milani Danilo per l'intervento rete idrica della piscina comunale € 1.595,28 4) Liquidazione incentivo per lavori di manutenzione straordinaria dell'area della piscina comunale: € 473,39 5) Liquidazione incentivo per lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale: € 63,14 6) CPDR per lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale: € 35,03	46.096,05 €		CONCLUSO	FINE LAVORI	set-21	SI	set-21	progetto inserito in REGIS	
SI	198Z2000210001	efficientamento energetico pubblica illuminazione capoluogo, Viceno, Montebaliggio	2	4	2.2	30.000,00	0	0	SI	30.000,00	1) Affidamento lavori - efficientamento pubblica illuminazione - oltre perizia di variante: € 27.500,00 2) Compenso su progetto per lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione: € 288,98 3) Imp. su progetto per lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione € 24,55 4) Copia progetto per lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del capoluogo, Viceno, Montebaliggio, le Prese e loc. Alfina € 43.234,18	25.382,32 €		CONCLUSO	FINE LAVORI	ott-20	SI	ott-20	progetto inserito in REGIS	
SI	199Z20002190001	efficientamento energetico pubblica illuminazione Le Prese, Loc. Alfina, Montebaliggio e Viceno	2	4	2.2	50.000,00	0	0	SI	50.000,00	1) Affidamento lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del capoluogo, Viceno, Montebaliggio, le Prese e loc. Alfina € 43.234,18 2) Incarico tecnico di progettazione, d.l., per efficientamento energetico con intervento sulla pubblica illuminazione in Castel Viscardo capoluogo e delle frazioni di Viceno, Montebaliggio e delle località le Prese e Alfina: € 5.566,02 3) Impiego di spesa per lavori urgenti ed imprevidi di adeguamento ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del capoluogo e frazioni di Viceno, Montebaliggio, le Prese e loc. Alfina: € 601,37 4) Comune di Alterona Liquidazione incentivo per lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo e frazioni € 688,06 5) Dipendenti Comuni Compenso incentivo per lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo e frazioni: € 66,55 6) Tesoreria prov. termi CPDR Incentivo per lavori di	44.999,92 €		CONCLUSO	FINE LAVORI	set-21	SI	set-21	progetto inserito in REGIS	
SI	191C20000000006	Abilitazione al Cloud	1	1	1.2	62.690,00 €			NO					NON AVVIATO	AFIDAMENTO SERVIZIO	31/12/2023	SI	31/12/2023		
SI	ES1F2003780006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE	1	1	1.4	14.000,00 €			NO					NON AVVIATO	AFIDAMENTO SERVIZIO	31/12/2023	SI	31/12/2023		
SI	191F2003770006	RAFFORZAMENTO DELL'APPLICAZIONE IO	1	1	1.4.3	6.075,00 €			NO					NON AVVIATO	AFIDAMENTO SERVIZIO	31/12/2023	SI	31/12/2023		

SOGGETTO ATTUATORE PNR	CLUP	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREDISPOSTO	IMPORCO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO PNR AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL NETTO PNR AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/N)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS E CIRCOLA	NOTE
SI	D7F2200220006	PA DIGITALE 26 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE IDENTITA' DIGITALE - PA DIGITALE 26 - ATTIVAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)	1	1.14.4	14.000,00				NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - 25/11/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 31/05/2023	CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISTA 31/05/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 31/05/2024	SI	31/05/2024	PATTAFORMA PA DIGITALE 26		
SI	D7F2200220006	PA DIGITALE 26 - ATTIVAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)	1	1.12	47.427,00				NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - 11/09/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 9 MESI DALLA DATA DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO	CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISTA 11/09/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 31/12/2024	SI	31/12/2024	PATTAFORMA PA DIGITALE 26		
SI	D7F2200220006	PA DIGITALE 26 - PATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1.14.5	25.147,00				NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - 05/09/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 6 MESI DALLA DATA DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO	CONTRATTUALIZZAZIONE EFFETTUATA IL 31/03/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 30/09/2023	SI	30/09/2023	PATTAFORMA PA DIGITALE 26		
SI	D7F22003370006	PA DIGITALE 26 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1.14.1	79.922,00				NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - 03/07/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 9 MESI DALLA DATA DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO	CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISTA 31/05/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 28/02/2024	SI	28/02/2024	PATTAFORMA PA DIGITALE 26		
SI	D5F22005800006	PA DIGITALE 26 - PATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	1	1.13.1	10.172,00			10.172,00	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE - 02/09/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 6 MESI DALLA DATA DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO	CONTRATTUALIZZAZIONE - DATA PREVISTA 31/05/2023 CONCLUSIONE PROGETTO - 30/11/2023	SI	30/11/2023	PATTAFORMA PA DIGITALE 26		
SI	D7F22000000002	"INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE A ROCCHETTA E VARE LOC DEL TERRITORIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO	2	4.12.2	EURO 19.798,00	NO	EURO 372.76,81	NO	NO	Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. mede opere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione 6 - Transizione ecologica e resilienza" del Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno	Il progetto è stato avviato a seguito della conclusione del contributo per la ricostituzione del patrimonio culturale del 2016 finanziato con O.C. n. 37/2017	EURO 2.474,93 Mand. 491 del 23/06/2021 EURO 607,73 Mand. 511 del 18/07/2021 CAPITOLO 02701 (TO)ALE AL 31/12/2022 - EURO 3.082,06	EURO 8.756,60 Mand. 1085 del 28/11/2019 EURO 2.525,83 Mand. 1086 del 28/11/2019 EURO 2.090,27 Mand. 728 del 11/09/2020 EURO 38.029,48 Mand. 219 del 09/07/2021 EURO 450,46 del 07/06/2021 EURO 72.020,52 Mand. 149 del 12/09/2021 EURO 54.620,63 Mand. 1308 del 25/12/2022 EURO 1.872,00 Mand. 810 del 24/09/2022 EURO 1.872,00 Mand. 810 del 24/09/2022 EURO 1.872,00 Mand. 810 del 24/09/2022 EURO 254.184,53	AVVIATO	1. APPROVAZIONE REVISIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INNE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE REVISIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 20/07/2020 3. INNE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE (COLLAUDO) ENTRATO 09/2023	1. SI 2. SI 3. NO (DA FARE) 4. NO (DA FARE)	20/09/2023	SUI REGIS PER QUESTO CUP: DPACR00000002 CI CHIEDONO DI RENDICONTARE IL PROGETTO TOILE CERA NON E' POSSIBILE LA PARTE CHE NON CONFLUISCE SUL PNR E CIA' RENDICONTATA SU ALTIRA PATTAFORMA E AD ALTRO CUP CREDIAMO CHE SIAMO TENUTI A RENDICONTARE SU REGIS SOLO LA QUOTA PARTE CHE CONFLUISCE SUL PNR (COSTA 20.000,00 EURO) SOLLECITA CHIARIMENTI E SUCCESSIVA MODIFICA NON ABBIAMO NOTIZIE IN MERITO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALEI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI CONFLUITI SUL PNR IN MANIERA DEFINITIVA.	
SI	D7F22000670001	"INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE A ROCCHETTA E VARE LOC DEL TERRITORIO	2	4.12.2	EURO 30.220,00	NO		NO	NO	Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. mede opere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione 6 - Transizione ecologica e resilienza" del Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	CONCLUSO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INNE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 14/09/2020 3. INNE LAVORI 18/06/2021 4. RENDICONTAZIONE FINALE (COLLAUDO) 14/07/2021	SI	14/07/2021	SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SOLO OKA PER QUESTO CUP DPACR00000002 ABBIAMO RICEVUTO SU TEMPO DEL FINANZIAMENTO CHE RISULTA AD OGGI EURO 10000,00 MENTRE PRIMA CI DAVA IMPERMEABILITA' EURO 30.220,00		
SI	D7F22000800001	"INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE A ROCCHETTA E VARE LOC DEL TERRITORIO	2	4.12.2	EURO 65.000,00	NO		NO	NO	Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. mede opere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione 6 - Transizione ecologica e resilienza" del Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	EURO 30,00 Mand. 1090 del 07/11/2022 CAPITOLO 02701 (TO)ALE AL 31/12/2022 - EURO 2679 EURO 28.298,81 Mand. 1006 del 28/09/2021 EURO 3.150,00 Mand. 1007 del 20/12/2021 CAPITOLO 02702 (TO)ALE AL 31/12/2022 - EURO 31.659,19	CONCLUSO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INNE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 08/09/2021 3. INNE LAVORI 15/09/2021 4. RENDICONTAZIONE FINALE 21/09/2023	SI	21/09/2023	SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALEI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI CONFLUITI SUL PNR IN MANIERA DEFINITIVA.		
SI	D7F22000960002	"INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (PICCOLE OPERE) - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE A ROCCHETTA E VARE LOC DEL TERRITORIO	2	4.12.2	EURO 37.000,00	NO	EURO 80.000,00	EURO 80.000,00	NO	Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge del 27 dicembre n. 160/2019 (cd. mede opere e piccole opere) successivamente confluito nella "Missione 6 - Transizione ecologica e resilienza" del Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune" in capo al Ministero dell'Interno	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	EURO 30,00 Mand. 1089 del 07/11/2022 CAPITOLO 02703	AVVIATO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INNE LAVORI 4. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 09/09/2021 3. INNE LAVORI 15/09/2021 4. RENDICONTAZIONE FINALE 31/03/2023	SI	31/03/2023	SUI REGIS ABBIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SULL'ACCESSO CHE DOPO MOLTE MAIL SIAMO RIUSCITI A RICEVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALEI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI CONFLUITI SUL PNR IN MANIERA DEFINITIVA.		



SI	D77H1900610001	"INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI OPERATIVI" - MISURA 154 - AZIONE 154.1 - INTERVENTO SOTTOSETTORIALE "SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO". CONSOLIDAMENTO VERSANTE A RISCHIO FRANA PRESSO LA ZONA COMUNALE DI FORCATURA	2	4.122	EURO 950.000,00	NO	NO	Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 145/2018 (misure urgenti in materia di calamità 2018) e di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (semplice riforma del sistema di finanziamento del conflitto nella "Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Investimenti 2.1: Investimenti per la ricerca, didattica, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni" in capo al Ministero dell'Interno)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	EURO 35.099,01 Mand. 544 CAPITOLI QU2561 EURO 75,610 Mand. 1.006 del 05/10/2022 CAPITOLI QU2561 EURO 1.000 Mand. 1.002 del 22/12/2022 CAPITOLI QU2561 EURO 7,402 Mand. 1.303 del 22/12/2022 CAPITOLI QU2561 EURO 1,000 Mand. 1.002 del 03/11/2022 (TOTALE AL 31/12/2022: - EURO 36.566,17)	NESSUNO	AVVIATO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	AVVIATO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	13/08/2023	SI	SU REGRE ABRIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SU ACCIAIO E SULLI MOLTI MAI SCAMBI RISCITI A RISOLVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI IN MANIERA LIBERATIVA.	SU REGRE ABRIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SU ACCIAIO E SULLI MOLTI MAI SCAMBI RISCITI A RISOLVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI IN MANIERA LIBERATIVA.	1) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/12/2022 A LORO DO IVA EURO 5.709,60 2) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/03/2023 A LORO DO IVA EURO 194.493,4 TOTALE PAGAMENTI DEPOSITI SU RIS. FNRR A LORO DO IVA EURO 200.203,00	1) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/12/2022 A LORO DO IVA EURO 5.709,60 2) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/03/2023 A LORO DO IVA EURO 194.493,4 TOTALE PAGAMENTI DEPOSITI SU RIS. FNRR A LORO DO IVA EURO 200.203,00	
SI	D77H2200150006	"INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI OPERATIVI" - MISURA 154 - AZIONE 154.1 - INTERVENTO SOTTOSETTORIALE "SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO". CONSOLIDAMENTO VERSANTE A RISCHIO FRANA PRESSO LA ZONA COMUNALE DI FORCATURA	2	4.122	EURO 30.000,00	NO	NO	Intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 145/2018 (misure urgenti in materia di calamità 2018) e di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (semplice riforma del sistema di finanziamento del conflitto nella "Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Investimenti 2.1: Investimenti per la ricerca, didattica, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni" in capo al Ministero dell'Interno)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	NESSUNO	AVVIATO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	AVVIATO	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	1. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 2. AFFIDAMENTO LAVORI 3. INIZIO LAVORI 4. FINE LAVORI 5. RENDICONTAZIONE FINALE	31/12/2023	1. SI 2. SI 3. NO (DA FARE) 4. NO (DA FARE)	SU REGRE ABRIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SU ACCIAIO E SULLI MOLTI MAI SCAMBI RISCITI A RISOLVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI IN MANIERA LIBERATIVA.	SU REGRE ABRIAMO RECONTRATO FINO A POCO TEMPO FA PROBLEMI SU ACCIAIO E SULLI MOLTI MAI SCAMBI RISCITI A RISOLVERE DA POCO SIAMO IN ATTESA DEI NUOVI MANUALI PER POTER AL MEGLIO RENDICONTARE I LAVORI IN MANIERA LIBERATIVA.	1) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/12/2022 A LORO DO IVA EURO 5.709,60 2) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/03/2023 A LORO DO IVA EURO 194.493,4 TOTALE PAGAMENTI DEPOSITI SU RIS. FNRR A LORO DO IVA EURO 200.203,00	1) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/12/2022 A LORO DO IVA EURO 5.709,60 2) PAGAMENTI TOT. DEPOSITI A VALERE SU RIS. FNRR AL 31/03/2023 A LORO DO IVA EURO 194.493,4 TOTALE PAGAMENTI DEPOSITI SU RIS. FNRR A LORO DO IVA EURO 200.203,00		
SI	D77H2100620001	MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne	5	3 A3.1	NO	EURO 1.265.000,00	NO	Intervento FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 7 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP																
SI	D77H21006710001	MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne	5	3 A3.1	NO	EURO 345.000,00	NO	Intervento FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 7 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP																
SI	D77H21006560001	MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne	5	3 A3.1	NO	EURO 460.000,00	NO	Intervento FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 7 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP																
SI	D77H21006720001	MECS - Interventi speciali per la coesione territoriale - Strategia nazionale per le aree interne	5	3 A4.5	NO	EURO 144.000,00	NO	Intervento FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI SESMA 2016 N. 6 DEL 30/12/2021 - SOGGETTO A RENDICONTAZIONE PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE TRAMITE PIATTAFORMA BDAP																

ORDINANZA N. 129 DEL 13 DICEMBRE 2022 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA PER I COMUNI MAGGIORMENTE COLPITI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO E UMBRIA - ALLEGATO A - O.C. N. 129 13/12/2022 ENTE PROPRIETARIO - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO						
Intervento	ID Opera	Categoria	Titolarietà	Termine previsto	Importo	Fase di Attuazione
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPARAZIONE E RECUPERO DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DE LIBERA" È IDENTIFICATO DAL CUP: D77B2200220001.	OOPT_FI_2021_UMB_082	11 - Altre opere Pubbliche	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	700.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN LARGO CARDUCCI - VIA PASCOLI - VIA MAMMINA -CUP: D75F22000610001	NLUOVA OPERA UMB_015_1	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	480.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA TORRE DI TRIPONZO-CUP: D76F22000130001	NLUOVA OPERA UMB_015_6	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	350.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZA GARIBALDI -CUP:D75F21001200001	NLUOVA OPERA UMB_015_4	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	500.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CIRCONVALLAZIONE - CUP:D72C21000780001	OOPT_FI_2021_UMB_081	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	150.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A RETE E MURI DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE IN VIA SANTA MARIA DE LIBERA - CUP:D77H21007110001	custom_517	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	650.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A RETE IN LOCALITÀ BUGLIANO - CUP:D77H22000850001	custom_832	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	400.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA CONNESSA AL SISMA -RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A RETE PRESSO IL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI FORCATURA - CUP:D78B2200230001	custom_832	9 - Opere di Urbanizzazione e Infrastrutture	COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016	30/03/2026	250.000,00	AFF.SERVIZI TECNICI 31/03/2023

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTENTE	IMPORTO PRECEDENTI MESSE IN FINANZIAMENTO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R-GIS	NOTE
SI	ZJ122000680006	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.2	77.897,00	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORI	45080	SI	45080	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 12006422c_0845Comunedicollazone	IN FASE DI DEFINIZIONE LA SCELTA E CONTRATTAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI REALIZZATORI RUP BALDINI FEDERICA RTD
SI	ZJ122001430006	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.4.1	79.922,00	0	NO	0	0	0	AVVIATO	CONSEGNA PRODOTTO DA PARTE DEL FORNITORE	45269	SI	45269	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14100422c_0845Comunedicollazone	PROGETTO CONSEGNATO, AVVIATA FASE CONSUNTIVAZIONE SU PAZ026 MANCA DEFINIZIONE PIANO FORMATIVO 25 ORE. GIA' ACQUISTATO - IN FASE DI ACQUISTO DA PARTE DEL FORNITORE PUNTO ZERO SCARIL NON HA ANCORA FATTURATO I SERVIZI CHE AMMONTANO AD EURO 1.845,00 E PERTANTO NON SONO STATI DISPOSTI PAGAMENTI, IMPORTO A RESIDUO - RUP BALDINI FEDERICA RTD
SI	ZJ122003100006	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.4.4	14.000,00	0	SI	0	0	€ 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA) DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 500,00 MANDATO 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA - PRODOTTO CONSEGNATO - VANNO TERMINATE LE ATTIVITA' PER Piano formativo per l'evoluzione tecnologica delle piattaforme di identità digitale SPID e CIE	45196	SI	45196	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14400422c_0845Comunedicollazone	
SI	ZJ122002110006	1.4.3 - Imp. ID - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.4.3	2.916,00	0	SI	0	0	€ 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA) DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 732,00 MANDATO 48 DEL 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022	IN VERIFICA	ESPIRATE TUTTE LE FASI PREVISTE, IN ATTESA DI ESITO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	45089	SI	45026	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ02614300422c_0845Comune diCollazone	Il progetto è in fase di valutazione da parte del DTD - RUP BALDINI FEDERICA RTD
SI	ZJ122004310006	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	1	1	1.4.5	23.147,00	0	NO	0	0	0	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA	45077	SI	45229	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14500922c_0845Comunedicollazone	PROGETTO AVVIATO, CONTRATTAZIONE, STA LAVORANDO - RUP BALDINI FEDERICA RTD
SI	ZJ122004940006	1.4.3 - PaginePA COMUNI (settembre 2022)	1	1	1.4.3	4.856,00	0	SI	0	0	0	DA AVVIARE	IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI	45180		45420	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 14300922c_0845Comunedicollazone	
SI	J5122008530006	1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale DH - acquisto di 1 servizio	1	1	1.3.1	10.172,00	0	NO	0	0	0	DA AVVIARE	IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI	45126		45306	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 131X1022c_0845Comunedicollazone	
SI	Z2122000330006	PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022. "PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO DIVISA A CAPITOLI IN FRAZ. COLLEPEPE E TRATTO IN FRAZ. PECOROLE-PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022.	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0	NO	0	0	0	AVVIATO	SOSPENSIONE LAVORI				RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	
SI	Z2122000540006	PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023. "PUBBLICA ILLUMINAZIONE: VIA TEVERE E PARTE DI VIA PERUGINA IN FRAZIONE COLLEPEPE-PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO					RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	
SI	Z2122000540006	PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024. "PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO COLLEPEPE-PNRR-M2.G4.12.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024.	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0	NO	0	0	0	NON AVVIATO					RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	
SI	Z4122000590001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETI DEL "GAGLIETI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETI	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2. interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0	SI	0	0	0	AVVIATO	RENDICONTAZIONE				RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	

SI	J24118000100001	STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PIEDICOLLE STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PIEDICOLLE	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	225.000,00	SI													RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J25F21000670001	MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE COLLEPEPE'S, STEFANO MESSA IN SICUREZZA	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	20.000,00	SI													RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J27H22001490001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALTA* CASALTA* CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALTA* MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALTA	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	80.000,00	SI													RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J27H22001490001	PNRR M2 C412.2B - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA S.C. N. 2 DI VALMORTELLA* BONIFICA DISSESTO IDROGEOLOGICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1.B. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	200.000,00	NO													RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J28H22000800006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASI NIDO IN FRAZ. CASALTA* FRAZ. CASALTA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASI NIDO IN FRAZ. CASALTA	M4	C4: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle università	I1.1 Piano per asili nido e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	840.000,00	NO													RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPECTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE	
(SI/NO)									(SI/NO)											
SI	J21C22000680006	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.2	77.897,00			NO	0	0	0	NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORI	45080	SI	45080	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_120X0422C_0845Comunedicolazione	IN FASE DI DEFINIZIONE LA SCELTA E CONTRATTUALIZZAZIONE DI TUTTI SOGGETTI REALIZZATORI - RUP BALDINI FEDERICA RTD	
SI	J21F22001430006	1.4.1 - Esperienza del Cirkadino - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.4.1	79.922,00			NO	0	0	0	AVVIATO	CONSEGNA PRODOTTO DA PARTE DEL FORNITORE	45269	SI	45269	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_143X0422C_0845Comunedicolazione	PROGETTO AVVIATO, FORNITORE CONTRATTUALIZZATO, STA LAVORANDO RUP BALDINI FEDERICA RTD	
SI	J21F22002100006	1.4.4 - SPID CE - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.4.4	14.000,00			SI	0	0	€ 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 732,00 MANDATO 48 DEL 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022	CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA - PRODOTTO CONSEGNA - VANNO TERMINATE LE ATTIVITA' PER PIANO FORMATIVO PER L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE PIATTAFORME DI IDENTITÀ DIGITALE SPID E CIE	45196	SI	45196	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_144X0422C_0845Comunedicolazione	PRODOTTO CONSEGNA, AVVIATA FASE CONSUNTIVAZIONE SU PAZ026, MANCA DEFINIZIONE PIANO FORMATIVO 25 ORE, GIA' ACQUISTATO - IN FASE DI FRUIZIONE DA PARTE DEL PERSONALE - SPEGNOLA CHE IL FORNITORE PUNTO ZERO SCARL, NON HA ANCORA FATTURATO I SERVIZI RESI CHE AMMONTANO AD EURO 1.843,00 E PERTANTO NON SONO STATI DISPOSTI PAGAMENTI, IMPORTO A RESIDUO - RUP BALDINI FEDERICA RTD		
SI	J21F22002110006	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	1	1	1.4.3	2.916,00			SI	0	0	€ 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA DI CUI EURO 366,00 MANDATO 41 DEL 25/01/2022, € 732,00 MANDATO 48 DEL 25/01/2022, EURO 366,00 MANDATO 18/02/2022	ESPETATE TUTTE LE FASI PREVISTE, IN ATTESA DI ESITO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	45089	SI	45026	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_143X0422C_0845Comunedicolazione	Il progetto è in fase di valutazione da parte del DTG - RUP BALDINI FEDERICA RTD		
SI	J21F22004940006	1.4.5 - Nofliche Digitali - Comuni - Settembre 2022	1	1	1.4.5	23.147,00			NO	0	0	0	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE FATTA	45077	SI	45229	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_145X0922C_0845Comunedicolazione	PROGETTO AVVIATO, FORNITORE CONTRATTUALIZZATO, STA LAVORANDO RUP BALDINI FEDERICA RTD	
SI	J21F22004940006	1.4.3 PagineA.COMUNI (settembre 2022)	1	1	1.4.3	4.856,00			SI	0	0	0	DA AVVIARE	IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI	45180		45420	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_143X0922C_0845Comunedicolazione	RUP BALDINI FEDERICA RTD	
SI	J51F22008630006	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale DAI - acquisto di 1 servizi	1	1	1.3.1	10.172,00			NO	0	0	0	DA AVVIARE	IN FASE DI ANALISI OFFERTE RICEVUTE DA FORNITORI	45126		45306	RIFERIMENTO REGIS DA PORTALE PAZ026 PAZ026_131X1022C_0845Comunedicolazione	RUP BALDINI FEDERICA RTD	
SI	J22E22000530006	PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. TRATTO DI VIA A. CAPITINI IN FRAZ. COLLEPE E TRATTO IN FRAZ. PIEDICOLLE *PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022.	M2		2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00			NO				AVVIATO	SOSPENSIONE LAVORI					RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	
SI	J22E22000530006	PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. *PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO CONCLUSIVO DI VIA PERUGINA IN FRAZIONE DI COLLEPE *PNRR-M2-C4-I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024.	M2		2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00			NO				NON AVVIATO						RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	
SI	J24E20000590001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE *GAGLIETOLE *MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE	M2		I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e della efficienza energetica dei Comuni	50.000,00			SI				AVVIATO	RENDICONTAZIONE					RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GU ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE	

SI	J2418000100001	STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA, BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE MEDICO LE STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA/BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PIEDICOLLE	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	225.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	SI	NO	NESSUNO	AVVIATO	SOSPENSIONE LAVORI			RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J25F1000670001	MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE COLLEPEPE S. STEFANO/MESSA IN SICUREZZA	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	20.000,00				20.000,00	SI			AVVIATO	LAVORI CONCLUSI			RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J27H21004870001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA/CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA/MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	80.000,00				80.000,00	SI			AVVIATO	LAVORI CONCLUSI			RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J27H22001490001	PNRR M2 C4 I2 1B - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA/ S.C. N. 2 DI VALMORTELLA/ BONIFICA DISSESTO IDROGEOLOGICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1.B: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	200.000,00				200.000,00	NO			NON AVVIATO				RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J28H22000080006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELASLO NIDO IN FRAZ. CASALALTA/ FRAZ. CASALALTA/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELASLO NIDO IN FRAZ. CASALALTA	M4	C1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	840.000,00				840.000,00	NO			AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI			RUP SARA MORETTI - SI RIPORTANO GLI ESTREMI DEI PROGETTI PNRR DELL'AREA OPERE PUBBLICHE, CHIEDENDO UNA PROROGA DI UNA SETTIMANA PER POTER INSERIRE I DATI MANCANTI, CAUSA CARENZA DI PERSONALE E SCADENZE INDEROGABILI DA RISPETTARE
SI	J2ZE22000230006	PNRR-M2.C4.I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022. *PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO DI VIA A. CAPITINI IN FRAZ. COLLEPEPE E TRATTO IN FRAZ. PIEDICOLLE*/PNRR-M2.C4.I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2022.	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	NO		LIQUID 9877/2022 - 1.800,00 € - DOP 28/09/2022 // IMP 240/2022 - 39.438,79 € - COSMOS CONSALVI SRL - DOP 31/15/09/2022	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2023	SI	RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI - SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI
SI	J2ZE22000530006	PNRR-M2.C4.I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023. *PUBBLICA ILLUMINAZIONE: VIA PERUGINA IN FRAZIONE DI COLLEPEPE*/PNRR-M2.C4.I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	NO			NON AVVIATO			31/12/2024	RUP ARCH. SARA MORETTI - SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI
SI	J2ZE22000540006	PNRR-M2.C4.I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024. *PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRATTO CONCLUSIVO DI VIA PERUGINA IN FRAZIONE COLLEPEPE*/PNRR-M2.C4.I2.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024.	M2	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	NO			NON AVVIATO			31/12/2025	RUP ARCH. SARA MORETTI - SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI

SI	J24E20000590001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE-GAGLIETOLE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO GAGLIETOLE	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione one del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	50.000,00	0,00	0,00	SI	IMP. 167/2020 - 4.973,70 € - ASS. PROF. UTO STUDIO ARCH. GIULIA DE GIOIA DE LEO / IMP. 181-S/2020 - 43.460,39 € - EDILIZIA F.LLI GRANIERI SRL	LIQUID. 459/2021 - 2.657,69 € - ASS. PROF. UTO STUDIO ARCH. GIULIA DE LEO - LVA 320/2021 / LIQUID. 71/2022 - 1.590,13 € - ASS. PROF. UTO STUDIO ARCH. GIULIA DE LEO - LVA 38/2022 / LIQUID. 213/2022 - 30.509,44 € - EDILIZIA F.LLI GRANIERI SRL - LIQ. 213/2022	NESSUNO	AVVIATO - CONCLUSO	RENDICONTAZIONE	SI	31/12/2021	RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI
SI	J24I18000100001	STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA, BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PREDICOLLE STRADA COMUNALE N° 24 DELL'ACQUASANTA-BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PREDICOLLE	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione one del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	225.000,00	0,00	0,00	SI	IMP. FPV 351/2021 - 45.000,00 € - CNP COSTRUZIONI SRL + IMP. 352/2021 - 42.948,64 € + IMP. 476/2021 - 125.801,36 € - CNP COSTRUZIONI SRL	LIQUID. 442/2022 + 443/2022 - 42.000,00 € - CNP COSTRUZIONI SRL - LIQ. 18.24/06/2022 / LIQUID. 569/2022 - 65.500,00 € - CNP COSTRUZIONI SRL - LIQ. 21 05/08/2022	U 3817-21 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DELLE FINANZE DEL 31.08.2020 FINANZIAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRADA COMUNALE N. 24 DELL'ACQUASANTA - BONIFICA IDROGEOLOGICA IN FRAZ. PREDICOLLE - IMP. 584/2020 - 12.688,00 € - 20.272,45 € - ING. FABRIZIO GENTILI	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI		31/12/2023	RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI
SI	J25F1000670001	MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE COLLEPEPE S. STEFANO/MESSA IN SICUREZZA	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione one del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	20.000,00	0,00	0,00	SI	IMP. 197/2021 - RE 11.917,47 € + FPV 2.406,95 € - DOP 20/2021 - IMP. 190/2021 - FPV 4.052,31 € - DOP 18/2021 - IMP. 480/2021 - FPV 1.623,27 € - DOP 20/2021	LIQUID. 129/2022 - 10.834,06 € - R.A. COSTRUZIONI SRL - DOP 102/2022	NESSUNO	AVVIATO	LAVORI CONCLUSI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE		31/03/2023	RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI
SI	J27H21004870001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA/MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI COLLAZZONE E CASALALTA	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione one del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	80.000,00	0,00	0,00	SI	IMP. 243/2021 - RE 14.249,55 € + FPV 2.537,60 € - DOP 21/2021 - IMP. 251/2021 - RE 33.660,00 € + FPV 26.297,38 € - DOP 21-25/2021 - IMP. 479/2021 - FPV 3.225,47 € - DOP 25/2021	LIQUID. 215/2022 - 11.230,73 € - ING. FABRIZIO GENTILI - LIQ. 13 21/03/2022 / LIQUID. 271/2022 - 30.600,00 € - ESETTI SRL - LIQ. 16 05/04/2022	NESSUNO	AVVIATO	LAVORI CONCLUSI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE		31/03/2023	RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI
SI	J27H22001490001	PNRR M2 C4 I2 IB - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA/S.C. N. 2 DI VALMORTELLA/BONIFICA DISSESTO IDROGEOLOGICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 DI VALMORTELLA	M2	C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1.B: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	200.000,00	0,00	0,00	NO	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI		30/06/2024	RUP ARCH. SARA MORETTI - SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI	
SI	J28H2200080006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELASILO NIDO IN FRAZ. CASALALTA/FRAZ. CASALALTA/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELASILO NIDO IN FRAZ. CASALALTA	M4	C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	840.000,00	0,00	0,00	NO	NESSUNO	NESSUNO	NON AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA		31/12/2025	RITARDO NELLE ATTIVITA' REGIS PER CRITICITA' LEGATE ALLA CARENZA DI PERSONALE - RUP ARCH. SARA MORETTI SUPPORTO RUP ING. LUCA ANTONELLI	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MSURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	J46G2000120001	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2020: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLA COL DE' CANALI E DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COSTACCIARO	2	4	2.2	43.450,56	0	0	SI	43.450,56	43.450,56	€ 35.615,21	N.A.	AVVIATO	CONCLUSO	N.A.	SI	N.A.	Nonostante il progetto sia stato redatto e inserito in ADOP Unigrafi / BDP - MOP in RGIS i dati non sono riportati	Indicare eventuali criticità riscontrate
SI	J45F21001190001	UTILIZZO DELLE ECONOMIE DEL PROGETTO CUP J46G2000120001 PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI LOCALI COMUNALI IN LOCALITA' DEL INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN LOC. BADIJA"	2	4	2.2	6.549,44	0	2234,56	SI	6.549,44	6.549,44	€ 5.368,39	2234,56	AVVIATO	CONCLUSO	N.A.	SI	N.A.	Il CUP non è visibile dal profilo in RGIS	
SI	J47H2100040001	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2021: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MURLO DI CONTENIMENTO A VALLE"	2	4	2.2	100.000,00	0	0	SI	100.000,00	100.000,00	€ 80.807,99	N.A.	AVVIATO	CONCLUSO	N.A.	SI	N.A.		
SI	J44H2200060006	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2022: INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COSTACCIARO"	2	4	2.2	50.000,00	0	0	SI	50.000,00	50.000,00	€ 0,00	N.A.	AVVIATO	CONCLUSO	N.A.	SI	N.A.	Il CUP non è ancora visibile dal profilo in RGIS nonostante l'anomalia sia stata comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato	
SI	J43H19000930001	Contributo ex art. 1, comma 139 e s.l. n. 160/2019: decreto di assegnazione del 23/02/2021: INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA" SOSTITUIBILE OMOLOGICO ALL'ORDINE DEL NOVEMBRE 2013 CHE HANNO INTERESSATO LA FRAZ. DI COSTA SAN SAVINGO E LA STRADA COMUNALE DI "COLDARELLO"	2	4	2.2	985.000,00	0	0	SI	985.000,00	985.000,00	€ 0,00	N.A.	AVVIATO	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI 31/07/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2024	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI: TERMINE AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI 31/07/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2024	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI: TERMINE AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI 31/07/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2024	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI: TERMINE AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/03/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI 31/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI 31/07/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2024	Il CUP non è ancora visibile dal profilo in RGIS nonostante l'anomalia sia stata comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato	
SI	J44H22001010006	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2023: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COSTACCIARO	2	4	2.2	50.000,00	0	0	NO	0,00	0,00	€ 0,00	N.A.	NON AVVIATO	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 15/09/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2024	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 15/09/2023 - CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2024	N.A.	31/12/2024	Il CUP non è visibile dal profilo in RGIS	
SI	J44H22001020006	CONTRIBUTO ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ANNUALITA' 2024: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COSTACCIARO	2	4	2.2	50.000,00	0	0	NO	0,00	0,00	€ 0,00	N.A.	NON AVVIATO	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 15/09/2024 - CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2025	AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 15/09/2024 - CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2025	N.A.	31/12/2025	Il CUP non è visibile dal profilo in RGIS	
SI	J41F22004300006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	1	1	1.4.1	79.922,00	0	0	NO	0,00	0,00	€ 0,00	0	NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 180 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	N.A.	
SI	J41C22001780006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELLA MANIFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE N. 9 SERVIZI A MIGRARE	1	1	1.2	47.427,00	0	0	NO	0,00	0,00	€ 0,00	0	NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	INSERIMENTO CUP: 5 giorni dalla data di notifica PEC dell'ammissibilità della domanda - CONTRATTAZIONE DEL FORNITORE: 270 giorni dalla notifica della PEC del finanziamento - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA': 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	N.A.	



SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CLP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURA	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE FINANZIARIE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	C13H19000550001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CIMITERIALE DI FABRO CAPOLUOGO	2.2	4	2.2	730.000,00	0,00	0,00	SI	730.000,00	730.000,00	0,00	375,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	27/04/2021	SI			
SI	C14D2200960006	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI	2.2	4	2.2	50.000,00	0,00	0,00	SI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	25/08/2022	SI	31/03/2024	NON PRESENTE SU REGIS	
SI	C13I21032740001	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DENOMINATO LE COCCHELLE IN VIA GIOVANNI XXIII N. 23 - FABRO, SCALO	2.2	4	2.2	100.000,00	0,00	0,00	SI	100.000,00	100.000,00	0,00	88.699,29	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	25/08/2021	SI			
SI	C17H20001170001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - Articolo 1, comma 29-37, Legge n. 160/2020 - D.M. 14.01.2020	2.2	4	2.2	50.000,00	0,00	0,00	SI	50.000,00	48.416,34	0,00	38.614,44	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	03/08/2020	SI			

SI	C11F22002130006	APPID	1	1	1.4.3	2.187,00	0,00	0,00	0,00	no	2.187,00				avviato	Affidamento esecuzione progetto	09.02.2023	si	45200	
SI	C11F22002470006	PAGO PA	1	1	1.4.3	4.249,00	0,00	0,00	0,00	NO					avviato	Affidamento esecuzione progetto	11.05.2023	SI	45290	
SI	C11F22004530006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	1.4.5	23.147,00	0,00	0,00	0,00	NO					non avviato		30.05.2023			
SI	C11F22002480006	SPID OIE	1	1	1.4.4	14.000,00	0,00	0,00	0,00	NO					non avviato		27.11.2023			
SI	C11F22003820006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	1.4.1	79.922,00	0,00	0,00	0,00	NO					non avviato		03.07.2023			
SI	C11C22001550006	ABILITAZIONE CLOUD	1	1	1.2	72.828,00	0,00	0,00	0,00	NO					non avviato		12.06.2023			

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORITO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORITO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORITO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI TRASPORTATI IN PR. AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DEFONDIATI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RAGIS	NOTE
SI	F21B21006420001	PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.1: RIGENERAZIONE URBANA "CENTRO FERENTILLO: PIAZZA AGORA" - BOSCO URBANO - FERENTILLO E-PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.2: INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO AL SINDACO CENTROLIBIANO.	M5	3 A-3.1	0,00	1.207.500,00	0,00	93.707,52	NO	0,00	264.259,13	-	-	Avviato	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	F21B210065790001	PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.2: INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO AL SINDACO CENTROLIBIANO.	M5	3 A-4.5	0,00	414.000,00	0,00	1.883,84	NO	0,00	47.048,65	-	-	Avviato	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO - Si segnala che sono stati stipulati i contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	31/09/2026	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	
SI	F24E210064330001	PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR MISURA A_S1B MISURA A3 LINEA D'INTERVENTO A3.3: PERCORSI E CAMMINI - IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO SPORTIVO FERENTILLO", STRALCIO FUNZIONI ALF "A" CAMPO DI CALCIO A 11 E OPERE ACCESSORIE	M5	3 A-3.3	0,00	1.207.500,00	0,00	65.968,80	NO	0,00	147.424,97	-	-	Avviato	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO - Si segnala che sono stati stipulati i contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	31/09/2026	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	
SI	F27F22000400006	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIMENTO AL VICE-CAMPUS DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI	M4	1.1.2	378.995,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	-	Avviato	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	30/06/2026	DATO NON ANCORA FORNITO DAL SERVIZIO TECNICO	
SI	F27F22000520006	ISPIERENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	M1	1.1.4	79.922,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	-	Avviato	Completamento attività	24/11/2023	SI	24/11/2023	Piattaforma non ancora implementata	
SI	F27F22000850006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PAGO PA	M1	1.1.3	3.035,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	-	Avviato	Completamento attività	25/10/2023	SI	25/10/2023	Piattaforma non ancora implementata	
SI	F27F22001210006	SFD F.CIE	M1	1.1.4	14.000,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	-	Avviato	Completamento attività	27/12/2023	SI	27/12/2023	Piattaforma non ancora implementata	
SI	F27C21001430006	CLOUD	M1	1.1.2	19.752,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	-	Non Avviato	Comunicazione Contratti	11/09/2023	SI	04/12/2024	Piattaforma non ancora implementata	
SI	F27F22002910006	PIATTAFORMA NOTIFICHE	M1	1.1.4	23.147,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	-	Non Avviato	Comunicazione Contratti	31/05/2023	SI	27/11/2023	Piattaforma non ancora implementata	

COMUNE DI FICULLE

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	D33D22000210001	Adeguamento sonico ed efficientamento energetico	4: ISTRUZIONE E RICERCA	1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	446.400,00	0	SI*	0,00, vedasi nota*	0	0	AVVIATO	progetto esecutivo	15/07/2023	non applicabile alla data di compilazione		indicare eventuali criticità riscontrate	nell'atto di concessione del finanziamento del 21/03/2023, il progetto è definito "progetto in essere", tempi per l'aggiudicazione molto brevi dall'ammissione prot. 1835 del 22/03/2023.
-	D33D22000210001	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Aggiudicazione	15/09/2023	non applicabile alla data di compilazione		-	-
-	D33D22000210001	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Consegna	30/11/2023	non applicabile alla data di compilazione		-	-
-	D33D22000210001	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Ultimazione dei lavori	31/03/2026	non applicabile alla data di compilazione		-	-
-	D33D22000210001	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Collaudo	30/06/2026	non applicabile alla data di compilazione		Collaudo 30/06/2026	-
-	D33D22000210001	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Rendiconto	15/07/2026	non applicabile alla data di compilazione		-	-
SI	D35E22000170006	"REALIZZAZIONE DI AREA SPORTIVA ALL'APERTO, SCUOLA EPICOM codice ARES 0550310123."	4: ISTRUZIONE E RICERCA	1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole	60.500,00	0	SI*	0,00, vedasi nota*	-	-	AVVIATO	Progettazione esecutiva	31/08/2023	non applicabile alla data di compilazione			nell'atto di concessione del finanziamento del 14/01/2023, il progetto è definito "progetto in essere".
-	D35E22000170006	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Aggiudicazione	31/12/2023	non applicabile alla data di compilazione		-	-
-	D35E22000170006	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Consegna	31/03/2024	non applicabile alla data di compilazione		-	-
-	D35E22000170006	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Ultimazione dei lavori	31/03/2026	non applicabile alla data di compilazione		-	-
-	D35E22000170006	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Collaudo	30/06/2026	non applicabile alla data di compilazione		Collaudo 30/06/2026	-
-	D35E22000170006	-	-	-	-	-	-	SI*	-	-	-	-	Rendiconto	15/07/2026	non applicabile alla data di compilazione		-	-
SI	D39D20000370001	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN AREA SPORTIVA ALL'APERTO, SCUOLA EPICOM codice ARES 0550310123."	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4: Tutele del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	50000	0	SI	50000	48542,34	31630,25	AVVIATO	Aggiudicazione	15/09/2020	SI			COLLAUDATO
-	D39D20000370001	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Consegna	15/11/2020	SI			-
-	D39D20000370001	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Ultimazione dei lavori	31/05/2023	SI			-
-	D39D20000370001	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Collaudo	31/08/2023	SI			COLLAUDO 31/08/2023
SI	D39I21013120005	"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN AREA SPORTIVA ALL'APERTO, SCUOLA EPICOM codice ARES 0550310123."	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4: Tutele del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	50000	0	SI	50000	51639,5	45972,3	AVVIATO	Aggiudicazione	15/09/2021	SI			COLLAUDATO
-	D39I21013120005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Consegna	31/12/2021	SI			-
-	D39I21013120005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Ultimazione dei lavori	31/07/2022	SI			-
-	D39I21013120005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Collaudo	31/10/2022	SI			COLLAUDO 31/10/2022
SI	D39I21013130005	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO edificio in FICULLE, Largo Don Rinaldo Magistrato n. 5, piano B", (colombazione coperture, isolamento termico, sostituzione ed installazione n.2 pompe di calore)	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4: Tutele del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	50.000,00	0	SI	50.000,00	53795,24	-	AVVIATO	Aggiudicazione	15/09/2021	SI			COLLAUDATO
-	D39I21013130005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Consegna	31/12/2021	SI			-
-	D39I21013130005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Ultimazione dei lavori	31/05/2023	SI			-
-	D39I21013130005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Collaudo	31/08/2023	SI			COLLAUDO 31/08/2023
SI	D37H22002780005	"SOSTENIBILE ZONA POGG, INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN AREA SPORTIVA ALL'APERTO, SCUOLA EPICOM codice ARES 0550310123."	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4: Tutele del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	50000	0	SI	82140,36	-	-	AVVIATO	Aggiudicazione	15/09/2022	SI			COLLAUDATO
-	D37H22002780005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Consegna	15/09/2022	SI			-
-	D37H22002780005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Ultimazione dei lavori	31/12/2023	SI			-
-	D37H22002780005	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	Collaudo	30/03/2024	SI			Collaudo 30/03/2024

COMUNE DI FICULLE

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SI	D31F2002000006	APP ID	1	1	1.4.3	2187	0	0	no	€2.187,00			avviato	Fidamento esecuzione proget	09.02.2023	si	05/10/2023	
SI	D31F2002590006	PAGO PA	1	1	1.4.3	4856	0	0	NO				avviato	Affidamento esecuzione progetto	11.05.2023	SI	31/12/2023	
SI	D31F2004440006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	1.4.5	23.147,00	0	0,00	NO				non avviato		30.05.2023			
SI	D31F2002560006	SPID CIE	1	1	1.4.4	14.000,00	0	0	NO				non avviato		27.11.2023			
SI	D31F2003970006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	1.4.1	79.932,00	0	0,00	NO				non avviato		03.07.2023			
SI	D31C2001590006	ABILITAZIONE CLOUD	1	1	1.2	47427	0	0	NO				non avviato		12.06.2023			

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MSURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPECTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA R-GIS	NOTE	
SI	C71F22004090006	ADOZIONE APP IO	1	1,4,3	8.019,00								NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	19/11/2023 08/05/2024	SI	08/05/2024	PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS		
SI	C71F22002820006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI SETTEMBRE 2022	1	1,4,5	23.147,00								NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	31/05/2023 27/11/2023	SI	27/11/2023	PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS		
SI	C71G22004870006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	1,2	77.897,00								NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	04/12/2023 25/02/2025	SI	25/02/2025	PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS		
SI	C71F22001730006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID - CIE	1	1,4,4	14.000,00								NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	28/07/2023 23/05/2024	SI	23/05/2024	PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS		
SI	C71F22003410006	ESPERIENZA DEL OTTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI - SETTEMBRE 2022	1	1,4,1	79.922,00								NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	09/07/2023 28/03/2024	SI	28/03/2024	PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS		
SI	C71F22004180006	PIATTAFORMA PAGOPIA	1	1,4,3	13.951,00								NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	28/03/2024	SI		PER GLI AVVISI PNRR PADIGITALE NON VA ALIMENTATO IL SISTEMA REGIS		
SI	C77H19009090001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. CATERINA	2	4	98.000,00		98.000,00		98.000,00				AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	05/12/2022 30/06/2023	SI	30/06/2023		Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	
SI	C77H19009091001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLMAMANO MOLINELLO	2	4	470.000,00		470.000,00		470.000,00				AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	04/05/2022 30/06/2024	SI	30/06/2024		Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	
SI	C77H19009092001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. FOSSATO CAPOLUSSO - VIA G. PAOLO II	2	4	70.000,00		70.000,00		70.000,00		8.181,59		CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	28/06/2022 12/03/2023	SI	31/01/2023		In data 31/01/2023 è stata formulata richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per il contributo di Euro 7.575,33. Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	
SI	C77H19009093001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLLECCLIA	2	4	90.000,00		90.000,00		90.000,00		67.724,31		CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	27/04/2022 05/09/2022	SI	05/09/2022		Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	
SI	C77H19009094001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. PALAZZOLO	2	4	110.000,00		110.000,00		110.000,00		7.194,65		CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	25/07/2022 29/01/2023	SI	31/12/2022		Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	
SI	C77H19009095001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. OSTERIA DEL GATTO VIA DEL CENTRO SPORTIVO	2	4	132.000,00		132.000,00	Euro 2.600,00 bilancio com SI	132.000,00		24.29,50		AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	10/12/2022 30/06/2023	SI	30/06/2023		Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	
SI	C77H19009096001	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. COLLINA	2	4	30.000,00		30.000,00	Euro 2.811,46 bilancio com SI	30.000,00		272.39,96		CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	25/11/2021 28/04/2022	SI	28/04/2022		Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburi Andrea	

COMUNE DI FOSSATO DI VICO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SI	C7922044310001	C. 29 art.1 L.160-2019 ANNUALITA' 2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA G. PACIO III E VIA F. VENTURI	2	4	2,2	100.000,00					100.000,00	100.000,00			CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	15/09/2021 31/12/2022	SI SI	31/12/2022	Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburti Andrea
SI	C74122000510006	C. 29 art.1 L.160-2019 ANNUALITA' 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE	2	4	2,2	50.000,00					50.000,00				AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	15/09/2022 31/12/2023	SI SI	31/12/2023	Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburti Andrea
SI	C724220000120001	C. 29 art.1 L.160-2019 ANNUALITA' 2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETI P.I. COLBASSANO	2	4	2,2	50.000,00					50.000,00				CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	15/09/2020 31/12/2021	SI SI	31/12/2021	Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburti Andrea
SI	C77422000160002	C. 139 L. 145-2018 CIMA MUTALI I STRALCIO ANNUALITA' 2020	2	4	2,1.B	250.413,37					250.413,37	221.494,89			CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	30/09/2020 19/11/2021	SI SI	19/11/2021	Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburti Andrea
SI	C77422000120002	C. 139 L. 145-2018 SAN BENEDETTO ANNUALITA' 2021	2	4	2,1.B	38.654,95					38.654,95	30.948,48			CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	29/09/2021 22/03/2022	SI SI	18/03/2022	Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburti Andrea
SI	C77422000130002	C. 139 L. 145-2018 CIMA MUTALI II STRALCIO ANNUALITA' 2021	2	4	2,1.B	140.886,63					140.886,63	129.215,59			CONCLUSO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI	29/09/2021 06/03/2022	SI SI	28/02/2022	Dal 01/01/2023 a seguito del pensionamento della Geom. Chiocci Sabrina, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 17 del 30/12/2022 responsabile dell'area Tecnica Ing. Tiburti Andrea

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDENTI IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022 (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTIVO AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R-G5	NOTE
SI	IB5E2200040006	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	4	1	1.2	320.500,00	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE euro 35.725,19	0	0	0	0	AVVIATO	PROGETTAZIONE	ENTRO IL 30/06/2023	SI	30/06/2024	Difficoltà a contattare gli uffici preposti a evadere chiarimenti e delucidazioni	
SI	IB7H19001720002	MIGLIORAMENTO STRADE COM.LI AREE RURALI PIANA DEL TEVERE	2	4	2.2	160.000,00	0	AVANZO AMMINE 11.879,96 ED €23.120,04 FOI- DRGS N.52 DEL 02 MARZO 2023	euro 5.382,83	0	0	0	AVVIATO	ESECUZIONE	CONSEGNA LAVORI 11/05/2023	SI	20/07/2023	Difficoltà a contattare gli uffici preposti a evadere chiarimenti e delucidazioni	
SI	IB4022000930006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLOGO	2	4	2.2	49.700,00	0		euro 5.989,46	0	0	0	AVVIATO	LAVORI ULTIMATI - IN CORSO CONTABILITA' E REGOLARE SECUZIONE	APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE ENTRO IL 30/07/2023	SI	10/02/2023	Difficoltà a contattare gli uffici preposti a evadere chiarimenti e delucidazioni	



SOGGETTO ATTUATORE PNRR (S/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (S/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	19211800030001	Lavori di sistemazione idraulica ingegneria idraulica messa in sicurezza strada di San Felice	2	4	2.2	260.000,00			SI	260.000,00	Impegno n.562/2021 determinazione del settore tecnico n. 267 del 29.12.2021 per € 16.536,91; Impegno n. 584/2022 determinazione del settore tecnico n. 77 del 03.05.2022 per € 200.508,44; Impegno n. 593/2021 determinazione del settore tecnico n. 263 del 28.12.2021 per € 3.080,00; Impegno n. 625/2021 determinazione del settore tecnico n. 271 del 31.12.2021 per € 4.148,08; Impegno n. 716/2022 determinazione del settore tecnico n. 77 del 03.05.2022 per € 225,00; Impegno n. 584/1/2022 determinazione del settore tecnico n. 245 del 01.12.2022.	0	Mandato n. 986 del 23.05.2022 per € 7.829,56; Mandato n. 1256 del 28.06.2022 per € 3.400,00; Mandato n. 1280 del 05.07.2022 per € 2.25,00; Mandato n. 1323 del 20.07.2022 per € 3.060,00; Mandato n. 1484 del 12.08.2022 per € 33.715,21;	PROGETTO AVVIATO	Indicare in successione per riga, la fase procedurale prevista dal congegnamento	data conclusione 16.02.2022	SI	31/12/2026	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	Richiesta modifica importo per su Regis di € 280.000,00 ma allo stato attuale tale modifica non è stata ancora approvata
SI	197115001150001	Intervento di messa in sicurezza e interventi di miglioramento delle infrastrutture varie strade comunali denominate s.c. n. 12 parte di castellara s.c. n.13 di Molineta e s.c. n.14 delle Rippe.	2	4	2.2	220.000,00			NO		Impegno n. 542 determinazione del settore tecnico n. 242 del 21.11.2022 per 19.032,38; Impegno 546 determinazione del settore tecnico n. 262 del 19.12.2022 per €1.800,00,00; Impegno 629 determinazione del settore tecnico n. 262 del 19.12.2022 per € 20.967,62	0		PROGETTO AVVIATO	Progettazione	data di conclusione della progettazione 01/12/2022 (Prot. Com. 11661) - variante 14/12/2022 (prot. Com. 12837)	SI	31/12/2026	Il Cup non è visibile su REGIS e quindi non è possibile procedere alla rendicontazione	
SI	197115001150001	Intervento di messa in sicurezza e manutenzione stradale anche con addebiatura di alcuni tratti di strada comunale: Strada comunale Case Viaggi - Morcicchia	2	4	2.2	100.000,00			NO		Impegno n.499 determinazione del settore tecnico n. 238/26.10.2022 per 5.208,42; Impegno n. 513 determinazione del settore tecnico n. 236 del 14.12.2022 per € 72.771,60; Impegno n. 533 determinazione del settore tecnico n. 228 del 03.11.2022 per € 2.039,58; Impegno n. 544 determinazione del settore tecnico n. 242 del 14.12.2022 per € 20.000,00	0		PROGETTO AVVIATO	Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva D.D. n. 98/2021	21/03/2022	SI	30/03/2022	Il Cup è visibile su BDDP e non è visibile su REGIS e quindi non è possibile procedere a rendicontazione	
SI	197622000000006	Intervento di adeguamento sismico e riqualificazione dell'edificio mensa scolastica sito in via Fulvio Sbarretti in Fraz. Bastardo	4	1	1.2	353.000,00	Applicazione avanzo libero anno 2022 per € 77.777,00		NO		Impegno n.520 per € 35.300,00 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022; Impegno n. 557 del 30.11.2022 per € 317.700,00 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022; Impegno n. 556 per € 6.537,39 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022; Impegno n. 558 del 30.11.2022 per € 71.239,61 determinazione del settore tecnico n. 232 del 08.11.2022.	0		PROGETTO AVVIATO	Incarico progettazione per studio di fattibilità determinazione del settore tecnico n. 25 del 24/02/2022	28/02/2022	SI	31/12/2026	Il Cup non è visibile nella piattaforma REGIS	
SI	197622000200001	Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Giano dell'Umbria l. 160 del 2019	2	4	2.2	50.000,00			NO		Impegno n. 407 per € 7.867,21 determinazione del settore tecnico n. 176 del 09.06.2022; Impegno n. 420 per € 38.339,88 determinazione del settore tecnico n. 183 del 14.09.2022; Impegno n. 532 per € 3.792,91 determinazione del settore tecnico n. 183 del 14.09.2022	0		PROGETTO AVVIATO	Progettazione determinazione del settore tecnico 176 del 06/09/2022	08/09/2022	SI	08/09/2022	Il Cup è inserito su BDAP l'intervento non è visibile su REGIS quindi non è rendicontabile -	
SI	195F21000620001	Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Giano dell'Umbria l. 160 del 2019 (Strada San Felice I stralzo)	2	4	2.2	100.000,00			SI		Impegno n. 364 per € 30.000,00 determinazione del settore tecnico n. 192 del 24.08.2021; Impegno n. 389 per € 50.000,00 determinazione del settore tecnico n. 204 del 09.09.2021; Impegno n. 386 per € 6.129,59 determinazione del settore tecnico n. 203 del 08.09.2021; Impegno n. 708 per € 24.940,18; Mandato n. 1068 del 06.06.2022 per € 3.321,69; Mandato n. 1594 del 31.08.2022 per € 30,00	0	Mandato n. 1047 del 31.05.2022 per € 4.785,00; Mandato n. 1050 del 01.06.2022 per € 31.080,78; Mandato n. 1051 del 01.06.2022 per € 24.940,18; Mandato n. 1052 del 01.06.2022 per € 68.110,67; Mandato n. 1057 del 06.06.2022 per € 1.068,03; Mandato n. 1068 del 06.06.2022 per € 3.321,69; Mandato n. 1594 del 31.08.2022 per € 30,00	NON AVVIATO	Servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità	data conclusione 15.09.2021	SI	15/09/2021	Disposta la documentazione per la rendicontazione su REGIS	
SI	191821006560006	Adeguamento sismico efficientamento energetico palestra scolastica	4	1	3.3	970.000,00			NO					NON AVVIATO						In fase di predisposizione procedura di gara per il servizio di
SI	19652000020001	Efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, Lavori di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione del Comune di Giano dell'Umbria (l. 160/2019)	2	4	2.2	50.000,00		€ 50.000,00 con Legge di Bilancio 2020 conferita successivamente in PNRR	SI		Impegno n. 317 per € 13.831,87 determinazione del settore tecnico n. 188 del 09.09.2020; Impegno 335 per € 6.133,31; Impegno n. 350 del 24.07.2020; Impegno n. 18.668,69 determinazione del settore tecnico n. 188 del 09.09.2020	0	Mandato n. 433 del 23.02.2022 per 29.545,95; Mandato n. 434 del 23.02.2022 per € 18.668,68; Mandato n. 1441 del 01.08.2022 per € 505,44; Mandato n. 1442 del 01.08.2022 per € 152,24	NON AVVIATO	Progettazione	09/08/2020	SI	09/08/2020	Cup non ancora visibile in REGIS	
SI	191C200170006	Abilitazione migrazione cloud	1	1	1.2	77.897,00			NO					NON AVVIATO	In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore					Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.12.2024

SI	191F22001500006	Piattaforma identità digitale-Spid de	1	1	1.4.4	14.000,00						NON AVVIATO	In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore al 28.07.2023	Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.12.2023	SI	Termine 31.12.2023	
SI	191F22002720006	Piattaforme notifiche digitali	1	1	1.4.5	23.147,00						SI	Affidamento del servizio al 03.04.2023	Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.12.2023	SI	Termine 31.12.2023	
SI	151F22004930006	Piattaforma digitale dati	1	1	1.3.1	10.172,00						NON AVVIATO	In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore al 02.05.2023	Proroga dal dipartimento della transazione digitale al 01.06.2023	SI	Termine 31.12.2023	
SI	191F22003350006	Esperienza del cittadino servizi pubblici	1	1	1.4.1	79.922,00						NON AVVIATO	In fase di predisposizione procedura di affidamento per la scelta del fornitore al 03.07.2023	Termine ultimo previsto per la realizzazione dell'intervento 31.07.2024	SI	Termine 31.07.2024	

COMUNE DI GIOVE

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE E PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURAZIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSIEME AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	C41F2202420006	SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE SFI	1	1	144	14000			NO	14000					Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	31/12/2023 SI	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	31/12/2023 DA NON RENDICONTARE IN REGIS
SI	C41F220203910006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	141	79922			NO	79922					DA AVVIARE	31/12/2023 SI		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
SI	C41F220203450006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	145	23147			NO	23147					DA AVVIARE	31/12/2023 SI		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
SI	C41F2202420006	PRGO PA	1	1	145	20031			NO	20031					DA AVVIARE	31/12/2023 SI		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
SI	C41F22020430006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	1	1	12	41277			NO	41277					DA AVVIARE	31/12/2023 SI		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
SI	C41F2202420006	APP IO	1	1	145	4131			NO	4131					DA AVVIARE	31/12/2023 SI		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGS	NOTE
SI	E5E2200070006	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	M4	C1	1.1	900.000,00	0	0	NO	0	NO	0	0	AVVIATO	AFFIDAMENTO	31/05/2023	SI	31/12/2024	/	Indicare eventuali criticità riscontrate
SI	E5862200030006	ESPERIENZA DE CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	M1	C1	1.4.1	79.922,00	0	0	NO	0	NO	0	0	AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO	31/07/2023 31/12/2024 01/09/2023	SI	01/06/2024	/	
SI	E51F2200370006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	M1	C1	1.4.5	23.147,00	0	0	NO	0	NO	0	0	AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO	01/06/2023 01/03/2024 01/09/2023	SI	01/06/2024	/	
SI	E5862200020006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	M1	C1	1.2	47.427,00	0	0	NO	0	NO	0	0	AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO	01/06/2023 01/03/2024 21/09/2023	SI	21/09/2024	/	
SI	E51F22006910006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	M1	C1	1.3.1	10.172,00	0	0	NO	0	NO	0	0	NON AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO	21/06/2023 21/09/2024 /	SI	/	/	
SI	E59119000550001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	2.2	20.000,00	0	0	SI	20.000,00	IMPEGNO N. 382 (EX 502)			CONCLUSO	/	/	SI	/	/	
SI	E56119000060001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	M2	C4	2.2	30.000,00	0	0	SI	30.000,00	IMPEGNO N. 399 (EX 400)			AVVIATO	AFFIDAMENTO	09/09/2020	SI	/	/	
SI	E54H22000870006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	2.2	50.000,00	0	0	SI	50.000,00	IMPEGNO 474			AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO	10/09/2020 30/06/2023 14/09/2022	SI	/	/	
SI	E59122005700001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	2.2	100.000,00	0	0	SI	100.000,00	IMPEGNO 381			AVVIATO	INIZIO LAVORI FINE LAVORI AFFIDAMENTO	14/09/2022 31/08/2023 06/09/2021	SI	/	/	
															INIZIO LAVORI FINE LAVORI	05/10/2021 31/07/2023				

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURAZIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	PRECEDENTI E FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	C49H18000020001	LAVORI SULLA STRADA VIA GOSPARINI BONIFICHE E MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI STRADA COMUNALE CENTRO ABITATO GOSPARINI	M2	C4	2.2	700.000,00			NO		700.000,00	0	5.421,00	PROGETTO AVVIATO	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	31/12/2023	SI	31/12/2024	PROGETTO AVVIATO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS	
SI	C49G18000010001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADESIONE PER IL RICOVERO DEI MEZZI ANCHE DI PROTEZIONE CIVILE	M2	C4	2.2	250.000,00			NO		250.000,00	0	3.502,00	PROGETTO AVVIATO	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	30/09/2023	SI	31/12/2024	PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF)	
SI	C41B21004350001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COMPARTANTI LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ASFALTO SUL TRATTO DENOM. A IN LOC. GOSPARINI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LISCIANO NICCONNE	M2	C4	2.2	70.000,00			NO		25.277,86	22.979,87	30.604,06	OPERA CONCLUSA	OPERA CONCLUSA	16/03/2022	SI	19/03/2022	PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS	
SI	C49I22003500005	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA LOC. GOSPARINI	M2	C4	2.2				NO		19.800,07	18.000,06	32.898,65	OPERA CONCLUSA	OPERA CONCLUSA	05/08/2022	SI	01/09/2022	PROGETTO CONCLUSO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF)	
SI	C41B20000240005	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE LOTTIZZAZIONE GOSPARINI TRATTO B	M2	C4	2.2	50.000,00			NO		36.129,17	0	22.953,78	OPERA CONCLUSA	OPERA CONCLUSA	30/12/2020	SI	03/12/2020	PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS	
SI	C47H22001160001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO IN LEGNO SU VIA DELLA LEBBIA	M2	C4	2.2	30.000,00			NO		24.896,36	0	0	OPERA CONCLUSA	OPERA CONCLUSA	31/01/2022	SI	31/01/2022	PROGETTO CONCLUSO - DA COMPLETARE INSERIMENTO DATI IN REGIS	
SI	C42C22000450006	COMPARTANTE E INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI LISCIANO NICCONNE	M2	C4	2.2	25.200,00	0	0	NO	0	24.649,50	0	0	CONCLUSI IN FASE DI LIQUIDAZIONE	LAVORI CONCLUSI IN FASE DI LIQUIDAZIONE	31/12/2022	NO	06/02/2023	PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF)	
SI	C47H22002080006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPARTANTI LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI LISCIANO NICCONNE	M2	C4	2.2	24.800,00			NO	0	24.503,94	0	22.276,31	OPERA CONCLUSA	OPERA CONCLUSA	10/12/2022	SI	14/10/2022	PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF)	
SI	C46H22000000001	DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE VIA LISCIANO	M5	C2	3.1	40.000,00			NO		38.064,00			PROGETTO AVVIATO	PROGETTO AVVIATO	30/09/2023	SI	30/09/2023	PROGETTO AVVIATO - CUP NON INSERITO SU REGIS (DATI PRESENTI SU BDAF)	TECNOLOGIA PER ACCANTONATA IN AVANZO
SI	C46H22000000001	ABILITAZIONE MIGRAZIONE IN CLAUD	M1	C1	1.2	47.427,00			NO					PROGETTO NON AVVIATO		25/02/2025	SI	25/02/2025		

SOGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MSURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTIVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RESPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	
(SI/NO)	(codice unico progetto)								(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	31/12/2022	31/12/2022			Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	J61C22001462006	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi	1	1.1.2		47.427,00 €			NO					PROGETTO IN PARTE AVVIATO	INSERIMENTO CUP	09/10/2022	SI			
SI	J51F22004730006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	1	1.1.3.1		10.172,00 €			NO					PROGETTO NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE COMPLETAMENTO	11/09/2023 04/12/2024		04/12/2024		
SI	J61F22003580006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	1	1.1.4.1		79.922,00 €			NO					PROGETTO NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP	25/12/2022	SI			
SI	J61F22002540006	Adizione Aprio - acquisto di 22 servizi	1	1.1.4.3		5.346,00 €			NO					PROGETTO NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE COMPLETAMENTO	03/07/2023 28/09/2024		28/09/2024		
SI	J61F22002550006	Adizione PagoPA - acquisto di 19 servizi	1	1.1.4.3		11.553,00 €			NO					PROGETTO NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP	12/12/2022	SI			
SI	J61F22002410006	Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	1	1.1.4.4		14.000,00 €			NO					PROGETTO NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE COMPLETAMENTO	05/06/2023 31/01/2024		31/01/2024		
SI	J61F22003370006	Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	1	1.1.4.5		23.147,00 €			NO					PROGETTO AVVIATO (pubblicazione RDO)	INSERIMENTO CUP	17/11/2022	SI			
SI	J64E21001380001	PNRR - M2C4. Efficientamento energetico (vi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica e al risparmio energetico degli edifici, centro storico e palazzo Pennone)	2	4.2.2		100.000,00 €			SI	PNRR non nativo finanziato precedentemente dal Ministero dell'Interno, L.160/2019 art.1 co.29_ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	PROGETTO CONCLUSO AL 27/12/2022	CONCLUSO	31/05/2023 27/11/2023		27/11/2023	CONCLUSO_ RENDICON TAZIONE IN REGIS IN CORSO CONCLUSO_ RENDICONTATO IN REGIS IN CORSO	
SI	J69J2200040001	PNRR-M2.C4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LAVORI DI SOMMA URGENZA MADONNA DEI PINI P.L.	2	4.2.2		10.380,65 €			NO		49.372,92 €	49.372,92 €	49.372,92 €	PROGETTO CONCLUSO al 15/09/2022	CONCLUSO	15/09/2022	SI		CONCLUSO_ RENDICON TATO IN REGIS	
SI	J64H22000670006	PNRR-M2.C4 Efficientamento energetico pubblica illuminazione centro storico	2	4.2.2		39.619,35 €			NO		39.619,35 €									CONCLUSO_ RENDICON TATO IN REGIS
SI	J65G19000080001	PNRR-M2C4_ Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione che consentono di ottenere un effettivo risparmio energetico, da realizzare nel centro storico e in Loc. Parco degli Ulivi.	2	4.2.2		50.000,00 €			SI	PNRR non nativo finanziato precedentemente dal Ministero dell'Interno, L.160/2019 art.1 co.29_ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	46.178,07 €	42.801,00 €	40781,69	PROGETTO CONCLUSO al 5/6/2021	CONCLUSO	05/06/2021	SI	05/06/2021	CONCLUSO_ RENDICONTATO IN REGIS	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSINTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE PNRR AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMI PREVISTI	RISERVO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	J71F22001920006	ESTENSIONE UTILIZZO IDENTITA' DIGITALE SPD E CIE	1	1	1.4	14.000,00	-	-	-	-	-	DA AVVIARE	-	-	-	-	-	PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS
SI	J71F22003470006	ADOZIONE APP O	1	1	1.4	2.430,00	-	-	-	-	-	AVVIATO	AFFIDAMENTO INCARICO	FINI LAVORI PREVISTA 28/11/2023	-	-	-	PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS
SI	J71F22003150006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	1.4.5	8.540,00	-	-	-	-	-	AVVIATO	AFFIDAMENTO INCARICO	FINI LAVORI PREVISTA 29/09/2023	-	-	-	PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS
SI	J71F22003800006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	1.4.1	79.922,00	-	-	-	-	-	DA AVVIARE	-	-	-	-	-	PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS
SI	151F22005120006	PIATTAFORMA NAZIONALE DATI	1	1	1.3.1	10.172,00	-	-	-	-	-	DA AVVIARE	-	-	-	-	-	PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS
SI	J71C22001650006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	1	1.2	77.897,00	-	-	-	-	-	DA AVVIARE	-	-	-	-	-	PROGETTO NON SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO REGIS
SI	J71J20000070001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	2	4	2.2	35.000,00	-	-	35.000,00	TOTALE IMPEGNI EURO	EURO 24.737,26	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	FINE EFFETTIVA 07/11/2020 FINE EFFETTIVA 13/11/2020 FINE EFFETTIVA 24/11/2020 FINE PREVISTA 30/06/2023 FINE EFFETTIVA 07/04/2022	SI SI SI SI SI	-	-	-
SI	J78620006570001	MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL CENTRO STORICO DI MASSA MARTIANA, VIA MAZZINI 1, SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	2	4	2.2	15.000,00	-	-	15.000,00	TOTALE IMPEGNI EURO	EURO 14.999,90	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	FINE EFFETTIVA 07/11/2020 FINE EFFETTIVA 12/02/2021	SI SI	-	-	-
SI	J75F22001000001	ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA	2	4	2.2	100.000,00	-	-	100.000,00	TOTALE IMPEGNI EURO	EURO 21.585,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	FINE EFFETTIVA 13/10/2021 FINE PREVISTA 08/02/2022	SI SI	-	-	-
SI	J77H18000570002	MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DI PONTE FONNAVA	2	4	2.2	534.205,97	-	-	48.564,79	TOTALE IMPEGNI EURO	-	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PUBBLICAZIONE GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO	FINE EFFETTIVA 02/12/2022 FINE EFFETTIVA 08/01/2023 FINE EFFETTIVA 24/01/2023 FINE EFFETTIVA 04/04/2023	SI SI SI SI	-	-	-
SI	J77H18000580002	MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DI PONTE FONNAVA	2	4	2.2	484.193,90 - (48.419,39) INDICATO L'IMPORTO TOTALE SU REGIS	-	-	484.193,90	TOTALE IMPEGNI EURO	-	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	FINE EFFETTIVA 30/03/2023 FINE EFFETTIVA 10/05/2023 FINE EFFETTIVA 10/07/2023 FINE EFFETTIVA 30/07/2023 FINE PREVISTA 31/12/2023	SI SI SI SI SI	-	-	-
SI	J74H22000060006	BORGHI DEL DIRE E DEL PARE	1	3	2.1	1.600.000,00	-	-	-	-	-	AVVIATO	CONCLUSIONE FASE DI SELEZIONE FORNITORI STIPULA CONTRATTI - ADOZIONE IMPEGNI VERIFICHE E CONTROLLI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI CONCLUSIONE FASI DI STIPULA CONTRATTI PER L'ESECUZIONE LAVORI - ADOZIONE IMPEGNI CONCLUSIONE COLLAUDI - ACCUSONONCONFORMITA'REGOLARE ESECUZIONE	FINE PREVISTA 31/12/2024 FINE EFFETTIVA 31/05/2023 FINE PREVISTA 28/02/2024 FINE EFFETTIVA 30/09/2023 FINE PREVISTA 31/05/2023	SI SI SI SI SI	-	-	-
SI	J75F22000780006	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE EUROPA	2	4	2.2	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PREL. CAP. E BANDO GARA PUBBLICAZIONE GARA ESECUZIONE LAVORI	FINE EFFETTIVA 13/09/2022 FINE EFFETTIVA 14/09/2022 FINE EFFETTIVA 14/09/2022 FINE PREVISTA 31/12/2023	SI SI SI SI	-	-	-

SI	778210050006	RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO PER CREAZIONE NUOVI POSTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER EDIFICIO NZEB	4	1	1.1	1.020.000,00€ (102) AGGIORNATO L'IMPORTO TOTALE SU REGIS)	-	NO	-	AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	FINE EFFETTIVA 05/05/2023 FINE PREVISTA 30/09/2023 FINE EFFETTIVA 30/07/2024 FINE PREVISTA 30/07/2024 FINE EFFETTIVA 30/08/2024	SI SI SI SI SI
----	--------------	---	---	---	-----	--	---	----	---	---------	--	---	----------------------------



SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	D82E2200250006	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ. MADONNA DEL PIANO	2	4	2.2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	SI	€ 50.000,00	€ 36.511,53	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	31/08/2022	SI	31/12/2023	indicare eventuali criticità riscontrate		
SI	D82E2200250006	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZ. MADONNA DEL PIANO	2	4	2.2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	SI	€ 50.000,00	€ 36.511,53	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	14/11/2022	SI	31/12/2023	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale	SOSPENSIONE LAVORI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	
SI	D87H1900250001	SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE	2	4	2.2	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	SI	€ 220.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	25/11/2019	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D87H1900250001	SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE	2	4	2.2	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	SI	€ 220.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	RELAZIONE GEOLOGICA	05/12/2019	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D87H1900250001	SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE	2	4	2.2	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	SI	€ 220.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	06/12/2019	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D87H1900250001	SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI VIA SAN MARTINO E VIA DELLE PIANOZZE	2	4	2.2	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	SI	€ 220.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (causa aggiornamento prezzi 2022)	02/12/2022	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D84E17001010002	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA	2	4	2.2	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	SI	€ 495.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	20/11/2023	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale	Lavori appaltati ma in attesa di stipula contratto	
SI	D84E17001010002	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA	2	4	2.2	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	SI	€ 495.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	09/06/2017	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D84E17001010002	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA	2	4	2.2	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	SI	€ 495.000,00	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	RELAZIONE GEOLOGICA	15/11/2022	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D84E17001010002	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA	2	4	2.2	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	SI	€ 495.000,00	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO	26/10/2022	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D84E17001010002	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA	2	4	2.2	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	SI	€ 495.000,00	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO ESECUTIVO	16/02/2023	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D84E17001010002	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA DELLA BARCA	2	4	2.2	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00	SI	€ 495.000,00	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	ESECUZIONE LAVORI	30/06/2026	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale		
SI	D83G2200010006	MCV ACADAWY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	NO			€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA/DEFINITIVO (interventi da 1 a 6)	31/05/2023	SI	30/06/2026	richiesta rimodulazione cronoprogramma	ACCORDATA PROROGA TERMINE INVIO PROGETTO	
SI	D83G2200010006	MCV ACADAWY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	NO			€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROGETTO ESECUTIVO (Interventi da 1 a 6)	08/07/2023	SI	30/06/2026	richiesta rimodulazione cronoprogramma		

SI	D83G22000010006	MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	LAVORI (Interventi da 1 a 6)	30/11/2024	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma
SI	D83G22000010006	MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	SERVIZI E FORNITURE (Interventi da 1 a 6)	30/04/2025	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma
SI	D83G22000010006	MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	SERVIZI E FORNITURE (Intervento 7)	30/06/2026	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma
SI	D83G22000010006	MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	SERVIZI E FORNITURE (Intervento 8)	31/05/2025	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma
SI	D83G22000010006	MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	SERVIZI E FORNITURE (Intervento 9)	30/06/2026	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma
SI	D83G22000010006	MCV ACADEMY – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	3	2.2	€ 1.600.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	SERVIZI E FORNITURE (Intervento 10-11)	30/06/2026	SI	30/06/2026	fino a gennaio non c'era il progetto dentro il portale e richiesta rimodulazione cronoprogramma
SI	D81F22002240006	ADOZIONE APPIO	1	1	1.4.3	€ 1.944,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE	02/11/2023	SI	02/11/2023	attività da non inserire
SI	D81F22002230006	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA NAZIONALE IDENTITA' DIGITALE – SPID CIE	1	1	1.4.4	€ 14.000,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	23/05/2024	SI	23/05/2024	attività da non inserire
SI	D81F22003960006	ESPERIENZA DEL CITTADINO	1	1	1.4.1	€ 79.972,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE CON IL FORNITORE	02/01/2024	SI	02/01/2024	attività da non inserire
SI	D51F22008950006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	1	1	1.3.1	€ 10.172,00					NO	€ 0,00	€ 0,00		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	15/01/2024	SI	15/01/2024	attività da non inserire
SI	D81C22002380006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	1	1.2	€ 38.221,00					NO	€ 0,00	€ 0,00	AVVIATO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	04/12/2024	SI	04/12/2024	attività da non inserire

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	F27H19002720001	ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI TREVINE	M2	C4	12.2	- €	220.000,00 €	- €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	220000	- €	- €	AVVIATO	LAVORI AFFIDATI DA FARE STIPULA CONTRATTO E LAVORI DA AVVIARE			31/12/2024	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate
SI	F24H22000800006	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI GIOIELLO	M2	C4	12.2	- €	50.000,00 €	- €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	50000	- €	- €	AVVIATO	LAVORI CONCLUSI, LIQUIDAZIONI FATTE, IN FASE DI RENDICONTAZIONE			31/12/2023		
SI	F23D21002590001	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE MEDIANTE REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO (MARCIAPIEDI) CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO DI LIPPIANO	M2	C4	12.2	- €	100.000,00 €	15.056,23 €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	100000	- €	83.166,34 €	AVVIATO	LAVORI CONCLUSI IN FASE DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE					
SI	F21C20000070001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO, GIOIELLO E LIPPIANO	M2	C4	12.2	- €	50.000,00 €	- €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	50000	- €	39.105,60 €	AVVIATO	INTERVENTO CONCLUSO E RENDICONTATO CON TBEL					
SI	F24J23000320006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO SECONDO DELLA SEDE COMUNALE	M2	C4	12.2	- €	50.000,00 €	- €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente				NON AVVIATO				31/12/2024		
SI	F24J23000330006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE COMUNALE	M2	C4	12.2	- €	50.000,00 €	- €	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente				NON AVVIATO				31/12/2025		

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGGS	NOTE
(SI/NO)	(codice unico Progetto)					da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente			(SI/NO)						Indicare in successione per riga la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	Indicare eventuali attività riscontrate	
SI	J77H20001510001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DI VIA G. VERDI DAL CIVICO 72 AL CIVICO 90	2	4	2.2	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SI	70.000,00 €	€ 68.083,47	€ 56.199,88	€ 0,00	PROGETTO AVVIATO	Lavori principali ultimati. Mancano piccole opere di completamento e relative liquidazioni	31/08/2023	SI	31/08/2023		
SI	J77H21000400001	Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di accesso al cimitero e della rotonda presso la zona industriale di via dello scalo	2	4	2.2	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SI	140.000,00 €	€ 138.048,74	€ 123.913,19	€ 0,00	PROGETTO AVVIATO	Lavori principali ultimati. Mancano piccole opere di completamento e relative liquidazioni	31/08/2023	SI	31/08/2023		
SI	J72F2200070001	Lavori di manutenzione straordinaria dei parchi/giardini pubblici comunali	2	4	2.2	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	SI	70.000,00 €	€ 65.880,60	€ 0,00	€ 0,00	PROGETTO AVVIATO	In corso fase di Esecuzione Lavori	31/12/2023	SI	31/12/2023		
SI	J71F22000620006	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR "Produttività 2025-Misura 1.4.1			1.4.1	79.927,00 €	0,00 €	0,00 €	NO	0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	PROGETTO AVVIATO	Contrattualizzato	04/12/2023	SI	04/12/2023		

SOGGETTO A FINE FNR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL FNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE	IMPORTO PRECEDENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESOCONTI FINITIVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESOCONTI AL 31/12/2022	PROGETTO NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	REPETTO DEL TERMINE (S/N)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
(S/NO)									(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal crocioprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento		indicare eventuali criticità riscontrate
S1	81F22003840006	SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE 99 CIE	1	1	144	14000			NO		14000				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
S1	81F22004670006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1	141	79922			NO		79922				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
S1	81F22003950006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	145	23147			NO		23147				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
S1	81F22003850006	PAGO PA	1	1	143	27922			NO		27922				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
S1	81C2200750006	ABBLTADIONE AL CLOUD PER LE PA	1	1	12	19752			NO		19752				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
S1	51F22003230006	PIATTAFORMA DIGITALE INIZIATIVE DATI	1	1	131	10172			NO		10172				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	
S1	81F22003620006	APPO	1	1	243	7728			NO		7728				DA AVVIARE	31/12/2023 S		31/12/2023	DA NON RENDICONTARE IN REGIS	



SI	F97H21011040002	RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA'	A SUB MISUR	0,00	1.800.000,00	0,00	NO	0,00	303.655,68	240,4	0	AVVIATO	affidamento progettazione	28.12.2021	SI	28.12.2021	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21011040002	RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA'	A SUB MISUR	0,00	1.800.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	24.06.2022	SI	24.06.2022	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21011040002	RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA'	A SUB MISUR	0,00	1.800.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	affidamento lavori	22.12.2022	SI	22.12.2022	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21011040002	RIGENERAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ENEA SBARRETTI, PISTA CICLABILE/PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE DI IMMEDIATA EFFICACIA PER IL CONFORT URBANO ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORCHI/PARTI DI PAESI E DI CITTA'	A SUB MISUR	0,00	1.800.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	fine lavori	non concluso			MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590002	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA'	A SUB MISUR	0,00	485.000,00	0,00	SI	0,00	145.500,00			AVVIATO	affidamento progettazione	10.09.2020	SI	10.09.2020	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590002	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA'	A SUB MISUR	0,00	485.000,00	0,00	SI	0,00				AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	16.06.2022	SI	16.06.2022	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590002	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA'	A SUB MISUR	0,00	485.000,00	0,00	SI	0,00				AVVIATO	affidamento lavori	12.12.2022	SI	12.12.2022	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590002	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO DI CALCIO	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	LINEA DI INTERVENTO 3 REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI E CAMMINI CULTURALI, TEMATICI E STORICI; AVVIO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SA6); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA'	A SUB MISUR	0,00	485.000,00	0,00	SI	0,00				AVVIATO	fine lavori	non concluso			MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590001	Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	affidamento progettazione	24.03.2023	SI	24.03.2023	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590001	Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso			MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590001	Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	affidamento lavori	non concluso			MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590001	Riqualificazione urbana e consolidamento via delle Casaline	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	fine lavori	non concluso			MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590001	Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	affidamento progettazione	24.03.2023	SI	24.03.2023	MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H21010590001	Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00				AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso			MAI RIUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPELUTE PER PER RROUVRE IL PROBLEMA MA INVANO. RIUSCITI SOLO TRAMITE SPID

SI	F97H220001500001	Riquilibrare urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H220001500001	Riquilibrare urbana e consolidamento muro di contenimento via bufone	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE	A SUB MISUR	0,00	500.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	fine lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22001470001	Consolidamento scarpaia Ingressi del paese	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	1.000.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento progettazione	24.03.2023	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22001470001	Consolidamento scarpaia Ingressi del paese	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	1.000.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22000140002	Interventi urgenti dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti strada comunale della Villetta	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	411.844,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H220004140002	Interventi urgenti dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti strada comunale della Villetta	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	411.844,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H220004140002	Interventi urgenti dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti strada comunale della Villetta	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	411.844,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22008120001	Consolidamento scarpaia via dei Cardinali	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	95.900,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento progettazione	24.03.2023	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22008120001	Consolidamento scarpaia via dei Cardinali	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	95.900,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22008120001	Consolidamento scarpaia via dei Cardinali	RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	DISESTI	A SUB MISUR	0,00	95.900,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	fine lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H220004120002	Intervento di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti Ingressi del paese	TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	I.2.2 TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	MZC4I.2	0,00	300.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento progettazione	12.05.2023	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H220004120002	Intervento di ripristino dissesto idrogeologico e messa in sicurezza versanti Ingressi del paese	TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	I.2.2 TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	MZC4I.2	0,00	300.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22000330004	Manutenzione straordinaria via Tonelli	TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	I.2.2 TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	MZC4I.2	0,00	200.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22000330004	Manutenzione straordinaria via Tonelli	TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	I.2.2 TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	MZC4I.2	0,00	200.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	fine lavori	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22000330004	Manutenzione straordinaria via Tonelli	TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	I.2.2 TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	MZC4I.2	0,00	200.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	affidamento progettazione	12.05.2023	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H22000330004	Manutenzione straordinaria via Tonelli	TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	I.2.2 TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	MZC4I.2	0,00	200.000,00	0,00	NO	0,00	0,00	AVVIATO	approvazione progetto esecutivo	non concluso	MAI RUSCITI AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI 'ACCESSO. INVATE RIPETUTE PER PER RRSOLVERE IL PROBLEMA MA INVANO. RUSCITI SOLO TRAMITE SPID
SI	F97H2200320006	attivazione servizio APP ID per l'ufficio demografici del Comune			1 1.1.4.3	972,00	0,00	0,00	NO	972	0	0 AVVIATO	PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VISUA PUBBLICA RISORSA 1.4.3 IL 12/07/2022	45164 SI	45164
															DECRETO DI FINANZIAMENTO n. 24 - 4 / 2022 - PNRR Finestra temporale dal 05/07/2022 al 03/08/2022
															INDICAZIONE DEI SOGGETTI REALIZZATORI SUL SITO DI PA DIGITALE 2026
															ASSEMBLEA ATTIVA SUL SITO DI PA DIGITALE 2026
															CARICAMENTO CONTRATTI SUL SITO DI PA DIGITALE 2026





SOGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISIO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R&G	NOTE
SI	G1220200760005	MESSA IN SICUREZZA ED EFF. MUNICIPIO	2	4.2.2	50000	50000	0	500	SI	56600	48669,76	40.819,47	0 AVVIATO	STUDIO DI FATTIBILITÀ PROGETTAZIONE PRELIMINARE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PFTE RAFFORZATO PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO SEGUIMENTO LAVORI COLLAUDO	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	QUESTI PROGETTI SONO STATI REVISIONATI E PULITI CON I FOGLI EXCEL DEL MINISTERO PREFETTURE ECO) SONO SEMPRE I SOLITI DATI
SI	G13021000940001	RISTRUTTI MURI SOSTEGNO STRADA COMUNALE DELLE CASE E FRAZIONE FAIGLIO	2	4.2.2	45000	45000	0	0	SI	45000	41.695,06	38.699,07	0,00 AVVIATO	STUDIO DI FATTIBILITÀ PROGETTAZIONE PRELIMINARE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PFTE RAFFORZATO PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	G18121000810001	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	2	4.2.2	55000	55000	0	0	SI	55000	54997,08	48914,25	0 AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	G14H22000970006	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.A. MONTÉGABBIONE	2	4.2.2	50000	50000	0	0	NO	0	49.998,20	2250,5	0 AVVIATO	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) PFTE RAFFORZATO PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	G11F2002260006	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1	1.1.4.3	9105	9105	0	0	NO	0	0	0	0 NON AVVIATO	AFFIDAMENTO	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	G11F2002260006	ADOZIONE APP10	1	1.1.4.3	2187	2187	0	0	NO	0	0	0	0 NON AVVIATO	STIPULA CONTRATTO	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MSURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R&G	NOTE	
SI	E13021007370001	Rigenerazione dello spazio urbano del borgo di Butano (PNC)	MS	C3	INT. 1 - PNC sub misura A	0	1.092.500,00 €	0	NO	NO	imp. N. 46/2022 indagini - importo euro 2.391,00 / imp. N.55/2022 oneri Regione parere strutturale - importo euro 100 / imp. N. 107/2022 servizi tecnici prog e DL - importo euro 143.702,31 / imp. N. 169/2022 re-geometria - importo euro 689,32 / imp. N. 193/2022 lavori - importo euro 760.753,18 / imp. N. 194/2022 contributo anaw- importo euro 30	sono pagamenti disposti da parte di: geologo 2.965,98; account spese tecniche 31.677,21; oneri istruttoria strutture euro 100;	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2025	avviato	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2025	SI	01/06/2026	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	il monitoraggio degli interventi del fondo complementare avviene tramite il BDAP_MOP	
SI	E15F21004860001	Miglioramento dell'abitabilità delle frazioni più isolate e messa in sicurezza	MS	C3	INT. 1 - PNC sub misura A	379.500,00 €	0	0	NO	NO	imp. N. 47/2022 indagini - importo euro 1.830,00 / imp. N.56/2022 oneri Regione parere strutturale - importo euro 100 / imp. N. 181/2022 e N. 182/2022 servizi tecnici prog e DL - importo euro 13.557,60 / imp. N. 137/2022 re-geometria e idraulica - importo euro 3.545,08 / imp. N. 200/2022 lavori - importo euro 296.486,45 / imp. N. 207/2022 contributo finanziamento CUC Spoleto - importo euro 826,80	sono pagamenti disposti da parte di: indagini importo netto par a 1.500,00	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2025	avviato	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori 25% - dicembre 2023 4) esecuzione lavori 75% - dicembre 2024 5) conclusione e collaudo - marzo 2025	SI	01/06/2026	CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione	piccole opere confluite nel PNRR	il monitoraggio degli interventi del fondo complementare avviene tramite il BDAP_MOP	
SI	E17H180030950001	MOZC12.2 piccole opere (confluito nel PNRR) - L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - <b>Annualità 2024</b> Messa in sicurezza Strada Comunale Tirolo	M2	C4	Int. 2.2	50.000,00	0	50000	SI	SI	imp. N. 52/2020 progettazione - importo euro 10606,92 - impegno n. 80/2020 importo 78.668,72 imp. N. 362/2020- importo euro 10724,36 - variante e somme a disposizione	SAL 1 lavori euro 47.684,97 - SAL 1 progettazione 4.061,73 - saldo lavori 17.581,27 - saldo progettazione 4.227,59	AVVIATO (CONCLUSO)	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori - ENTO DICEMBRE 2023	AVVIATO (CONCLUSO)	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - dicembre 2022 3) esecuzione lavori - ENTO DICEMBRE 2023	SI	CONCLUSO	CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione	piccole opere confluite nel PNRR	
SI	E15F20001800001	(confluito nel PNRR) - L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - <b>Annualità 2024</b> Messa in sicurezza Strada Comunale Tirolo	M2	C4	Int. 2.2	100.000,00	0	0	SI	SI	imp. N. 22/2021 importo 9.153,81 progettazione - imp. N. 139/2021 84.763,50	SAL 1 lavori euro 69422,46 - SAL 1 progettazione 37711,63 - saldo lavori 4.441,28 - saldo prog 78253,74	AVVIATO (CONCLUSO)	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTO DICEMBRE 2023	AVVIATO (CONCLUSO)	1) validazione e affidamento della progettazione - giugno 2022 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2022 3) esecuzione lavori - ENTO DICEMBRE 2023	SI	CONCLUSO	CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione	piccole opere confluite nel PNRR	
SI	E11022000220006	(confluito nel PNRR) - L. 160/2019 art.1 DM 30/01/2020 - <b>Annualità 2023</b> EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DELLA CROCE - ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	M2	C4	Int. 2.2	50.000,00	0	0	NO	NO	imp. 125/2022 importo 6138,48 progettazione - imp. N. 192/2022 42.698,85		NON AVVIATO	1) validazione e affidamento della progettazione - LUGLIO 2023 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2023 3) esecuzione lavori - ENTO DICEMBRE 2024	NON AVVIATO	1) validazione e affidamento della progettazione - LUGLIO 2023 2) aggiudicazione gara lavori - SETTEMBRE 2023 3) esecuzione lavori - ENTO DICEMBRE 2024	SI	31/12/2023	CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR	piccole opere	
SI	E11F22002340006	1.4.3 Adozione Pagopa e Appio - acquisto di 26 servizi	M1	C1	Investimento 1.4	15.782,00	0	0	NO	NO	NO	NO	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - novembre 2023 2) realizzazione - febbraio 2024	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - novembre 2023 2) realizzazione - febbraio 2024	SI	CONCLUSO	CUP visibile in ReGh - predisposizione rendicontazione	piccole opere confluite nel PNRR	
SI	E11F22002360006	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	M1	C1	Investimento 1.4	14.000,00	0	0	NO	NO	NO	NO	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - novembre 2023 2) realizzazione - giugno 2024	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - novembre 2023 2) realizzazione - giugno 2024	SI	CONCLUSO	CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR	piccole opere	
SI	E11F2200370006	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	M1	C1	Investimento 1.4	23.147,00	0	0	NO	NO	NO	NO	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - maggio 2023 2) realizzazione - giugno 2023 3) collaudo - ottobre 2023 4) approvazione e liquidazione - novembre 2023	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - maggio 2023 2) realizzazione - giugno 2023 3) collaudo - ottobre 2023 4) approvazione e liquidazione - novembre 2023	SI	CONCLUSO	CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR	piccole opere	
SI	E11F22004090006	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	M1	C1	Investimento 1.4	79.932,00	0	0	NO	NO	NO	NO	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - luglio 2023 2) realizzazione - agosto 2023 3) collaudo - novembre 2023	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - luglio 2023 2) realizzazione - agosto 2023 3) collaudo - novembre 2023	SI	CONCLUSO	CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR	piccole opere	
SI	E11F23000400006	1.4.3 Adozione Pagopa e Appio - acquisto di 32 servizi	M1	C1	Investimento 1.4	7.776,00	0	0	NO	NO	NO	NO	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - settembre 2023 2) realizzazione - febbraio 2024 3) collaudo - aprile 2024	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - settembre 2023 2) realizzazione - febbraio 2024 3) collaudo - aprile 2024	SI	CONCLUSO	CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR	piccole opere	
SI	E11C23000330006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi	M1	C1	Investimento 1.2	47.427,00	0	0	NO	NO	NO	NO	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - gennaio 2024 2) realizzazione - ottobre 2024 3) collaudo - novembre 2024	NON AVVIATO	1) acquisizione proposte e contrattualizzazione - gennaio 2024 2) realizzazione - ottobre 2024 3) collaudo - novembre 2024	SI	CONCLUSO	CUP non visibile nella piattaforma confluite nel PNRR	piccole opere	

SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTISTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	H2912000040001	PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FRAZ. S. MARIA-FRAZIONE SPAZZOLINO	2	4.2.2	50000	50000	0	0	0 SI		50000	40262,64	0	PROGETTO AVVIATO	CONCLUSO	23/06/2021	SI	23/06/2021		
SI	H2412200074006	PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMI. - MONTELEONE CENTRO STORICO	2	4.2.2	50000	50000	0	0	0 NO		49599,96	2625	0	PROGETTO AVVIATO	CONCLUSO	01/03/2023	SI	20/02/2023		
SI	H2912100538001	PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI COLLE ALTO E BASSO	2	4.2.2	100000		0	0	0 SI		98493,15	80707,5	0	PROGETTO AVVIATO	CONCLUSO	07/01/2022	SI	07/01/2022		
SI	H23H130006570005	PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA MISERA SOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO ART. 1 C. 851 L.205/2017 - VIA DEL FOSCO	2	4.2.2	455000		0	0	0 SI		432000	71827,78	0	PROGETTO AVVIATO	I - SAL					
SI	H24122000950006	PNRR - M2CA - Inv. 2.2 - PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMI. - MONTELEONE - ANNO 2023	2	4.2.2	50000		0	0	0 NO		0	0	0	PROGETTO NON AVVIATO						
SI	H21C22000150006	PNRR M1C1 - 1.471 L.2. ABLITAZIONE CLOUD PUBBLICA/AMMINISTRAZIONE LOCALE T2	1	1.1.2	47427				NO											
SI	H21F222003570006	PNRR M1C1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1.1.4	79922				NO											
SI	H21F222003000006	NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - INVESTIMENTO I.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	1	1.1.4	23147				NO											

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (S/NO)	CLIP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
SI	G37H19001470001	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE N.9 DI BACCARNA	M.2	C.4	I2.2	257.021,76	257.021,76	€ 257.021,76	NO	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	€ 257.021,76	€ 11.089,11	AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO INDIZIONE APPALTO LAVORI/AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/06/2021 14/06/2021 30/07/2021 08/08/2021 18/09/2021 31/12/2024	SI SI SI SI SI SI	31/12/2024	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	LE SOMME PAGATE SONO AL NETTO DELL'IRPEF TRATTANDOSI SI PAGAMENTI A PROFESSIONISTI DOGGETTO A RITENUTE D'ACCONTO	
SI	G37H19001480001	MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERNA ZONA INDUSTRIALE SM DI SETTE	M.2	C.4	I2.2	250.000,00		€ 275.000,00	NO				AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/06/2021 20/06/2021 30/07/2021 08/08/2021 18/09/2021 31/12/2024	SI SI SI SI SI SI	31/12/2024			
SI	G37H17001840001	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI SAN BENEDETTO	M.2	C.4	I2.2	212.404,00	212.404,00	€ 192.900,00	NO		€ 192.900,00		AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO INDIZIONE APPALTO LAVORI/AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	08/11/2022 30 GG 01/11/2022 14/12/2022 18/09/2021 31/12/2024	SI SI SI SI SI SI	31/12/2024			
SI	G38H21000790001	RISTRUTTURAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E ABITATO LIMITROFO	M.2	C.4	I2.2	25.000,00	25.000,00		NO				AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/08/2021 30/08/2021 02/09/2021 15/09/2021 in corso 31/12/2023	SI SI SI SI SI SI	30/09/2023		SOMMA CONFLUITA IN AVANZO VINCOLATO 2022 DA RISCRIVERE AL FINE DI POTER ASSUMERE IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	
SI	G37H22002280006	STRADA COMUNALE N.10 DELLE PALME - FOSCO SAN MARTINO V.C. - POZZOLO - SP201 - MESSA IN SICUREZZA FRANA FOSCO SAN MARTINO	M.2	C.4	I2.2	24.900,00	24.900,00	€ 24.900,00	NO		€ 24.900,00		AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/07/2022 15/09/2022 in corso 31/12/2023	SI SI SI SI SI SI	31/12/2023			
SI	G34J22001460006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SOSTITUITO PALAZZO COMUNALE	M.2	C.4	I2.2	25.100,00	25.100,00	€ 25.100,00	NO		€ 25.100,00		AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/08/2022 30/08/2022 02/09/2022 15/09/2022 in corso 31/12/2023	SI SI SI SI SI SI	31/12/2023			
SI	G38H21014620001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE SOSTITUZIONE INFESSI ESTERNI	M.2	C.4	I2.2	75.000,00	75.000,00	€ 75.000,00	NO		€ 75.000,00		AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/08/2021 30/08/2021 15/09/2021 in CORSO 31/12/2023	SI SI SI SI SI SI	31/12/2023			
SI	G35F20006070001	C.29-37 L. 160/2019 E DM 14/01/2020 - ANNUALITÀ 2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M.2	C.4	I2.2	50.000,00	50.000,00	€ 34.457,78	NO		€ 34.457,78	31.325,25	AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/07/2020 30/06/2023 15/09/2020 06/05/2022 30/06/2022 30/06/2026	SI SI SI SI SI SI	30/05/2022			
SI	G38H22000070006	REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA	M.4	C.1	I1.1	2.230.000,00			NO				AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/06/2023 in corso 30/07/2023 30/06/2023 31/12/2025 30/06/2026	SI SI SI SI SI SI	30/06/2026			
SI	G38H22000000006	AMPLIAMENTO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA INFANZIA Emma Smaestra	M.4	C.1	I1.2	124.780,00			NO				AVVIATO	AFIDAMENTO PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI RENDICONTAZIONE	30/07/2023 30/06/2023 31/09/2023 31/12/2025 30/06/2026	SI SI SI SI SI SI	30/06/2026			
SI	G31F22002960006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	M.1	C.1	I.4.5	23.147,00			NO				NON AVVIATO							
SI	G51F22005350006	PIATTAFORMA DIGITALE DATI	M.1	C.1	I.3.1	10.172,00			NO				NON AVVIATO							
SI	G31F22003780006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	M.1	C.1	I.4.1	79.922,00			NO				NON AVVIATO							
SI	G31C23001130006	ABILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	M.1	C.1	I.2	47.427,00			NO				NON AVVIATO							

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISURONE COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PRESENTISTANTE	IMPORTO FINANZIATO (euro)	IMPENZI ASSINTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A RISERVA PNRR AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RESERVE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	ESITO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGS	NOTE
si	F51B2100623001	Realizzazione fienone del campo da calcio in Loc. Ceroneola	5	A3.3	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00		no		Imp. 138/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp. cse e direzione lavori € 1.636.934,36 Imp. 610/2022 Rimborso forfettario per richiesta parere NTC18 in favore del progettista € 670,50.	100.382,63 attuatore	avviato	1) Liquid. 1034/2022 rimborso forfettario per richiesta parere NTC18 in favore dell'ing. Arch. Massimo Mariani € 670,50. 2) Liquidazione in sede di conferenza appalti, dei bandi di gara: 4)25% del SAL. 5)Ulteriore 50% del SAL. 6)conclusione dei lavori-colloquio per tutti gli interventi individuati	1)III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) 2)III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato al IV trimestre 2022 dal Decreto MEF del 1 agosto 2022. 3)IV trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato relativamente agli affidamenti e all'avvio dei lavori entro e non oltre il mese di marzo 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisna n. 41 del 31.12.2022 4)I trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) 5)IV trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) 6)I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021)	1)SI 2)SI 3)SI	2026	indicare eventuali criticità riscontrate		
si	F51B2100623001	Realizzazione dei Campi Polivalenti	5	A3.3	€ 747.500,00	€ 747.500,00		no		Imp. 146/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp. cse e direzione lavori € 121.946,43. Imp. 611/2022 Rimborso forfettario per richiesta parere NTC18 in favore del progettista € 50,00.		si che pare NTC18 in favore dell'ingegner avvato	1)approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuttore previa acquisizione delle relative autorizzazioni in sede di conferenza permanente; 2)pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara; 3)aggiudicazione e avvio dei lavori 4)25% del SAL. 5)Ulteriore 50% del SAL. 6)conclusione dei lavori-colloquio per tutti gli interventi individuati	1)III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) 2)III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato al IV trimestre 2022 dal decreto MEF del 1 agosto 2022. 3)IV trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) Termine posticipato relativamente agli affidamenti e all'avvio dei lavori entro e non oltre il mese di marzo 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisna n. 41 del 31.12.2022 4)I trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) 5)IV trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) 6)I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021)	1)SI 2)SI 3)SI	2026			
si	F51B2100623001	Interventi per le strade comunali di Castro-Carignano, Nordera, Norcia-Popoli	5	A4.5	€ 410.000,00	€ 410.000,00		no		Imp. 129/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp. cse e direzione lavori € 231.717,36.		avviato	1)approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuttore previa acquisizione delle relative autorizzazioni in sede di conferenza permanente; 2)pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara; 3)aggiudicazione e avvio dei lavori 4)25% del SAL. 5)Ulteriore 50% del SAL. 6)conclusione dei lavori-colloquio per tutti gli interventi individuati	autorizzazioni in sede di conferenza emab; Il trimestre 2022 III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 A CAUSA DELLA AGGIORNAMENTO DEI PREZZI I 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisna n. 41 del 31.12.2022 IV trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) I trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021)	1)SI 2)SI 3)SI	2026 sede legale in viale Miano snc/06034 Foligno (PG) - C.F. 0205290548; P.IVA: 0205290548			
si	F51B2100840001	interventi denominati: "Dalle Sorgenti di San Martino alle aree verdi, Giardini Pubblici" (lotto A) e "Nuovo Camminamento, Nordera, da Porta Valle alla Piazza Porta Grande" (lotto B)	5	A3.1	€ 1.380.000,00	€ 1.380.000,00		no		Imp. 145/2022 Affidamento diretto per progettazione definitiva, esecutiva, esp. cse e direzione lavori € 65.864,64. Imp. 155/2022 affidamento diretto esp. cse e 19.795,61.		avviato	1) Liquid. 941/2022 liquidazione progetto/realizzazione esecutiva in favore dell'Arch. Caterina Michelini € 51.287,51. Liquid. 1006/2022 Liquidazione esp in favore dell'ing. Alessandro Di Raimo € 6.420,21.	III trimestre 2022 III trimestre 2022 (decreto MEF 15 luglio 2021) A CAUSA DELLA AGGIORNAMENTO DEI PREZZI IV trimestre 2022 termine posticipato entro marzo 2023 con ordinanza del Commissario Straordinario Sisna n. 41 del 31.12.2021 IV trimestre 2023 (decreto MEF 15 luglio 2021) I trimestre 2024 (decreto MEF 15 luglio 2021) I trimestre 2026 (decreto MEF 15 luglio 2021)	1)SI 2)SI 3)SI	2026			
no	F51B2000100001	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI L. 160/2019, ART. 1 COMMA 29, ANNUALITA' 2020 - OPERE PUBBLICHE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NORCIA CAPOLUOGO S.S. 685 - TRE VALLIUMBRE	2	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00		no		IMP.N. 298/2020 € 50.000,00 (1) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA', C.S.P., C.S.E. ED OGNI ULTERIORE ADEMPIMENTO DI LEGGE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE.		AVVIATO	INTERVENTO CONCLUSO		SI			INTERVENTO FINANZIATO CON L. 160/2019 CONCLUSO NEL PNRR	
no	F51B2100746001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' ENERGETICA 2021 (ART. 1 COMMA 208S LEGGE 160/2019) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBLICHE AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE (ART. 1 COMMA 208S LEGGE 160/2019) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBLICHE AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE	2	2	€ 100.000,00	€ 100.000,00		no		IMP.N. 235/2021 € 69.497,30 (FORNITURA LAMPADINE) IMP. N. 327/2021 € 29.748,65 (ESECUTORE LAVORI)		AVVIATO	INTERVENTO CONCLUSO		SI			INTERVENTO FINANZIATO CON L. 160/2019 CONCLUSO NEL PNRR	
no	F54H2200110001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNUALITA' 2022 - L.160/2019 ART. 1 COMMA 29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBLICHE AD OPERE PUBBLICHE	2	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00		no		IMP. N. 520-2022 (€ 1.320.000,00) PER C.F. 34.233.40 IMP. N. 521-2022 (€ 1.320.000,00) PER C.F. 34.233.40 IMP. N. 36/2023 IN FAVORE DELL'ESECUTORE LAVORI PER € 14.700,40		AVVIATO	INTERVENTO CONCLUSO	13/12/2022	SI concessa proroga	10/1/2023		INTERVENTO FINANZIATO CON L. 160/2019 CONCLUSO NEL PNRR	

SOGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENSI ASSISTITI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRI RESOISE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITÀ RELATIVE A RGCS	NOTE
									da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente				indicare in successione per ogni fase procedurale procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento		indicare eventuali criticità riscontrate
SI	IS7H20001040001	Interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale strada Acquabona	2	4.2.2		€ 50.000,00	€	€ 50.000,00	€			SI	LAVORI CONCLUSI	11/01/2021	SI	11/01/2021		
SI	IS9J21005470001	Interventi di efficientamento energetico sede comunale	2	4.2.2		€ 100.000,00	€	€ 95.603,67	€	396,33	€	SI	LAVORI IN ESECUZIONE	30/09/2023		30/09/2023		
SI	IS5F21009560005	Interventi di messa in sicurezza della strada Orate frazione di Poggio	2	4.2.2		€ 50.000,00	€	€ 50.000,00	€			SI	LAVORI IN ESECUZIONE	30/07/2023		30/07/2023		
SI	IS4D21003180005	Interventi di efficientamento energetico degli spazi ed aree in zona Orate adibiti ad uso scolastico e sociale	2	4.2.2-A		€ 50.000,00	€	€ 50.000,00	€			NO	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	30/06/2023		30/06/2024		
SI	IS4D21006860005	Interventi di efficientamento degli impianti sportivi in zona Orate	2	4.2.2-A		€ 50.000,00	€	€ 50.000,00	€			NO						CUP RELATIVO ANNULLATA 2024
SI	IS9D13000300005	Interventi di consolidamento abitato di Ottricoli Vi strada	2	4.2.2		€ 813.000,00	€	€ 701.664,77	€	198.370,29	€	SI	LAVORI IN ESECUZIONE	30/08/2023		30/09/2023		
SI	IS1F21000540005	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1	4	1	€ 79.922,00			€ 79.922,00			SI	CONTRATTUALIZZAZIONE	19/02/2023		18/09/2023		
SI	IS1F21000950005	Adozione identità digitale	1	4	4	€ 14.000,00			€ 14.000,00			SI	CONTRATTUALIZZAZIONE	02/08/2023		25/10/2023		
SI	IS1C23000340005	Abitazione e facilitazione migrazione al Cloud	1	2		€ 47.427,00						NO	CONTRATTUALIZZAZIONE	04/12/2023		25/02/2025		
SI	IS9J21006860001	Rifunzionalizzazione dell'ex scuola di Poggio	5	3	1	€ 300.000,00						NO				31/12/2025		
SI	IS7B21000030005	Rigenerazione culturale e sociale centro storico	1	3.2.1		€ 1.576.973,80			€ 50.000,00			SI	INDIZIONE GARA D'APPALTO	30/06/2023		30/06/2026		
													STIPULA CONTRATTO	10/09/2023				TRATTASI DI UN PROGETTO UNICO
													COLLAUDO	30/07/2023				COMPRESI DIVERSI INTERVENTI
														30/09/2023				
														31/12/2024				
														31/12/2025				
										€ 31.491,30								
									€ 27.000,00									
										€ 54.950,00								
										€ 54.726,00								
										€ 73.944,89								

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO A SVIATO/ NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESULTATO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
(SI/NO)									(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma di conclusione dell'intero intervento	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione dell'intero intervento previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	H61F22011810006	"Adozione app IO"	1	1	1.4	12150			NO					COMPLETATO	RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO - DA COMPLETARE	26/06/2023	SI	26/06/2023		
SI	H61C2300040006	"Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - acquisto di 9 servizi	1	1	1.2	47427			NO					DA AVVIARE	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	04/12/2023	SI	25/02/2025		
SI	H61F22011840006	Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 51 servizi	1	1	1.4	30957			NO					COMPLETATO	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - COMPLETATO IN VERIFICA	19/09/2023	SI	26/06/2023		
SI	H61F22013500006	Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	1	1	1.4	23147			NO					DA AVVIARE	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	25/06/2023	SI	22/12/2023		
SI	H61F22013950006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	1	1	1.4	79922			NO					DA AVVIARE	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	03/07/2023	SI	28/03/2024		
SI	H61F22011820006	Adozione Identità digitale - acquisto di 2 servizi	1	1	1.4	14000			NO					DA AVVIARE	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	28/07/2023	SI	23/05/2024		
SI	H51F2206210006	Piattaforma Digitale Nazionale D4H - acquisto di 1 servizio	1	1	1.3	10172			NO					DA AVVIARE	STATO DI CONTRATTUALIZZAZIONE - DA COMPLETARE	30/06/2023	SI	26/12/2023		
SI	H62E2200320006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SP.310 - 1° TRATTO - ANNO 2022	2	C4	2.2	50000	0	0	NO	49.578,92				AVVIATO	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	ENTRO 15/09/2023	SI	31/12/2023	Attestazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere	
SI	H63G2000160001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - Legge n.160 del 27/12/2019 Art.1 comma 29 recante "ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024"	2	C4	2.2	50000	0	0	NO	50000		37940,54		AVVIATO	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	ENTRO 15/09/2020	SI	31/12/2021	Attestazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere	
SI	H69121006210001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SP.310 - 1° TRATTO - ANNO 2021	2	C4	2.2	100800	0	0	NO	100800		77032,27		AVVIATO	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	ENTRO 15/09/2021	SI	31/12/2022	Attestazioni riguardanti finanziamenti confluiti in PNRR dopo esecuzione opere	
SI	H69B18000010001	PNRR Programma "NextGenerationEU" - D.M.I. del 08/11/2022 - Lavori di messa in sicurezza della viabilità Realizzazione di pedonale e sostituzione di nuovo marciapiede - VIALE ROMA - ANNO 2021	2	4	2.2	352000	0	0	NO	41115,53			AVVIATO DA FARE CONSEGNA	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	ENTRO IL 30/06/2023					
SI	H62E2200740006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023	2	C4	2.2	50000	0	0	NO	0				DA AVVIARE	PROGETTAZIONE	ENTRO IL 31/07/2023				



SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RESPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A ReGIS	NOTE
SI	J65F21001080001	LAVORI MESA IN SICUREZZA STRUTT. PARCO TERMALE	2	4.2 INV.2.2	10000,00					IMP.N.576/2021 € 15.496,00 -	62.48,00		SI	CONCLUSIONE INTERVENTO	29/05/2023 SI		29/05/2023		
SI	J69F22035510001	COMPLETAMENTO MESA IN SICUREZZA STRUTTURE PARCO TERMALE	2	4.2 INV.2.2	5000,00					IMP.N.588/2021 € 84.504,00 IMP.N.515/2022 € 6.656,00- IMP.N.572/2022 € 43.344,00			SI	ULTIMAZIONE LAVORI	08/06/2023 SI		30/06/2023		
SI	J61C2300041006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	1	1.1 INV.1.2	47427,00								NO	AFFIDAMENTO SERVIZIO	31/12/2023 SI		31/12/2023		
SI	J61F2200064000	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	1.1 INV.1.4.1	79922,00								SI	RIFACIMENTO SITO INTERNET	31/12/2023 SI		31/12/2023		
SI	J61F22004870006	ESTENSIONE PIATTAFORME NAZ. IDENTITA' DIGITALE SPID	1	1.1 INV.1.4.4	14000,00								NO	AFFIDAMENTO SERVIZIO	31/12/2023 SI		31/12/2023		
SI	J51F22006820006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE PNRR	1	1.1 INV.1.3.1	10172,00								NO	AFFIDAMENTO SERVIZIO	31/12/2023 SI		31/12/2023		
SI	J21G21002020006	INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'-SERVIZI E TRASPORTO SOCIALE	5	3 INV.1.1.1	602497,20								SI	AFFIDAMENTI E ACQUISTI FARMACIA COMUNALE	30/06/2023 SI		30/06/2025		
													NO	GARA DI APPALTO SERVIZI	15/07/2023 SI		30/06/2025		
													SI	AFFIDAMENTO SERVIZIO	30/06/2023 SI		30/06/2025		
SI	J21G21002020006	INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'-FORNITURE STRUMENTALI FARMACIA COMUNALE	5	3 INV.1.1.1	37502,80								SI	INDAGINI MERCATO	15/06/2023 SI		30/06/2025		

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
(S/NO)	(codice unico progetto)								(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	B75G2000900001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN BORGO GARBALDI E VIA ROMA	2	4	12.2	50000	0	0	0 SI	50000	50000	50000	50000	TERMINATO	CONCLUSO	31/12/2021	SI		DA RENDICONTARE SU REGIS	
SI	B75F2100110001	RESTRUTTURAZIONE VIA DEI GELSI PER ABBATTIMENTO BERBERE ARCHI.	2	4	12.2	100000	0	0	0 SI	100000	77489,98	77489,98	77489,98	AVVIATO	COLLAUDATO	31/12/2023	SI		DA RENDICONTARE SU REGIS	
SI	B7E2203123006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE IN VIA MADONNA DELLA FEDE	2	4	12.2	50000	0	0	0 NO		50000	0	0	PROGETTAZIONE AFFIDATA	PROGETTAZIONE	31/12/2023	SI		DA RENDICONTARE SU REGIS	
SI	B7E2204458007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE VIA ROMA	2	4	12.2	87058902	0	0	0 SI					PREVISTO PER IL 2023	PREVISIONE	31/12/2024	SI		DA RENDICONTARE SU REGIS	
SI	B7E22000360006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO	2	4	12.2	500000	0	0	0 NO					PREVISTO PER IL 2024	PREVISIONE	31/12/2024	SI		DA RENDICONTARE SU REGIS	

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CLUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENGI ASSIEME AL 31/12/2022	PAGAMENTI VISIBILI A VALERE SU ALTRE RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	EFFETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R-GS	NOTE
SI	(codice unico progetto)								(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente			indicare in quale fase procedurale si trova la fase ultima di conclusione del progetto	da compilare in caso di successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero programma				
SI	CI1C200150006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE (13 SERVIZI DA MIGRARE)	1	1.1.2		€ 77.897			NO				NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE	03/06/2023 SI		26/08/2024		
SI	CI1F2200290006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE (INTEGRAZIONE DI SPID E CIE)	1	1.1.4		€ 14.000			NO				NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE	25/11/2023 SI		20/09/2024		
SI	CI1F2200410006	APPLICAZIONE APP ID - ATTIVAZIONE SERVIZI	1	1.1.4.3		€ 9.983			NO				AVVIATO	REALIZZAZIONE PROGETTO	15/11/2023 SI		15/11/2023		
SI	CI1F22004120006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	1	1.1.4.1		€ 79.922			NO				NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE	05/07/2023 SI		26/09/2024		
SI	CI1F2200560006	PIATTAFORMA PAGOPA- ATTIVAZIONE SERVIZI	1	1.1.4.3		€ 44.918			NO				NON AVVIATO	IN ATTESA DI DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
SI	CI1F12000760001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL PASSEGGIO, PIEGARO	2	4.M3C12.2		€ 49.749		- €	- € SI	€ 49.749 DEL PASSEGGIO, PIEGARO		45.066,88 €	0 AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	22/07/2020 SI		31/12/2021		
														AGGIUDICAZIONE	27/08/2020 SI		31/12/2021		
														STIPULA CONTRATTO	09/09/2020 SI		31/12/2021		
														ESECUZIONE LAVORI	14/10/2020 SI		31/12/2021		
														COLLAUDO	09/12/2020 SI		31/12/2021		
SI	CI1F1210207030001	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI MURA URBICHE - PIEGARO - PRIMO STRALCO	2	4.M3C12.2		€ 41.822		- €	- € SI	Imp. 311,66 del 18/08/2021 € 50.000,00 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL PASSEGGIO, PIEGARO Imp. 19/08/2021 € 46.924,80 PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI MURA URBICHE - PIEGARO - PRIMO STRALCO € 41.822		37.200,48 €	0 AVVIATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17/06/2021 SI		31/12/2022		
														AGGIUDICAZIONE	14/09/2021 SI		31/12/2022		
														STIPULA CONTRATTO	27/09/2021 SI		31/12/2022		
														ESECUZIONE LAVORI	13/11/2021 SI		31/12/2022		
														COLLAUDO	16/12/2021 SI		31/12/2022		
NO	CI1F2200280006	PUBBLICAZIONE DI AUTONOMA PERONE CON DISABILITA' PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABILITAZIONE E LAVORO	5	2.M3C11.2		€ 714.998		- €	- € NO				NON AVVIATO				30/06/2026		
SI	CI1F12001060006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PIEGARO	2	4.M3C12.2		€ 50.000		- €	- € NO				NON AVVIATO				31/12/2024		
SI	CI1F12001070006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PIERRAFITTA	2	4.M3C12.2		€ 50.000		- €	- € NO				NON AVVIATO				31/12/2025		SOGGETTO ATTUATORE: UNIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO PIVA 0354230559

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAI FONDI (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERESU AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERESU ALTRE RISORSE AL NETTOIVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGSB	NOTE
SI	J21C2200102006	Abilitazione al cloud per le PA Locali	1	1	1.2	47.427			NO			NON AVVIATO	Contrattualizzazione	03/06/2023	da compilare in successione per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione dell'intero intervento	SI	26/08/2024	indicare eventuali criticità riscontrate		
SI	J21F2200281006	Adozione app IO	1	1	1.4.3	726			NO			NON AVVIATO	Contrattualizzazione	02/05/2023		SI	22/12/2023			
SI	J21F2200282006	Adozione piattaforma pagoPA	1	1	1.4.3	4.249			NO			NON AVVIATO	Contrattualizzazione	05/06/2023		SI	05/01/2024			
SI	J21F2200476006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID.CIE	1	1	1.4.4	14.000			NO			NON AVVIATO	Contrattualizzazione	05/01/2024		SI	31/12/2024			
SI	J21F220044006	Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notizie Digitali"	1	1	1.4.5	23.147			NO			NON AVVIATO	Contrattualizzazione	31/05/2023		SI	27/11/2023			
SI	J25E220023006	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PUBBLICO A CURA DI ASSOCIATI LOCALI (CANTINA MASSIMA PER N.31 BABBINI)	4	1	1.1	1109440,56			NO			AVVIATO	Affidamento servizi tecnici (consegna progetti)	19/04/2023		SI	19/04/2023			
SI	J24H220072006	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione	2	4	2.2	50.000			NO			NON AVVIATO	Affidamento lavori	15/09/2023		SI	30/06/2024			
SI	J24E220001006	Automozzo per il trasporto di persone con allestimento per disabili	5	3	1.1.1	59.780			NO			NON AVVIATO	Conclusioni interventi	30/06/2025		SI	30/06/2025			
SI	J29E220014004	Investimento 2.1 Attrattività dei borghi - Linea di intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici	1	3	2	1.600.000			NO			NON AVVIATO		30/06/2026		SI	30/06/2026			
												AVVIATO								

COMUNE DI PORANO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO O DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
(SI/NO)	(codice unico progetto)																	
SI	D98E18000800001	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA PER CREAZIONE DEL POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN VIALE J.F. KENNEDY	M4	C1	IL.1	1.076.000,00 €	€ 107.600,00 (FOI)	NO	1.183.600,00 €	/	/	AVVIATO	FIRMATO CONTRATTO D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI	31/12/2026	SI FINO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO D'APPALTO	31/12/2026		LE FASI PROCEDURALI SONO GIÀ STATE INSERITE NEL PORTALE REGIS e sono rispettate entro i termini previsti dall'accordo di concessione dei fondi
SI	D91C20000100001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA CIMICCHI, VIA G. MARCONI, VIA G. MAZZINI, VIA SANTA TERESA DI CALCUTTA E VIA COL DI LANA	M2	C4	I2.2	14.014,22 €	0	NO	14.014,22 €	12740,2	/	AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2021	SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI	31/12/2021		Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi
SI	D99J20000180001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SU VIA G. MARCONI, VIA DEL CORNIOLO E VIA F. PETRARCA	M2	C4	I2.2	34.781,98 €	0	NO	34.781,98 €	31619,98182	/	AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2021	SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI	31/12/2021		Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi
SI	D99J21002460001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE LINEA ELETTRICA CIVICO CIMITERO E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	I2.2	49.693,14 €	0	NO	49.693,14 €	45175,58182	/	AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2022	SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI	31/12/2022		Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi
SI	D99J21008160005	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BLOCCO LOCULI CIMITERO	M2	C4	I2.2	49.501,60 €	0	NO	49.501,60 €	44300	/	AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2022	SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI	31/12/2022		Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi
SI	D97H22002090001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - MEDIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	M2	C4	I2.2	46.818,41 €	0	NO	46.818,41 €	42562,19091	/	AVVIATO	CONCLUSO	31/12/2023	SI PER TUTTE LE FASI PROCEDURALI	31/12/2023		Sul portale REGIS è inserita la documentazione di giustificazione della spesa e le fasi procedurali tutte rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi
SI	D99J22001880001	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	I2.2	29.475,01 €	0	NO	29.475,01 €	/	/	AVVIATO	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE E CRE	31/12/2024	SI FINO ALL'INIZIO LAVORI	31/12/2024		LE FASI PROCEDURALI SONO GIÀ STATE INSERITE NEL PORTALE REGIS e sono rispettate entro i termini previsti dal decreto di assegnazione dei fondi
SI	D94H22001360006	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	I2.2	20.000,00 €	0	NO	/	/	/	NON AVVIATO		DA INIZIARE		31/12/2024		
SI	D94H22001370006	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	M2	C4	I2.2	50.000,00 €	0	NO	/	/	/	NON AVVIATO		DA INIZIARE		31/12/2025		
SI	D91F22001430006	RIFACIMENTO SITO WEB COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	1	1	1.4.1	79.922,00 €		NO				avviato		SI		04/12/2023		
SI	D91F22002880006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1	1	1.4.5	23.147,00 €		NO				NON AVVIATO		SI		27/12/2023		
SI	D51F22005990006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	1	1	1.3.1	10.172,00 €		NO				NON AVVIATO		SI		27/12/2023		

COMUNE DI PORANO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

si	D91C22001320006	ABIUTAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	1	1.2	47.427,00 €			NO					NON AVVIATO	PRESENTI NELLA PIATTAFORMA DEDICATA PA 2026	si	25/02/2025		
----	-----------------	---------------------------------------	---	---	-----	-------------	--	--	----	--	--	--	--	-------------	---	----	------------	--	--

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE INRR AL NETTIVO AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/N/O)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVA RECORDS	NOTE
(S/N/O)									(S/N/O)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase da compilare il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in caso di mancato successo per ogni fase	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	G47H21063430005	PRECI VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2^ - STRALCIO STRADE, CICLOVIA, SERVIZI (TURISMO); E - ABILI, IMPIANTI SPORTIVI COLONNINE DI RICARICA, SEGNALETICA, E BIKE ETC.	M5	C3	A3.3	0,00	1.249.165,00	187.274,75	NO		Euro 86.278,40 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE D.L., C.S.P., CHE ECSE PROGETTO PRECI VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - 2° STRALCIO	0,00	0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI	15/06/2022, 11/07/2022, 25/09/2023	SI,S,SI	25/09/2023		
SI	G43D21005610006	RIPISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI PRECI RIFACIMENTO DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI PRECI (CANTIERI DI LAVORO) - CANTIERI, SOSTITUZIONE DI CANTIERI, SOSTITUZIONE DELLE CUNETTE ECC..	M5	C3	A4.5	0,00	375.000,00	56.250,00	NO		Euro 20.223,04 - Affidamento del servizio di progettazione, D.L., C.S.P., C.P.E. e C.S.E. - Euro 337.741,83 AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI	16/05/2022, 30/06/2022, 26/06/2023	SI,S,SI	26/06/2023		
SI	G43D21005600006	PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI PRECI (CANTIERI DI LAVORO) - CANTIERI, SOSTITUZIONE DI CANTIERI, SOSTITUZIONE DELLE CUNETTE ECC..	M5	C3	A3.1	0,00	1.100.000,00	165.000,00	NO		Euro 120.824,72 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE D.L., C.S.P., E C.S.E. C.P.E. PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA DI PRECI (CANTIERI DI LAVORO) - CANTIERI, SOSTITUZIONE DI CANTIERI, SOSTITUZIONE DELLE CUNETTE ECC.	0,00	0,00	AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI	15/06/2022, 11/07/2022, 26/08/2023	SI,S,SI	26/08/2023		
SI	G49J20065080001	STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DI PRECI (CANTIERI DI LAVORO) - CANTIERI, SOSTITUZIONE DI CANTIERI, SOSTITUZIONE DELLE CUNETTE ECC..	M2	C4	I2.2	50.000,00	0,00	0,00	NO		0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI	30/06/2023, 30/07/2023, 31/12/2023	SI,S,SI	31/12/2023		
SI	G41F22003960006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CITTADINANZA DIGITALE	M1	C1	1.4.1	79.992,00	0,00	0,00	NO		0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	AFFIDAMENTO, CONCLUSIONE INTERVENTO	03/07/2023, 28/03/2024	SI,S	28/03/2024		
SI	G41F22002590006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPO e CIP	M1	C1	1.4.4	14.000,00	0,00	0,00	NO		0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	AFFIDAMENTO, CONCLUSIONE INTERVENTO	25/11/2023, 20/09/2024	SI,S	20/09/2024		
SI	G41F22002650006	PNRR - M1C1 - RIVESTIMENTO L4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - Azione app	M1	C1	1.4.3	5.346,00	0,00	0,00	NO		0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	AFFIDAMENTO, CONCLUSIONE INTERVENTO	01/06/2023, 26/01/2024	SI,S	26/01/2024		

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/N ON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R&GS	NOTE	
SI	H11F72000550006	Rifacimento sito istituzionale e servizi digitali per il Cittadino	1	1	1.4.1	79.922,00			NO					PROGETTO AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 270 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE	10/03/2023	SI		indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento		
SI	H11F72004490006	Integrazione con la piattaforma notifiche digitali ed affidamento dei seguenti servizi: - Notifiche Violazioni al Codice della Strada; - Notifiche Violazioni extra Codice della Strada	1	1	1.4.5	23.147,00			NO					PROGETTO NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 120 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE	03/12/2023	SI		03/12/2023		
SI	H11F72002510006	Migrazione e attivazione dei servizi digitali dell'Ente sull'App IO	1	1	1.4.3	5.832,00			SI					PROGETTO AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 240 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE	05/04/2023	SI				
SI	H11F72002520006	Migrazione e attivazione dei servizi di incasso dell'ente sulla Piattaforma PagoPA favorendo una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore dell'ente	1	1	1.4.3	32.171,00			SI					PROGETTO AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 180 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 240 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE	10/05/2023	SI				
SI	H11C22001210006	Migrazione dei servizi che il Comune ha digitalizzato verso soluzioni Public Cloud Qualificate	1	1	1.2	77.897,00			NO					PROGETTO NON AVVIATO	FORNITORE: 6 MESI A PARTIRE DALLA DATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA': 15 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE	03/06/2023	SI				
SI	H11F72001010006	Adozione delle piattaforme di identità digitale	1	1	1.4.4	14.000,00			SI					PROGETTO AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE: 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI CONTRATTUALIZZAZIONE	28/07/2023	SI				
SI	H15E2200070006	Realizzazione nuovo asilo nido Via Garibaldi	4 - Istruzione e ricerca	1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle scuole	1.1 - Piano per asili nido e scuole	€ 534.184,00			NO						Aggiudicazione lavori Avvio lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori Progettazione esecutiva	28/05/2024 31/05/2023 30/11/2023 31/12/2025 30/06/2026 30/07/2023	SI		15/05/2024 30/06/2026		
SI	H11B22001190007	Demolizione e ricostruzione in situ della scuola primaria ubicata in Via Garibaldi	2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	1.1 - Piano di sostituzione e di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	€ 4.245.800,00			NO						Progettazione esecutiva in caso di ricorso all'appalto integrato o alla semplificazione di affidamento di progettazione ed esecuzione lavori Aggiudicazione dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori Avvio dei lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori	31/01/2024 20/09/2023 31/03/2024 31/03/2026 30/06/2026 31/08/2023 30/11/2023 31/12/2025 30/06/2026	SI		30/06/2026		
SI	H15E22000280006	Realizzazione nuova mensa scolastica ubicata in Via Garibaldi	4 - Istruzione e ricerca	1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle scuole	1.2 - Piano di estensione del tempo	€ 420.000,00			NO						Aggiudicazione lavori Avvio dei lavori Conclusioni lavori Collaudo dei lavori	30/06/2026	SI			30/06/2026	



COMUNE DI SAN VENANZO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R-GIS	NOTE
(SI/NO)	(codice unico progetto)								(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente						Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	Indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	E222000030001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	2	4.2.2	50000	0	6913,73	50000	SI	50000	56913,73	4645,449	6913,73	CONCLUSO	PROGETTO CONCLUSO	31/12/2021	SI	31/12/2021			
SI	E29121003690001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEO VULCANOLOGICO	2	4.2.2	77703,71	0	0	77703,61	SI	77703,61	77703,61	701267,8	0	CONCLUSO	PROGETTO CONCLUSO	31/12/2022	SI	31/12/2022			
SI	E24H2000060001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ROTECASTELLO	2	4.2.2	999535,07	0	3884,18	0	NO	0	189331,94	0	0	AVVIATO	PROGETTO DEFINITIVO IN CORSO CONFERENZA DEI SERVIZI	12/06/2023	IN CORSO	12/06/2023	31/03/2026		

SOCCETTO ATTUATORE PNR	CEP (codice unico progetto)	SENTITICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTI ENTE FINANZIATO	IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI EFFETTUATI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISULTO DEL TERMINO (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RIGUS	NOTE
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	167H1005880006	L'INTERVENTO PREVEDE IL MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE TURISTICA E PARCO EVENTI "TASSIARE-LA PIA, AGIARRETTA E CASALE BELLE MACCHIE" SI COLLOCA NELL'ambito degli interventi di cui all'Allegato n. 1 del D'indiana Commissariale n.6 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del piano complementare nei territori colpiti dai sismi 2009-2016, 2017-2020, 2021-2026, "Linea di sviluppo strategico "Rigenerazione urbana e territoriale", "Linea di sviluppo strategico "Rigenerazione urbana e territoriale comunale" ai sensi dell'art.14 bis del decreto legge n. 31, maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 luglio 2021 n.108.	5	3	PNC - B1	EURO 315.000,00 onnessi con Ordinanza n.6 del 30.12.2021	EURO 47.250,00 a valere sul FONDO OPERE INDIFFERIBILI ANNO 2022 CONCESSO CON DECRETO DELLA REGIONE CALABRIA DELLO STATO ECONOMICI - RISG DEL 08/09/2023	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE FASE 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA LAVORI - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - ESECUZIONE LAVORI 25% FASE 5 - ESECUZIONE LAVORI 50% FASE 6 - ESECUZIONE LAVORI 75% FASE 7 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO	FASE 1 - TERMINE PREVISTO 31/12/2021 FASE 2 - TERMINE PREVISTO 30/09/2022 FASE 3 - TERMINE PREVISTO 30/09/2022 FASE 4 - TERMINE PREVISTO 30/09/2023 FASE 5 - In itinere FASE 6 - TERMINE PREVISTO 31/12/2024 FASE 7 - TERMINE PREVISTO 31/03/2026	TERMINI ULTIMO previsionale delle attività missione PNC fissato al 31/03/2026.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	16302100224006	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ATTIVAZIONE TURISTICA E PARCO EVENTI "TASSIARE-LA PIA, AGIARRETTA E CASALE BELLE MACCHIE" SI COLLOCA NELL'ambito degli interventi di cui all'Allegato n. 1 del D'indiana Commissariale n. 7 del 30/12/2021 per l'attuazione degli interventi del piano complementare nei territori colpiti dai sismi 2009-2016, 2017-2020, 2021-2026, "Linea di sviluppo strategico "Rigenerazione urbana e territoriale", "Linea di sviluppo strategico "Rigenerazione urbana e territoriale comunale" ai sensi dell'art.14 bis del decreto legge n. 31, maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 luglio 2021 n.108.	5	3	PNC - B1	EURO 300.000,00 onnessi con Ordinanza n.7 del 30.12.2021	EURO 135.000,00 a valere sul FONDO OPERE INDIFFERIBILI ANNO 2022 CONCESSO CON DECRETO DELLA REGIONE CALABRIA DELLO STATO ECONOMICI - RISG DEL 08/09/2023	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE (DET. ACQUANTARE) FASE 2 - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE FASE 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA LAVORI FASE 4 - AVVIO DEI LAVORI FASE 5 - ESECUZIONE LAVORI 25% FASE 6 - ESECUZIONE LAVORI 50% FASE 7 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO	FASE 1 - TERMINE PREVISTO 31/12/2021 FASE 2 - TERMINE PREVISTO 30/09/2022 FASE 3 - TERMINE PREVISTO 30/09/2022 FASE 4 - TERMINE PREVISTO 30/09/2023 FASE 5 - In itinere FASE 6 - TERMINE PREVISTO 31/12/2024 FASE 7 - TERMINE PREVISTO 31/03/2026	TERMINI ULTIMO previsionale delle attività missione PNC fissato al 31/03/2026.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	163H1900460001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CASO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI - L.145/2008 ART.1, COMMA 139 - CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA AD OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO	2	4	1.2.2	EURO 960.000 onnessi con Decreto del Ministero per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021 e successivo decreto diramato dal Dipartimento di Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021.	EURO 960.000 onnessi con Decreto del Ministero per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021 e successivo decreto diramato dal Dipartimento di Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021.	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO	FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO	TERMINI ULTIMO cronoprogramma previsionale delle attività missione PNC fissato al 31/03/2026.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	169F7100740001	LEGGI N.90 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AD OPERE PUBBLICHE CALABRIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVINTO DI S. CROCE".	2	4	1.2.2	EURO 50.000 onnessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUALITA' 2021	EURO 100.000 onnessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUALITA' 2021	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO	FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO	TERMINI ULTIMO fissato al 31/12/2023.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	169F7100740001	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AD OPERE PUBBLICHE CALABRIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVINTO DI S. CROCE".	2	4	1.2.2	EURO 100.000 onnessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUALITA' 2021	EURO 100.000 onnessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUALITA' 2021	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO	FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO	TERMINI ULTIMO fissato al 31/12/2022.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	169H2000010001	"LEGGI 27.12.2019 N.160 ART.1, COMMI 29-30 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO ANNO 2020 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AD OPERE PUBBLICHE CALABRIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVINTO DI S. CROCE".	2	4	1.2.2	EURO 50.000 onnessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUALITA' 2020	EURO 50.000 onnessi con LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART.1, COMMA 29 LETT.B ANNUALITA' 2020	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI FASE 3 - AVVIO DEI LAVORI FASE 4 - CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO	FASE 1 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 3 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - NESSUN TERMINE PREVISTO	TERMINI ULTIMO fissato al 31/12/2021.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	16622000300006	FONDO CONDIZI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - ART.6 QUATER DL N.93/2017 - D.P.C.M. del 17 dicembre 2021. FONDI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI FINANZIABILI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' TECNICO - ECONOMICA (PTED) PER LA RIGUALIFIAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DI AREE PUBBLICHE IN SANT'ANATOLIA DI NARCO - NEXT STOP-SANT'ANATOLIA DI NARCO - ATTIVITA' DI CAMPAGNA - FINEE NIEKA				EURO 14.044,51 CONCESSI CON ART.6 QUATER DL N.93/2017 - D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.	EURO 14.044,51 CONCESSI CON ART.6 QUATER DL N.93/2017 - D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.	NO	(S/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente	Indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	Indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione prevista	PROGETTO AVVIATO	FASE 1 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE FASE 2 - VERIFICA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE	FASE 1 - TERMINE PREVISTO 28/02/2023 FASE 2 - NESSUN TERMINE PREVISTO FASE 4 - TERMINE PREVISTO 31/12/2021	TERMINI ULTIMO cronoprogramma previsionale delle attività missione PNC fissato al 31/03/2026.	MONITORAGGIO TRAMITE BDAP - MCP-GP	NON SONO STATI INDICATI I DATI RELATIVI A MISSIONE COMPONENTE E MISURIN QUANTO AGLI STATI LOCALI DELL'INTERVENTO	

SOCCETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESSIONE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/ NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A R&GS	NOTE
(SI/NO)	(codice unico progetto)								(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente					indicare in successione, per riga, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	D71C2200123006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	1	1.2	47.427,00	0,00	0,00	NO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	INSERIMENTO CUP ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA CONTRATTUALIZZAZ. DEL FORNITORE ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. COMPLETAM. DELLE ATTIVITA' ENTRO 450 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNIT.	ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. ENTRO 450 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE	SI SI -	28/06/2024	NESSUNA - NON SONO PREVISTE ATTIVITA' IN REGIS	
SI	D71F22002850006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	1	1	1.4.5	23.147,00	0,00	0,00	NO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	INSERIMENTO CUP ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA CONTRATTUALIZZ. DEL FORNITORE ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. COMPLETAM. DELLE ATTIVITA' ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNIT.	ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE	SI -	12/09/2023	NESSUNA - NON SONO PREVISTE ATTIVITA' IN REGIS	
SI	D71F22003360006	MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	1	1	1.4.1	79.922,00	0,00	0,00	NO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA CONTRATTUALIZZ. DEL FORNITORE ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. COMPLETAM. DELLE ATTIVITA' ENTRO 270 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE	ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA AMMISSIBILITA' DOMANDA ENTRO 180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZ. ENTRO 270 GIORNI DALLA DATA DI CONTRATTO FORNITORE	SI -	29/03/2024	NESSUNA - NON SONO PREVISTE ATTIVITA' IN REGIS	
SI	D77H18000160001	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI AIALE DANNEGGIATA PER FRANA A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013	2	4	2.2	200.200,00	0,00	0,00	SI	200.200,00 €	200.200,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023	DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'	

SI	D77H18000170001	MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTEFUME INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL FEBBRAIO 2014	2	4	2.2	85.500,00	0,00	0,00	0,00	SI	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/08/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 COLLAUDO DEI LAVORI ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D77H18000180001	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COL DELLA MOZZA DANNEGGIATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	2	4	2.2	151.800,00	0,00	0,00	0,00	SI	151.800,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 20/05/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/05/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/08/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D77H18000200001	MESSA IN SICUREZZA LOC.BUOTIANO STRADA VICINALE DI CASTELLUCCIO E FOSSE DELLA FORCE E RIFACIMENTO PONTE CROLLATO A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018)	2	4	2.2	180.300,00	0,00	0,00	0,00	SI	180.300,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 COLLAUDO DEI LAVORI ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2024	SI	31/03/2024	NESSUNA CRITICITA'

SI	D77H18000270001	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI COLDIPECCIO E CONSOLIDAMENTO VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018)	2	4	2.2	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI ENTRO 30/06/2023 INIZIO DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D79H18000190001	MESSA IN SICUREZZA FOSCO DELLA PEZZA E SIST. IDRALICA CON RIFACIMENTO ARGINI DANNEGGIATI ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018)	2	4	2.2	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00 €	157.000,00 €	0,00 €	30,00 €	AVVIATO	DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI n. 70 del 04/05/2022 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 01/07/2022 INIZIO DEI LAVORI 22/11/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D77H1800021001	CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E RIFACIMENTO STRADALE E CUNETTE LATERALI STRADA COMUNALE MONTE ALTO DANNEGGIATI DA EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2013 (ART.1 C.139 L.145/2018)	2	4	2.2	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	43.249,44 €	AVVIATO	DETERMINA ESECUTIVITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI n. 53 del 08/04/2022 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 30/05/2022 INIZIO DEI LAVORI 06/06/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 30/07/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 30/09/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D77H20000840001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DI CASA CCE E PASCELUPU.	2	4	2.2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	25.868,92 €	AVVIATO	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2020 INIZIO DEI LAVORI 15/09/2020 FINE DEI LAVORI 19/03/2021 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 07/04/2021 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGS ENTRO 31/08/2023	SI	31/08/2023	NESSUNA CRITICITA'

SI	D77H21004240001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MONTE CUCCO.	2	4	2.2	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 €	25.868,92 €	0,00 €	AVVIATO	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 15/10/2021 FINE DEI LAVORI 04/07/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 07/09/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 15/10/2021 FINE DEI LAVORI 04/07/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 07/09/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023	SI	31/08/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D79I21009460001	SOSTITUZIONE INFISSI EX SCUOLA ELEMENTARE DI SCHEGGIA	2	4	2.2	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 €	58.789,23 €	0,00 €	AVVIATO	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 14/10/2021 FINE DEI LAVORI 24/05/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 24/05/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/10/2021 INIZIO DEI LAVORI 14/10/2021 FINE DEI LAVORI 24/05/2022 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 24/05/2022 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/08/2023	SI	31/08/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D79F22000840001	MESSA IN SICUREZZA STRADA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE IN LOC. PIETRAGROSSA	2	4	2.2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2022 INIZIO DEI LAVORI 14/09/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/08/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI 14/09/2022 INIZIO DEI LAVORI 14/09/2022 FINE DEI LAVORI ENTRO 31/08/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ENTRO 31/10/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/12/2023	SI	31/12/2023	NESSUNA CRITICITA'
SI	D71E22000050001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO DI SCHEGGIA (ART.1 C.51-58 L.160/2019 - ANNUALITA' 2022)	1	3	2.1	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 9 DEL 27/01/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 17 DEL 03/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTRO 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/03/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 9 DEL 27/01/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 17 DEL 03/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTRO 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTRO 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTRO 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTRO 31/03/2024	SI	31/03/2024	NESSUNA CRITICITA'

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPU

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SI	D74E2200060001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO DI ISOLA FOSSARA (ART.1 C.51-58 L.1460/2019 - ANNUALITA' 2022)	1	3	2.1	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	AVVIATO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 10 DEL 27/07/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 16 DEL 08/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 31/05/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 10/06/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTR SERVIZIO ENTR 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR DEFINITIVA ENTR 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTR 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DEL INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTR 31/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 10 DEL 27/07/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 16 DEL 08/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 31/05/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 10/06/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTR SERVIZIO ENTR 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR DEFINITIVA ENTR 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTR 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DEL INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTR 31/09/2024	SI	31/03/2024	NESSUNA CRITICITA'
SI	D74D22000160001	MESSA IN SICUREZZA VAL DI RANIERA	2	4	2.2	98.520,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 11 DEL 27/07/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 18 DEL 08/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 31/05/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTR 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTR 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DEL INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTR 31/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 11 DEL 27/07/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 18 DEL 08/02/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 31/05/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 31/05/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTR 30/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR 01/07/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTR 31/10/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 01/11/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 15/12/2023 ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO ENTR 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DEL INTERVENTO A MEZZO PIATTAFORMA REGIS ENTR 31/09/2024	SI	31/03/2024	NESSUNA CRITICITA'
SI	D74E22000000002-	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI SCHEGGIA "F.COLDAGELLI-D.CENCI"	4	1	3.3	2.078.735,08	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 25/05/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTR 31/05/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTR 10/06/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTR 15/06/2023 SERVIZIO ENTR 16/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 16/06/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 15/07/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ENTR 30/07/2023 INIZIO PROCEDURA DI GARA LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 01/08/2023 FINE PROCEDURA DI GARA LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 31/08/2023 DETERMINA AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI ENTR 15/09/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ENTR 15/09/2023 AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI ENTR 31/10/2023 STIPULAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI ENTR 31/01/2024 CONSEGNA LAVORI ENTR 31/05/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 25/05/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTR 31/05/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTR 10/06/2023 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENTR 15/06/2023 SERVIZIO ENTR 16/06/2023 INIZIO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 16/06/2023 FINE FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ENTR 15/07/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ENTR 30/07/2023 INIZIO PROCEDURA DI GARA LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 01/08/2023 FINE PROCEDURA DI GARA LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 31/08/2023 DETERMINA AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI ENTR 15/09/2023 DETERMINA ESECUTIVA AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ENTR 15/09/2023 AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI ENTR 31/10/2023 STIPULAZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI ENTR 31/01/2024 CONSEGNA LAVORI ENTR 31/05/2024	SI	31/12/2025	NESSUNA CRITICITA'

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CLUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPICCONI ASSIUNTIVI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTIVO AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASE PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RAGS	NOTE
SI	#B321004750006 - #B8319000180005	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. VALCASANA, AREA PACHINA E STRUTTURATA POLIVALENTE LOTTO1 - LOTTO2 - LOTTO3	5	3	INV. 1.1	€ -	€ 600.000,00	€ 475.000,00	NO	€	933,00	€ 585.176,60	AVVIATO	Ultimazione lavori 17/11/2023	Ultimazione lavori 17/11/2023	SI	17/11/2023	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate
SI	#B821004800006	RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI DI RELAZIONE E DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO	5	3	INV. 1.1	€ -	€ 1.035.000,00	€ -	NO	€	835.583,98	€ -	AVVIATO	Ultimazione lavori 24/11/2023	Ultimazione lavori 24/11/2023	SI	24/11/2023		
SI	#B7H21012480006	STRADA COMUNALE CONTAGHIA SCHIOPPO-COLEFABBRIS E STRADA COMUNALE OSTERIA-CANTIERO CIVITELLA-CIVITELLA. PRIGIONE COLOGNESI EDE STRADALE DI CANTIERELLA STRADALI	5	3	INV. 1.1	€ -	€ 382.250,00	€ -	NO	€	264.111,32	€ -	AVVIATO	Ultimazione lavori 12/09/2023	Ultimazione lavori 12/09/2023	SI	12/09/2023		
SI	#B4H20001360001	INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI CON RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA DI ACCESSO ALLA FRAZ. DI SAN VALENTINO	2	4	2.2	€ 300.000,00	€ -	€ -	SI	€	292.162,98	€ 7.837,02	AVVIATO	Ultimazione lavori 12/02/2023	Ultimazione lavori 12/02/2023	SI	12/02/2023		
SI	#B3H1900040005	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN SCHEGGINO	4	1	3.3	€ 284.215,00	€ -	€ 125.000,00	SI	€	314.332,74	€ 170.549,09	AVVIATO	Ultimazione lavori 18/12/2021	Ultimazione lavori 18/12/2021	SI	18/12/2021		
SI	#B4E2000600001	MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONE STRADALE IN AREA VERDE	2	4	2.2	€ 50.000,00	€ -	€ -	SI	€	59.105,59	€ 48.482,26	AVVIATO	Ultimazione lavori 03/11/2021	Ultimazione lavori 03/11/2021	SI	03/11/2021		
SI	#B1B2100520001	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN SCHEGGINO CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S.209 "VALNERINA" ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	2	4	2.2	€ 100.000,00	€ -	€ -	SI	€	95.505,38	€ 402,47	AVVIATO	Ultimazione lavori 25/11/2022	Ultimazione lavori 25/11/2022	SI	25/11/2022		
SI	#B2B2200520006	ABBITAMENTO DELLE BANCHE E ABBITAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN PIAZZA XXIII LUGLIO	2	4	2.2	€ 50.000,00	€ -	€ -	SI	€	50.000,00	€ -	AVVIATO	Ultimazione lavori 14/12/2022	Ultimazione lavori 14/12/2022	SI	14/12/2022		
SI	#B8H21000500006	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO CON LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA	4	1	1.1	€ 670.000,00	€ -	€ -	NO	€	-	€ -	NON AVVIATO	Affidamento servizi tecnici 31/05/2023	Ultimazione lavori 31/12/2025		31/12/2025		



SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRI FONDI (euro)	PROGETTO PRESENTISTENTE	IMPORTO PRECEDENTI IMPIEGHI ASSUNTI AL 31/12/2022 (euro)	PAGAMENTI DISPOSTI SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASE PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A IGCS	NOTE
(SI/NO)									(SI/NO)	da compilare in caso di risposta affermativa nella colonna precedente				indicare in successione, per fila, la fase procedurale prevista dal cronoprogramma	indicare per ogni fase procedurale il termine ultimo di conclusione previsto	da compilare in successione per ogni fase procedurale	indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	J8321004750006 - J83910002180005	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. VALCASANA, AREA PISCINA E STRUTTURA PODOVALENTE LOTTOLI - LOTTOS - LOTTO3				€ -	€ 600.000,00	€ 475.000,00	NO	€ 585.176,60	€ 933,00	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 17/11/2023			17/11/2023		
SI	J83021004380006	RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI DI RELAZIONE E DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO				€ -	€ 1.035.000,00	€ -	NO	€ 835.583,98	€ -	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 24/11/2023			24/11/2023		
SI	J87H21012480006	STRADA COMUNALE CONTAGLIA SCHIOPRO-COLLEBARBE E STRADA COMUNALE OSTERIA-CIMITERO CIVITELLA-CIVITELLA - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE E FASCE DI PERTINENZA STRADALI				€ -	€ 362.250,00	€ -	NO	€ 264.111,32	€ -	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 12/09/2023			12/09/2023		
SI	J84H20001060001	INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI CON RINNOVAMENTO DELLO STATO ALLA FRAZ. DELL'INSPIRATO ALTO ALTO DI SAN VALENTINO	2	4	2.2	€ 300.000,00	€ -	€ -	SI	€ 300.000,00	€ 7.837,02	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 12/02/2023			12/02/2023		
SI	J83H19000440005	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN SCHEGGINO CAPOLUOGO, PIAZZA XVIII LUGLIO	4	1	3.3	€ 284.215,00	€ 125.000,00	€ -	SI	€ 284.215,00	€ 170.549,09	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 18/12/2021			18/12/2021		
SI	J84E20006600001	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE ATTREZZATA E VIABILITA' IN FRAZ. CESELLI	2	4	2.2	€ 50.000,00	€ -	€ -	SI	€ 50.000,00	€ 48.482,26	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 03/11/2021			03/11/2021		
SI	J81B21005320001	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN SCHEGGINO CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S.209 "VALNERINA" ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	2	4	2.2	€ 100.000,00	€ -	€ -	SI	€ 100.000,00	€ 405,47	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 25/11/2022			25/11/2022		
SI	J82B21005020006	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA REALIZZAZIONE DI POLO PER L'INFANZIA - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO CON LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ABBIRE AD ASILO NIDO	2	4	2.2	€ 50.000,00	€ -	€ -	SI	€ 50.000,00	€ -	-	AVVIATO	Ultimazione lavori 14/12/2022			14/12/2022		
SI	J88H21000050006	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO CON LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ABBIRE AD ASILO NIDO	4	1	1.1	€ 670.000,00	€ -	€ -	NO	€ -	€ -	-	NON AVVIATO	Affidamento servizi tecnici 31/05/2023			31/12/2025		

COMUNE DI SELLANO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATOR E PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NO AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE	
SI	E91C200110006	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	1	1.1.2		47.427,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	SOGGETTI REALIZZATORI	11/09/2023	SI	11/02/2023		ISCRITTI B.P. 2023	
														ASSEGNAZIONE ATTIVITA'		SI				
														CARICAMENTO CONTRATTI		SI				
														COMPLETAMENTO ATTIVITA'		SI				
														RICHIESTA FINANZIAMENTO		SI				
SI	E91F200353006	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022	1	1.1.4.1		79.922,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	SOGGETTI REALIZZATORI	03/07/2023	SI	03/04/2024		ISCRITTI B.P. 2023	
														ASSEGNAZIONE ATTIVITA'		SI				
														CARICAMENTO CONTRATTI		SI				
														COMPLETAMENTO ATTIVITA'		SI				
														RICHIESTA FINANZIAMENTO		SI				
SI	E91F200365006	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	1	1.1.4.5		23.147,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	SOGGETTI REALIZZATORI	31/05/2023	SI	01/12/2023		ISCRITTI B.P. 2023	
														ASSEGNAZIONE ATTIVITA'		SI				
														CARICAMENTO CONTRATTI		SI				
														COMPLETAMENTO ATTIVITA'		SI				
														RICHIESTA FINANZIAMENTO		SI				
SI	E91F200990001	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	1	1.1.4.3		4.856,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	SOGGETTI REALIZZATORI	19/07/2023	SI	19/03/2024		ISCRITTI B.P. 2023	
														ASSEGNAZIONE ATTIVITA'		SI				
														CARICAMENTO CONTRATTI		SI				
														COMPLETAMENTO ATTIVITA'		SI				
														RICHIESTA FINANZIAMENTO		SI				
SI	E91F200225000	1.4.3 - app IO - Comuni - Settembre 2022	1	1.1.4.3		3.402,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	SOGGETTI REALIZZATORI	10/07/2023	SI	10/03/2024		ISCRITTI B.P. 2023	
														ASSEGNAZIONE ATTIVITA'		SI				
														CARICAMENTO CONTRATTI		SI				
														COMPLETAMENTO ATTIVITA'		SI				
														RICHIESTA FINANZIAMENTO		SI				
SI	E91F200223006	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Settembre 2022	1	1.1.4.4		14.000,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	NON AVVIATO	SOGGETTI REALIZZATORI	28/03/2024	SI	28/01/2025		ISCRITTI B.P. 2023	
														ASSEGNAZIONE ATTIVITA'		SI				
														CARICAMENTO CONTRATTI		SI				
SI	E991200506001	Efficientamento energetico centrale idroelettrica fiume Vigi	2	A.2.2		100.000,00	0,00	33.615,24	SI	100.000,00	133.615,24	81.967,21	AVVIATO	INTERVENTO COMPLETATO	13/09/2023	SI	31/12/2023	Determina n. 125 del 10.03.2023 - Affidamento gestione AMMINISTRAZIONE PER € 33.615,24 PROGETTO NON NATIVO REGIS	COFINANZIATO ISCRIZIONE AVANZO DI AFFIDAMENTO GESTIONE PER € 33.615,24 PROGETTO NON NATIVO REGIS	
		Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione nelle località di Civitella, Villamagna, Mocali, strada																		
SI	E912000090001	Villamagna/Sellano, Sellano ed in località le	2	A.2.2		50.000,00	0,00	5.396,79	SI	50.000,00	55.396,80	40.983,61	AVVIATO	INTERVENTO COMPLETATO	25/11/2023	SI	31/12/2023	Determina n. 127 del 10.03.2023 - Affidamento gestione portale REGIS PROGETTO NON NATIVO REGIS	COFINANZIATO QUOTA PARTE CONTRIBUTO DEL B.I.M.	
		Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione nelle località di San Martino, Valico del Soglio, Pupaggi, Apagni, Le Vene, Casaleto, Celle, Fontemarina, Orsano, Casa Rampi e																		
SI	E594H200060001	Catcombe	2	A.2.2		50.000,00	0,00	30.000,00	SI	50.000,00	80.000,00		AVVIATO	CONCLUSIONE INTERVENTO	31/12/2023				PROGETTO NON NATIVO REGIS	COFINANZIATO QUOTA PARTE CONTRIBUTO DEL B.I.M.

SI	E91B21006090001	Ponte pedonale sospeso di collegamento tra il borgo di Montessanto e il centro storico di Sellano attraversando il fiume Viù.	PNC	A. 3.1	0,00	1.610.000,00	0,00	INO	0,00	1.400.000,00	150,00	AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO	30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026			Determina n. 23 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS
		Lavori per la riqualificazione ed implementazione del polo sportivo polifunzionale di sellano	PNC	A. 3.3	0,00	671.048,36	0,00	NO	0,00	671.075,60	35.479,42	AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO	30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026			Determina n. 29 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS
SI	E91B21006090001	Lavori per l'intervento di implementazione e miglioramento delle strade comunali di collegamento tra la s.p.466 e Montessanto, tra le località di Setri e Peneggi e dal bivio tra la s.p.466 e Petruogiano	PNC	A. 4.5	0,00	471.500,00	0,00	INO	0,00	471.500,00		AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO	30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026			Determina n. 31 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS
SI	E96J21012900001	Lavori per l'intervento di riqualificazione di viale Guglielmo Marconi e del centro storico di Sellano capoluogo	PNC	A. 3.1	0,00	345.000,00	0,00	NO	0,00	345.000,00		AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO	30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026			Determina n. 32 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS
SI	E95F21003100001	Lavori per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del versante ovest delle mura urbane di Montessanto	PNC	A. 3.1	0,00	345.000,00	0,00	INO	0,00	345.000,00		AVVIATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO PROCEDURA DI GARA CONSEGNA LAVORI CONCLUSIONE INTERVENTO	30/06/2022 SI 31/12/2022 SI 31/03/2023 SI 31/12/2026			Determina n. 33 del 18.01.2023 - Affidamento gestione portale REGIS

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CUP (codice unico progetto)	SINTESI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RESORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGCS	NOTE	
SI	B19D20003850001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIVICO LIMBIERO COMUNALE	2	4.2.2	50.000,00	50.000,00		49999,97	SI	50.000,00	49999,97	45454,53	AVVIATO	Approvazione progetto 24/08/2020 Affidamento Lavori 08/09/2020 Certificato di Collaudo o di Regolare esecuzione 09/02/2021	24/08/2020 SI 15/09/2020 SI 31/12/2021 SI	da compilare in successione per ogni fase procedurale indicare il termine ultimo per la realizzazione dell'intero intervento	31/12/2021	Indicare eventuali criticità riscontrate	Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi successivamente nei fondi PNRR o PNC	
SI	B1F7200102240005	ADDEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA	2	4.2.2	100.000,00	100.000,00	2540,69	102540,69	SI	100.000,00	102540,69	92132,41		Approvazione progetto 28/07/2021 Affidamento Lavori 03/09/2021 Fine lavori 05/11/2021 Certificato di Regolare Esecuzione 12/11/2021	28/07/2021 SI 15/09/2021 SI 31/12/2021 SI				nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi confluiti successivamente nei fondi PNRR o PNC	
SI	B14H20003640001	RICOSTRUZIONE PONTE FOSCO DONA E ALTO FOSCO DELLE LECCE	2	4.2.2	950.000,00	950.000,00		190000	SI	950.000,00	190000	14050,17	NON AVVIATO	Approvazione progetto 10/05/2023 Affidamento lavori 01/07/2023 Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione	10/05/2023 SI 30/06/2023 SI				Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi	
SI	B14H2000500006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	4.2.2	50.000,00	50.000,00		49268,13	NO		49268,13		AVVIATO	Approvazione progetto 02/09/2022 Affidamento Lavori 02/09/2022 Fine lavori 31/10/2022 Regolare Esecuzione 06/03/2023	02/09/2022 SI 15/09/2022 SI 31/12/2023 SI				Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi	
SI	B13H9000750001	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	4	1.3.3	2.235.000,00	2.235.000,00		269021,11	SI	2.235.000,00	269021,11	1333	NON AVVIATO	Approvazione progetto 05/05/2021 Affidamento Lavori 01/07/2021 Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione	05/05/2021 SI 24/09/2021 SI 31/12/2023 SI	No - in attesa di risposta da parte del ministero della conferma o meno del contributo comasno				Piattaforma complessa difficoltà nell'inserimento dati, norme non chiare in merito ai documenti e alle informazioni da caricare nel portale in particolare modo per gli interventi successivamente nei fondi PNRR o PNC
SI	B1F72000890006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE	1	4.1.5	23147				NO				NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 50 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 180 giorni dalla data di notifica del finanziamento del fornitore	31/05/2023		27/11/2023			
SI	B11C20016510006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOCCI	1	1.1.2	47427				NO				NON AVVIATO	FORNITORE 180 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	04/12/2023					
SI	B1F72000340006	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - RICHIESTE	1	1.1.4	79922				NO				NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 180 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	03/07/2023					
SI	B1F720009550006	UTILIZZO APP IC PER AVVISO SCARICAZIONE DOCUMENTI	1	1.1.4.3	4374				NO				NON AVVIATO	CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE 180 giorni dalla notifica PEC del finanziamento COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 240 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore	28/03/2024					
															08/05/2024					

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPENGI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RESPIETTO DEI TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A BECS	NOTE
S (soggetto pubblico)	E34H20005000001	LAVORI PER LA "MESSA IN SICUREZZA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO" (AGUZZO D.M. 3/08/2020 e L. 14/5/2018)	M2	C4	2.2	€ 957.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	€ 870.000,00	TOTALE IMPEGNI € 957.000,00	Liq. 505/2022 - € 13.708,80 - Studio geologo Luca Labella Liq. 94/9/2022 - € 375,00 - Spese gara ANAC	Progetto avviato	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 58 del 06/05/2022; Determina affidamento lavori: 29/12/2022; Determina Responsabile LL.PP. n. 2/25 del 29/12/2022; Contratto di appalto: 13/04/2023 - Rep. n. 203/2023 - registrato a Terni al n. 2325 del 13/04/2023 serie 1T Esecuzione dei lavori: 150 giorni dal verbale di consegna dei lavori	31/12/2022	SI	31/12/2023	In fase di inserimento	Progetto di importo complessivo originario di € 870.000,00 incrementato di € 87.000,00 con risorse di cui al fondo delle opere indifferibili di cui al D.P.C.M. 28.02.2022	
S (soggetto pubblico)	E31E2000190001	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO VIGENTI DEL PLESSO SCOLASTICO "I LANZI" - PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO*	M2	C4	2.2	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 9.153,25	SI	€ 50.000,00	TOTALE IMPEGNI € 59.153,15	Liq. 7/8/2020 - € 2.517,99 - Ing. Puxeddu Antonio	Progetto avviato	Conclusione intervento 19/12/2022	31/12/2022	SI	31/12/2022	In fase di inserimento	-	
S (soggetto pubblico)	E34E2100152001	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO VIGENTI DEL PLESSO SCOLASTICO "I LANZI" - PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO*	M2	C4	2.2	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 4.009,90	SI	€ 100.000,00	TOTALE IMPEGNI € 104.009,90	Nessuno	Nessuno	Progetto avviato	Conclusione intervento 16/12/2022	31/12/2022	SI	31/12/2022	In fase di inserimento	-
S (soggetto pubblico)	E33C2000590006	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E ANTINCENDIO A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI, PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO "I LANZI"	M2	C4	2.2	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	€ 50.000,00	TOTALE IMPEGNI € 50.000,00	Nessuno	Nessuno	Progetto avviato	Approvazione del progetto; Delibera Giunta Comunale n. 111 del 09/09/2022; Determina affidamento lavori: 14/09/2022; Determinazione responsabile LL.PP. n. 136 del 14/09/2022; Inizio lavori: 15/09/2022 Fine Lavori: Verbale del 15/09/2022 Fine Lavori: 12/02/2023	09/09/2022; 14/09/2022; 15/09/2022; 31/12/2023 (verbale sospensione lavori del 21-09-2022)	SI	31/12/2023	In fase di inserimento	-
S (soggetto pubblico)	E33C20002310006	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Territorio comunale, n. 13 servizi da migrare	1	1	1.2	€ 77.897,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Progetto NON avviato	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 04/10/2022 Candidatura ammessa 07/10/2022 Decreto di finanziamento 14/12/2022 (n. 85 - 2/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 11/09/2023 04/12/2024	25/07/2022 (candidatura n. 4/0003) 04/10/2022 07/10/2022 14/12/2022 (n. 85 - 2/2022 - PNRR) 11/09/2023 04/12/2024	SI	04/12/2024	-	-	
S (soggetto pubblico)	E33F20003920006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino. Sito comunale e servizi digitali per il cittadino	1	1	1.4.1	€ 79.922,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Progetto NON avviato	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 26/09/2022 (candidatura n. 51470) 08/11/2022 Candidatura ammessa 08/11/2022 Iscrizione CLP 09/01/2023 (n. 135 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 03/07/2023 29/09/2024	26/09/2022 (candidatura n. 51470) 08/11/2022 09/01/2023 (n. 135 - 1/2022 - PNRR) 03/07/2023 29/09/2024	SI	29/03/2024	-	-	
S (soggetto pubblico)	E33F20004150006	Applicazione AppO - Territorio comunale, n. 27 servizi da attivare	1	1	1.4.3	€ 6.561,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	Nessuno	TOTALE IMPEGNI € 6.561,00	Nessuno	Progetto avviato	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 02/07/2022 (candidatura n. 3/20) Candidatura ammessa 06/07/2022 Iscrizione CLP 11/07/2022 Decreto di finanziamento 12/08/2022 (n. 24 - 3/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 27/09/2023 30/11/2023	02/07/2022 (candidatura n. 3/20) 06/07/2022 11/07/2022 12/08/2022 (n. 24 - 3/2022 - PNRR) 27/09/2023 30/11/2023	SI	30/11/2023	-	-	
S (soggetto pubblico)	E33F2000210006	Piattaforma PagoPA - Territorio comunale, n. 67 servizi da attivare	1	1	1.4.3	€ 40.669,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Progetto NON avviato	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 19/04/2022 (candidatura n. 315) Candidatura ammessa 04/05/2022 Iscrizione CLP 07/05/2022 Decreto di finanziamento 13/07/2022 (n. 23 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 09/01/2023 06/09/2023	19/04/2022 (candidatura n. 315) 04/05/2022 07/05/2022 13/07/2022 (n. 23 - 1/2022 - PNRR) 09/01/2023 06/09/2023	SI	06/09/2023 (rinuncia al finanziamento in data 07/01/2023)	-	Comunicata la rinuncia al finanziamento in data 07/01/2023 Decreto presa d'atto rinuncia al finanziamento n. 23 - 1 - 13/2022 - PNRR del 19/01/2023	
S (soggetto pubblico)	E33F2000240006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - territorio comunale - integrazione di SpID e CIE	1	1	1.4.4	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Progetto NON avviato	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 19/04/2022 (candidatura n. 314) Candidatura ammessa 07/05/2022 Iscrizione CLP 07/05/2022 Decreto di finanziamento 02/08/2022 (n. 25 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 28/07/2023 23/05/2024	19/04/2022 (candidatura n. 314) 07/05/2022 07/05/2022 02/08/2022 (n. 25 - 1/2022 - PNRR) 28/07/2023 23/05/2024	SI	23/05/2024	-	-	
S (soggetto pubblico)	E33F20003810006	Piattaforma notifiche digitali (PND) - territorio comunale - notifiche vidazioni al codice della strada	1	1	1.4.5	€ 23.147,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Progetto NON avviato	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 26/09/2022 (candidatura n. 51500) Candidatura ammessa 12/10/2022 Iscrizione CLP 17/10/2022 Decreto di finanziamento 03/01/2023 (n. 131 - 1/2022 - PNRR) Approvazione progetto e contrattualizzazione 31/05/2023 27/11/2023	26/09/2022 (candidatura n. 51500) 12/10/2022 17/10/2022 03/01/2023 (n. 131 - 1/2022 - PNRR) 31/05/2023 27/11/2023	SI	27/11/2023	-	-	

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

SOGGETTO ATTUATORE PNRR (SI/NO)	CLUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL PNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE (SI/NO)	IMPORTO PRECEDENTEMENTE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISIO	RESPIETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RCGS	NOTE	
SI	C7F22002790006	Piattaforma Notifiche Digitali			1.4.5.	23.147,00			NO					NON AVVIATO	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ESECUZIONE	03.05.2023 13.07.2023					
SI	C7C22004820006	Abilitazione ai Cloud			1.2	77.897,00			NO					NON AVVIATO	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ESECUZIONE	04.12.2023 25.02.2025					

SOGGETTO ATTUATOR E PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PREESISTENTE	IMPORTO PRECEDENTI EMEN TE FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NO N AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (S/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A REGIS	NOTE
<b>AREA VIGILANZA - PROGETTI RELATIVI ALLA DIGITALIZZAZIONE</b>																				
SI	D9 JF22001970006	Utilizzo della piattaforma nazionale di identità digitale - CIE	1		1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 1/2022	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	10/07/2023 SI	23/05/2024, NON SCADUTO	23/05/2024	per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale	
SI	D9 JF2200140006	Abilitazione al cloud per le PA Locali	1		1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni 1 Aprile 2022	77.897,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	30/07/2023 SI	23/05/2024, NON SCADUTO	31/07/2024	per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale	
SI	D9 JF22002360006	Estensione dell'utilizzo APP IO	1		1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	9.963,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	09/08/2023 SI	27/11/2023, NON SCADUTO	27/11/2023	per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale	
SI	D9 JF22003070006	Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali	1		1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	23.147,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	17/10/2023 SI	27/09/2023, NON SCADUTO	27/09/2023	per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale	
SI	D9 JF22003630006	Adeguamento sito WEB situazionale	1		1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	28.902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	13/11/2023 SI	28/03/2024, NON SCADUTO	28/03/2024	per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale	
SI	D5 JF2200680006	Integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati	1		1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - COMUNI (Settembre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	10.172,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NON AVVIATO	INSERIMENTO CUP CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	24/12/2023 SI	27/11/2023, NON SCADUTO	27/11/2023	per i progetti relativi al digitale non è prevista la rendicontazione a obiettivi tramite il sistema regis ma la rendicontazione a obiettivi tramite il portale PA digitale	

SI	D912200270006	Estensione dell'utilizzo piattaforma PagePA	1	1	COMUNI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RINUNCIATO	09/09/2023	SI	RINUNCIATO	presentazione nuova candidatura
AREA TECNICA - OPERE PUBBLICHE															
SI	D9302000120001	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2020 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIA ROMA Fraz. CASACASTALDA	2	4	2.1	47.541,28 €	- €	- €	no	no	AVVIATO	15/09/2020	SI	31/12/2021	Le risorse relative ai contributi L. 160/2019 2020-2021-2022 erano gestiti in un unico capitolo di bilancio di entrata e di spesa. Successivamente al passaggio in PNRR avvenuto nel 2022, non era possibile modificare tale imputazione riferita ad esercizi chiusi. Si è provveduto, come da indicazione della RGS a rinominare il capitolo E. 102/A e U. 2812 al fine di riportare il CUP dell'intervento 2022.
SI	D9302001540006	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ECONOMICHE ANNUALITA' 2020 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA ROMA Fraz. CASACASTALDA.	2	4	2.1	2.488,72 €	- €	- €	no	no	AVVIATO	31/12/2021	SI		L'opera verrà affidata e inserita in REGIS, a seguito dello svincolo delle economie di progetto (economie di gara Anno 2021) come da disposizioni del Ministero dell'Interno
SI	D99121008420001	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CARPIOLUOGO E FRAZ. DI CASACASTALDA PRIMO STRALCIO	2	4	2.1	72.582,58 €	- €	- €	no	no	AVVIATO	15/09/2021 (prorogato al 31/12/2021)	SI	31/12/2022	Le risorse relative ai contributi L. 160/2019 2020-2021-2022 erano gestiti in un unico capitolo di bilancio di entrata e di spesa. Successivamente al passaggio in PNRR avvenuto nel 2022, non era possibile modificare tale imputazione riferita ad esercizi chiusi. Si è provveduto, come da indicazione della RGS a rinominare il capitolo E. 102/A e U. 2812 al fine di riportare il CUP dell'intervento 2022.
SI	D92E2200130006	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ECONOMICHE ANNUALITA' 2021 - COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2	4	2.1	27.417,42 €	- €	- €	no	no	AVVIATO	31/12/2022	SI		L'opera verrà affidata e inserita in REGIS, a seguito dello svincolo delle economie di progetto (economie di gara Anno 2021) come da disposizioni del Ministero dell'Interno
SI	D92E22000450006	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CARPIOLUOGO E FRAZ. DI CASACASTALDA SECONDO STRALCIO	2	4	2.1	36.911,85 €	- €	- €	no	no	AVVIATO	15/09/2022 (prorogato al 31/12/2022)	SI	31/12/2023	Le risorse relative ai contributi L. 160/2019 2020-2021-2022 erano gestiti in un unico capitolo di bilancio di entrata e di spesa. Successivamente al passaggio in PNRR avvenuto nel 2022, non era possibile modificare tale imputazione riferita ad esercizi chiusi. Si è provveduto, come da indicazione della RGS a rinominare il capitolo E. 102/A e U. 2812 al fine di riportare il CUP dell'intervento 2022.
SI	D92E2200140006	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ECONOMICHE ANNUALITA' 2022 - COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2	4	2.1	13.088,15 €	- €	- €	no	no	AVVIATO	31/12/2023	SI		L'opera verrà affidata e inserita in REGIS, a seguito dello svincolo delle economie di progetto (economie di gara Anno 2022) come da disposizioni del Ministero dell'Interno
SI	D93022001520006	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2023 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIA RISORGIMENTO Fraz.	2	4	2.1	50.000,00 €	- €	- €	no	no	NON AVVIATO	15/09/2023		31/12/2024	Monitoraggio in corso. Vi sono alcune criticità legate al fatto che tali interventi sono stati registrati prima che le risorse confluissero nel PNRR e pertanto non è stato possibile attenersi a tutti gli obblighi, anche di natura contabile (es. capitolari mandati con separati, mandati con indicazione del CUP, ecc...). Si è in attesa dell'emissione del parte del ministero del nuovo manuale contenente anche indicazioni sull'atto di riconducibilità.
SI	D92E22001080006	PICCOLE OPERE - L. 160/2019 - ANNUALITA' 2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CARPIOLUOGO E FRAZ. DI	2	4	2.1	50.000,00 €	- €	- €	no	no	NON AVVIATO	15/09/2024		31/12/2025	Monitoraggio in corso. Vi sono alcune criticità legate al fatto che tali interventi sono stati registrati prima che le risorse confluissero nel PNRR e pertanto non è stato possibile attenersi a tutti gli obblighi, anche di natura contabile (es. capitolari mandati con separati, mandati con indicazione del CUP, ecc...). Si è in attesa dell'emissione del parte del ministero del nuovo manuale contenente anche indicazioni sull'atto di riconducibilità.
SI	D95E22000200006	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE	4	1	1.1	1.038.400,00 €	- €	€ 103.840,00 (Fondi F0)	no	no	AVVIATO	31/05/2023 (Prorogato al 20/06/2023)		30/06/2026	Monitoraggio in corso, al momento nessuna critica riscontrata
SI	D95E22000480006	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI	4	1	1.1	809.194,00 €	- €	€ 24.000,00 (Fondi comunali)	no	no	AVVIATO	30/11/2023		30/06/2026	CUP non ancora presente in monitoraggio REGIS





SOGGETTO ATTUATORE FNR	CUP (codice unico progetto)	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL FNR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL FNC (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	PROGETTO PRESENTANTE	IMPORTO PRECEDENTI TEME FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SINO AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SINO AL 31/12/2022	PROGETTO NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINI ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEI TERMINI (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RILEVANTI FASIS	NOTE
SI	F14H2000930001	Intervento di messa in sicurezza per la riduzione del rischio frana ed il miglioramento delle infrastrutture idrauliche e viarie nella frazione di Piedipaterno	M2	C4	A2.2	999.900,00 €	- €	- €	SI	59.401,24 €	9.091,31 €	150,00 €	AVVIATO	Validazione e approvazione della gara lavori Inizio Lavori Fine Lavori	09/02/2023 15/01/2023 30/11/2023 30/07/2023 30/07/2024	SI SI -	15/09/2024	-	Indicare eventuali criticità riscontrate	
SI	F17H21009540001	Rigenerazione urbana e terziaria - rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e sportive delle frazioni del Comune di Vallo di Nera	-	-	A3.1 A4.5	- €	1.035.000,00 €	- €	NO	- €	100.303,42 €	100.303,42 €	AVVIATO	Collaudo e certificato regolare esecuzione Validazione e approvazione della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Inizio Lavori Fine Lavori	28/01/2022 27/06/2022 12/12/2022 29/03/2023 31/03/2024	SI SI SI -	31/04/2024	-	-	
SI	F17H21009540001	Messa in sicurezza e ripristino delle scarpate e del corpo stradale della strada comunale di San Pietro	-	-	A4.5	- €	362.250,00 €	- €	NO	- €	13.771,19 €	5.625,64 €	AVVIATO	Collaudo e certificato regolare esecuzione Validazione e approvazione della Progettazione Aggiudicazione della gara lavori Inizio Lavori Fine Lavori	28/01/2022 27/06/2022 12/12/2022 30/03/2023 31/07/2023 30/09/2023	SI SI SI -	30/09/2023	-	-	
SI	F15F21001370001	Intervento di messa in sicurezza delle strutture viarie dei centri abitati delle frazioni di Paterno e Mezzano del Comune di Vallo di Nera.	M2	C4	-	99.999,90 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	AVVIATO	Non richiesto	-	-	-	-	-	-
SI	F15F21001020001	Intervento di messa in sicurezza di via di Paterno, in frazione Piedipaterno, e di un tratto della strada comunale di Roccapigli	M2	C4	-	50.000,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	AVVIATO	Non richiesto	-	-	-	30/06/2023	-	-
SI	F12E21005500006	Efficientamento Energetico della pubblica illuminazione	M2	C4	-	50.000,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	NON AVVIATO	Non richiesto	-	-	-	31/12/2024	-	-
SI	F12E21005540006	Efficientamento energetico dei criteri	M2	C4	-	50.000,00 €	- €	- €	NO	- €	- €	- €	NON AVVIATO	Non richiesto	-	-	-	31/12/2025	-	-

SOGGETTO ATTUATORE PNRR	CUP	SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	IMPORTO FINANZIATO DA ALTRE FONTI (euro)	IMPORTO PRECEDIMENTI E FINANZIATO (euro)	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU RISORSE PNRR AL NETTO IVA AL 31/12/2022	PAGAMENTI DISPOSTI A VALERE SU ALTRE RISORSE AL 31/12/2022	PROGETTO AVVIATO/NON AVVIATO	FASI PROCEDURALI	TERMINE ULTIMO PREVISTO	RISPETTO DEL TERMINE (SI/NO)	DATA FINALE	ATTIVITA' RELATIVE A RGIS	NOTE
SI	B23B2000100001	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza presso locali piscina comunale.	M2	C4	12.2	4598,86		4598,86	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	18.06.2020	SI	18.06.2020	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B23H2000090001	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza presso locali piscina comunale e rimessa attrezzi comunale.	M2	C4	12.2	10449,36		10449,36	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	19.06.2020	SI	19.06.2020	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B23G2000050001	Efficientamento energetico stabili scuola media, elementare, area tecnica palazzo comunale e completamento pubblica	M2	C4	12.2	32755,78		32755,78	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	10.06.2020	SI	10.06.2020	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B25I2000000001	Intervento di efficientamento energetico presso locali piscina comunale - sostituzione caldaia.	M2	C4	12.2	2100		2100	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	16.07.2020	SI	16.07.2020	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B29J21002870001	Interventi di efficientamento energetico e completamento della pubblica illuminazione del territorio comunale.	M2	C4	12.2	49943,65		49943,65	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	05.07.2021	SI	05.07.2021	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B27H21001390001	Interventi di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio Caserma dei Carabinieri.	M2	C4	12.2	34939,02		34939,02	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	08.09.2021	SI	08.09.2021	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B29J21002960001	Interventi di efficientamento energetico edificio di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri - Sostituzione coppi illuminanti.	M2	C4	12.2	7676,9		7676,9	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	11.06.2021	SI	11.06.2021	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B29J21007190001	Interventi di efficientamento energetico c/o edifici scolastici - Sostituzione inissi.	M2	C4	12.2	3767,9		3767,9	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	02.02.2022	SI	02.02.2022	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B29J21007190001	Intervento per l'efficientamento di lampadine fotovoltaici esistenti.	M2	C4	12.2	3555,2		3555,2	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI	02.09.2021	SI	02.09.2021	Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	Intervento già rendicontato su altro sistema (Area TBEL - Altri Certificati) per il quale è stato già incassato il saldo del contributo.
SI	B24D22001060006	Mantenimento straordinario per l'adeguamento, la messa in sicurezza e l'efficientamento dell'impianto elettrico scuola secondaria di 1° grado.	M2	C4	12.2	12123,05		12123,05	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI				Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	In Regis il CUP è presente, come intervento non avviato, avendo in realtà in BDOF sono stati caricati da tempo dati di avvio dell'intervento.
SI	B29F22003590006	Intervento di adeguamento e messa in sicurezza presso piscina comunale.	M2	C4	12.2	2440		2440	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI				CUP assente in Regis	
SI	B24H22000500006	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento impianti elettrici, messa in sicurezza ed efficientamento edifici vari di proprietà comunale.	M2	C4	12.2	34595,06		34595,06	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI				CUP assente in Regis	
SI	B24H23000800006	Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico edificio di proprietà comunale sito all'interno del "parco del Pino".	M2	C4	12.2	50000		50000	SI		NO	NO	LAVORI CONCLUSI				CUP assente in Regis	
SI	B27H20002140001	Interventi di messa in sicurezza di strade comunali a rischio idrogeologico e intervento di manutenzione straordinaria di ponti.	M2	C4	12.2	950000		950000	SI		SI	SI	LAVORI CONCLUSI				Difficoltà inserimento dati Assestra contact center per supporto e/o assistenza	
SI	B21F23000420006	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1		1.1.4.3	19424			NO		NON AVVIATO	NON AVVIATO	FASE INSERIMENTO CUP COMPLETATA	180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZIAMENTO 240 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	SI, ANCORA NO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE	180 GIORNI DALLA NOTIFICA PEC DEL FINANZIAMENTO 240 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE	SUL PORTALE PA DIGITALE 2026 IL FINANZIAMENTO E' IN STATO AMMESSO IN QUANTO IL CUP E' STATO COMUNICATO NEI TERMINI MA ANCORA NON E' STATO EMESSO IL DECRETO	
SI	B21F23000420006	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1		1.1.4.3	23147			NO		NON AVVIATO	NON AVVIATO	FASE INSERIMENTO CUP COMPLETATA - SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE IL 31.05.2023	LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADDE IL 31.05.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADDE ENTRO 180 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE	SI, ANCORA NO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE	LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADDE IL 31.05.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADDE ENTRO 180 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE	DUBBI SULLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO DOVUTI ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA ATTUALE DELL'ENTE E RELATIVAMENTE ALLA CONTRATTUALISTICA E ALE PRESTAZIONI DEI FORNITORI A CUI SONO STATI RICHIESTI PREVENTIVI CHE NON SODDISFEBBERO INTERAMENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COSI' COME RICHIESTO DALL AVVIS0 MISURA 1.4.5	
SI	B21C23000260006	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABLITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1		1.1.2	47427			NO		NON AVVIATO	NON AVVIATO	FASE INSERIMENTO CUP COMPLETATA - SCADENZA CONTRATTUALIZZAZIONE IL 04.12.2023	LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADDE IL 04.12.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADDE ENTRO 450 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE	SI, ANCORA NO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE	LA CONTRATTUALIZZAZIONE SCADDE IL 04.12.2023 MENTRE LA REALIZZAZIONE SCADDE ENTRO 450 GIORNI DALLA CONTRATTUALIZZAZIONE		

## INDICE

1	Premessa.....	4
1.1	Considerazioni introduttive e quadro normativo di riferimento .....	4
1.2	Obiettivi e metodologia d'indagine.....	6
2	I progetti PNRR in umbria - Analisi complessiva dei progetti finanziati dalle risorse del PNRR di competenza della Regione e degli Enti locali umbri.....	9
3	I progetti finanziati dalle risorse del PNRR di competenza della Regione Umbria .....	12
4	i progetti finanziati dalle risorse del PNRR di competenza degli enti locali umbri .....	21
4.1	Provincia di Perugia .....	21
4.2	Provincia di Terni.....	23
4.3	Comune di Perugia .....	25
4.4	Comune di Terni .....	29
4.5	Comuni umbri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.....	31
4.6	Comuni umbri con popolazione tra 5 e 15 mila abitanti.....	34
4.7	Comuni umbri con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti .....	37
5	ReGiS Il quadro emergente dalla banca dati ReGiS sui progetti del PNRR in Umbria ....	40
6	Conclusioni .....	47
7	Appendice.....	49

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1	- Numero progetti per missione.....	13
Tabella 2	- Numero progetti per amministrazione titolare .....	14
Tabella 3	- Risultanze da Rendiconto 2022 Regione Umbria .....	15
Tabella 4	- Numero progetti per amministrazione titolare .....	23
Tabella 5	- Numero progetti per amministrazione titolare .....	27
Tabella 6	- Numero progetti per amministrazione titolare .....	30
Tabella 7	- Numero progetti per amministrazione titolare .....	40
Tabella 8	- Costo ammesso e pagamenti dei progetti per amministrazione titolare.....	42
Tabella 9	- Numero progetti per amministrazione titolare .....	43
Tabella 10	- Costo ammesso e pagamenti per Missioni.....	46

## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1	- Distribuzione dei 1323 progetti per tipologia di finanziamento Regione ed EE.LL.9	
Grafico 2	- Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni .....	10

Grafico 3 - Distribuzione dei 1194 progetti finanziati dal PNRR tra Regione ed EE.LL.....	11
Grafico 4 - Distribuzione dei 289 progetti per tipologia di finanziamento.....	13
Grafico 5 - Distribuzione delle risorse PNRR per Missione - Regione Umbria.....	14
Grafico 6 - Distribuzione dei 47 progetti per tipologia di finanziamento.....	21
Grafico 7 - Distribuzione dei 37 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni .....	22
Grafico 8 - Distribuzione dei 18 progetti per tipologia di finanziamento.....	24
Grafico 9 - Distribuzione dei 58 progetti per tipologia di finanziamento.....	26
Grafico 10 - Distribuzione dei 58 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni .....	27
Grafico 11 - Distribuzione dei 7 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni .....	30
Grafico 12 - Distribuzione dei 234 progetti per tipologia di finanziamento.....	32
Grafico 13 - Distribuzione dei 234 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni ....	32
Grafico 14 - Distribuzione dei 101 progetti per tipologia di finanziamento.....	35
Grafico 15 - Distribuzione dei 101 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni ....	35
Grafico 16 - Distribuzione dei 506 progetti per tipologia di finanziamento.....	37
Grafico 17 - Distribuzione dei 506 progetti finanziati dal PNRR tra le differenti Missioni ....	38
Grafico 18 - Ripartizione dei 3339 progetti PNRR per amministrazione centrale titolare dell'intervento .....	41
Grafico 19 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali umbri per amministrazione centrale titolare dell'intervento .....	44
Grafico 20 - Ripartizione dei 1735 progetti PNRR di competenza della Regione e dei 94 Enti locali tra le differenti Missioni .....	45

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

